

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

²Ejercicio Fiscal

Enero
2017

³Proyecto/Programa:

Apoyo al Sector Justicia Penal


⁴Organismo Ejecutor:

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)

⁵ Número de Préstamo	1905/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	27/01/2017
⁶ Código Presupuestario	11140069-0101-402-104-52	¹⁴ Fecha del decreto	07/12/2011
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	14/12/2011
⁸ Entidad ejecutora	SEICMSJ	¹⁶ Fecha de Vigencia	14/12/2011
⁹ Unidad Ejecutora	Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal -BID-	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
¹⁰ Moneda del Préstamo	US\$	¹⁸ Fecha de cierre	14/12/2017
¹¹ Monto aprobado	30,000,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	12
¹² Monto aprobado Q.	225,000,000.00	²⁰ Plazo de ejecución	0.08%
Monto Aprobado UE (US\$)	2,718,546.00		
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	1,473,882.23	²¹ Monto por desembolsar USD\$	1,244,663.77
	54.21%		45.78%

Tipo de cambio: 7.50 Q x 1 USD

²²Ejecución Física

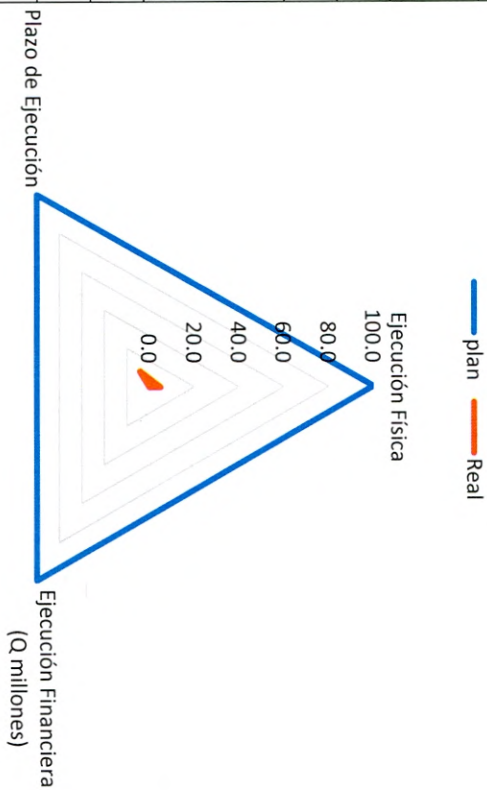

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

		Mensual		Anual		Total	
24 Asignación Presupuestaria anual	Q.11,500,000.00	Desembolso planificado	US\$ 0.00	Ejecución Financiera	0.00%/100%	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	Q.11,500,000.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	4.9% /100%		
Presupuesto Devengado	Q. 0.00	Diferencia	US\$ 0.00	Plazo de ejecución actual	8.3% / 100%		
% de Ejecución Presupuestaria	0 %	Próximo desembolso del mes	US\$ 300,000.00				
		Presupuesto planificado próximo	US\$ 150,811.53				

A1-METAS AÑO FISCAL 2017


COMPONENTE	PRODUCTOS	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1	Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Encuestas	0	0	1		0	0	1	
1	Operadores de Justicia sensibilizados en atención a la población y acceso a la justicia	Encuestas	15		15		0		30	
2	Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Consultores	3		0		0		3	
2	Operadores de justicia con dotación de Equipo para la división informática	Equipo	0	0	2		0	0	2	
3	Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Documentos	1		1		1		3	
3	Operadores de justicia con dotación de equipo para la división informática de investigación criminal y verificación de la prueba	Equipo	0	0	1		0	0	1	

A2Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1	Comparación de Calificaciones	Consultoría de Taller de sensibilización a operadores de Justicia	05/6/17		26/6/17		17/7/2017		16/8/2017		29/8/17	
1	Selección Basada en Calificación de Consultores	Firma Consultora Campañas de Sensibilización de Acceso a la Justicia	05/6/17		26/6/2017		9/8/2017		30/8/2017		27/9/17	
2	Licitación Pública Nacional	Compra de Software Y Hardware	22/7/16	01/9/16	27/9/16	07/11/16	31/10/16	7/12/16	4/11/16	14/12/16	11/1/17	
2	Contratación Directa	Sistema Informático de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	14/11/16		28/11/16		1/12/16		15/12/16		5/1/17	
2	Contratación Directa	Estadístico de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	14/11/16		28/11/16		1/12/16		15/12/16		5/1/17	
2	Contratación Directa	Jurista de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	14/11/16		28/11/16		1/12/16		15/12/16		5/1/17	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
3	Licitación Pública Nacional	Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica	3/10/16	28/11/16	14/11/16	13/1/17	24/2/17		02/3/17		16/3/17	
3	Selección Basada en Calificación de Consultores	Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector Justicia	8/8/16	10/8/16	24/10/16	16/11/16	21/2/17		28/2/17		14/3/17	
3	Selección Basada en Calidad y Costo	Módulo en Investigación Criminal para Jueces OJ	9/1/2017		06/2/2017		24/2/2017		06/3/2017		17/3/2017	
3	Contratación Directa	Elaboración de Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala	06/6/2016	06/6/16	29/6/16	25/8/2016	23/8/16	18/11/16	05/1/2017		26/1/2017	
4	Licitación Pública Nacional	Adquisición de Vehículos	22/8/16	29/8/2016	19/9/16	10/10/2016	9/11/16	14/11/16	9/11/16	15/11/16	09/2/2017	
4	Contratación Directa	Peraje Cultural en Guatemala	05/1/2017		26/1/2017		01/2/2017		09/2/2017		22/2/2017	

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
4	Consultoría Individual	Encuesta de percepción social en el área de Influencia de las construcciones del Sector Justicia	15/3/2017		06/4/2017		13/7/2017		21/7/2017		07/8/2017	
4	Contratación Directa	Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	09/2/2017		17/2/2017		23/2/2017		02/3/2017		16/3/2017	

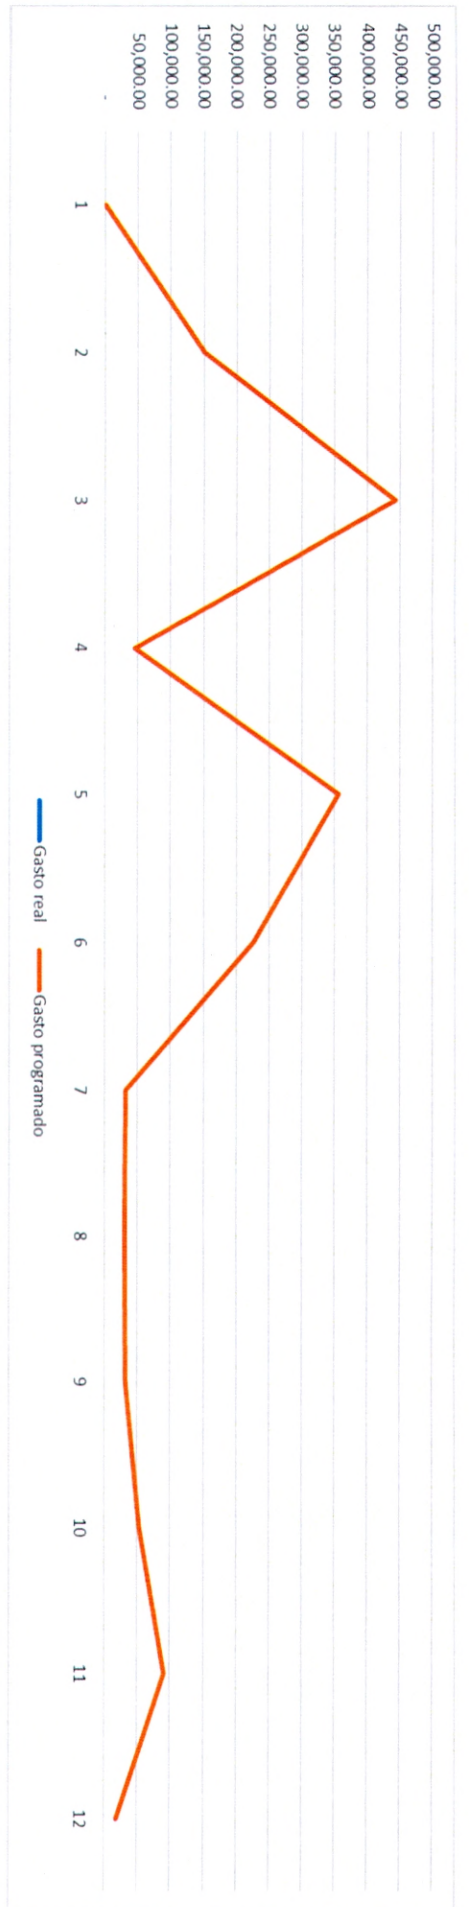

A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	\$ 150,811.53	\$ 442,766.92	\$ 45,235.82	\$ 357,142.20	\$ 226,304.14	\$ 32,676.57	\$ 31,240.99	\$ 31,507.30	\$ 53,998.38	\$ 91,034.95	\$ 19,233.20	1,481,952.00
Gasto programado	-	\$ 442,766.92	\$ 45,235.82	\$ 357,142.20	\$ 226,304.14	\$ 32,676.57	\$ 31,240.99	\$ 31,507.30	\$ 53,998.38	\$ 91,034.95	\$ 19,233.20	-	-

A5 Proyección de desembolsos

Proyección de desembolsos													
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado		\$ 300,000.00		\$ 300,000.00						\$ 300,000.00			\$ 1,200,000.00
Realizado													
Variación													

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Adigración presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Componente 1: Acceso a la Justicia															
Proceso de Contratación: Consultoría Taller de sensibilización a operadores de Justicia	120 días	lun 05/06/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%		\$ 53,333.33	\$ 29,000.00	\$ 53,333.33					
Etapas de Adquisición:															
Elaboración de Terminos de Referencia	10 días	lun 05/06/17	vie 16/06/17	NOD	NOD	0%									
No Objeción a Tdr	5 días	lun 19/06/17	vie 23/06/17	NOD	NOD	0%	1052								
Invitación y Evaluación	30 días	lun 26/06/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	0%	1053								
No Objeción a Evaluación	5 días	mié 09/08/17	mar 15/08/17	NOD	NOD	0%	1054								
Adjudicación y Contratación	10 días	mié 16/08/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	0%	1055								
Etapas de Ejecución de pagos:															
Realización de Talleres	60 días	mié 30/08/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	1056		\$ 29,000.00	\$ -					
Proceso de Contratación: Firma Consultora Campañas de Sensibilización de Acceso a la Justicia	125 días	lun 05/06/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%		\$ 46,666.67	\$ 29,750.00	\$ 46,666.67					
Etapas de Adquisición:															
Elaboración de Terminos de Referencia	10 días	lun 05/06/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	0%									
No Objeción a Tdr	5 días	lun 19/06/17	vie 16/06/17	NOD	NOD	0%	1061								
Publicación Expresión de Interés y Evaluación	20 días	lun 26/06/17	vie 23/06/17	NOD	NOD	0%	1062								
No Objeción a PP y Lista Corta	5 días	lun 24/07/17	lun 31/07/17	NOD	NOD	0%	1063								
Emisión de PP	5 días	mar 01/08/17	mar 08/08/17	NOD	NOD	0%	1064								
Invitación y Evaluación	20 días	mié 09/08/17	mar 05/09/17	NOD	NOD	0%	1065								
No Objeción a Evaluación	5 días	mié 06/09/17	mar 12/09/17	NOD	NOD	0%	1066								
Adjudicación y Contratación	10 días	mié 13/09/17	mar 27/09/17	NOD	NOD	0%	1067								
Etapas de Ejecución de pagos:															
Realización de Campaña	45 días	jue 28/09/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1068		\$ 29,750.00	\$ -					

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predector	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Atribución presupuestaria Viente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
Componente 2: Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)															
P1. Sistema de Información Interconectado y alimentado por todas las Instituciones Interconexión en Secretaría e INACIF															
Proceso de Adquisición: Compra de Software y Hardware 2016	251 días	Jun 29/02/16	mié 22/02/17	Jun 29/02/16	NOD	58%		\$ 90,666.67	\$107,105.00	\$ 90,666.67					
Etapa de Adquisición:	88 días	Jue 01/09/16	mié 11/01/17	Jue 01/09/16	NOD	77%									
Elaboración de Especificaciones Técnicas	19 días	Jue 01/09/16	mié 28/09/16	Jue 01/09/16	mié 28/09/16	100%	2523								
No Objeción a documentos	25 días	Jue 29/09/16	Jue 09/11/16	Jue 29/09/16	Jue 09/11/16	100%	2524								
Publicación	23 días	Jun 07/11/16	mié 07/12/16	Jun 07/11/16	mié 07/12/16	100%	2525								
Evaluación	5 días	mié 07/12/16	mié 14/12/16	mié 07/12/16	NOD	0%	2526								
No Objeción a Adjudicación	5 días	Jue 15/12/16	mié 21/12/16	NOD	NOD	0%	2527								
Notificación y Contratación	10 días	Jue 22/12/16	mié 11/01/17	NOD	NOD	0%	2527								
Etapa de Ejecución de pagos:	251 días	Jun 29/02/16	mié 22/02/17	Jun 29/02/16	NOD	3%			\$107,105.00						
Entrega del equipo	30 días	Jue 12/01/17	mié 22/02/17	NOD	NOD	0%	2528		\$107,105.00						
Proceso de Contratación: Sistema Informático de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	158 días	Jun 14/11/16	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%		\$ 60,000.00	\$12,000	\$ 60,000.00					
Etapa de Adquisición:	34 días	Jun 14/11/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%									
Elaboración de Tdr's	5 días	Jun 14/11/16	vie 18/11/16	NOD	NOD	0%	2584								
No Objeción a Tdr's	5 días	Jun 21/11/16	vie 25/11/16	NOD	NOD	0%	2585								
Invitación presentación CV's	5 días	Jun 28/11/16	vie 02/12/16	NOD	NOD	0%	2585								
Nombramiento del Comité de Evaluación	3 días	Jun 28/11/16	mié 30/11/16	NOD	NOD	0%	2585								
Recepción y Evaluación de CV's	10 días	Jue 01/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	0%	2587								
Solicitud de No Objeción Selección y Contratación	1 día	Jue 15/12/16	Jue 15/12/16	NOD	NOD	0%	2588								
No Objeción	5 días	vie 16/12/16	Jue 22/12/16	NOD	NOD	0%	2589								
Contratación	5 días	Jun 26/12/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%	2590								
Etapa de Ejecución de pagos:	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%			\$12,000						
Ejecución de consultoría 2017	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%	2591		\$12,000						
Proceso de Contratación: Estadístico de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	158 días	Jun 14/11/16	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%		\$ 60,000.00	\$13,000	\$ 60,000.00					
Etapa de Adquisición:	34 días	Jun 14/11/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%									
Elaboración de Tdr's	5 días	Jun 14/11/16	vie 18/11/16	NOD	NOD	0%	2596								
No Objeción a Tdr's	5 días	Jun 21/11/16	vie 25/11/16	NOD	NOD	0%	2597								
Invitación presentación CV's	5 días	Jun 28/11/16	vie 02/12/16	NOD	NOD	0%	2597								
Nombramiento del Comité de Evaluación	3 días	Jun 28/11/16	mié 30/11/16	NOD	NOD	0%	2597								
Recepción y Evaluación de CV's	10 días	Jue 01/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	0%	2599								
Solicitud de No Objeción Selección y Contratación	1 día	Jue 15/12/16	Jue 15/12/16	NOD	NOD	0%	2600								
No Objeción	5 días	vie 16/12/16	Jue 22/12/16	NOD	NOD	0%	2601								
Contratación	5 días	Jun 26/12/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%	2602								
Etapa de Ejecución de pagos:	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%			\$13,000						
Ejecución de consultoría 2017	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%	2603		\$13,000						
Proceso de Contratación: Jurista de la Interoperabilidad del Sector Justicia 2017	158 días	Jun 14/11/16	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%		\$ 60,000.00	\$13,000	\$ 60,000.00					
Etapa de Adquisición:	34 días	Jun 14/11/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%									
Elaboración de Tdr's	5 días	Jun 14/11/16	vie 18/11/16	NOD	NOD	0%	2608								
No Objeción a Tdr's	5 días	Jun 21/11/16	vie 25/11/16	NOD	NOD	0%	2609								
Invitación presentación CV's	5 días	Jun 28/11/16	vie 02/12/16	NOD	NOD	0%	2609								
Nombramiento del Comité de Evaluación	3 días	Jun 28/11/16	mié 30/11/16	NOD	NOD	0%	2609								
Recepción y Evaluación de CV's	10 días	Jue 01/12/16	mié 14/12/16	NOD	NOD	0%	2611								
Solicitud de No Objeción Selección y Contratación	1 día	Jue 15/12/16	Jue 15/12/16	NOD	NOD	0%	2612								
No Objeción	5 días	vie 16/12/16	Jue 22/12/16	NOD	NOD	0%	2613								
Contratación	5 días	Jun 26/12/16	Jue 05/01/17	NOD	NOD	0%	2614								
Etapa de Ejecución de pagos:	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%			\$13,000						
Ejecución de consultoría 2017	124 días	vie 06/01/17	vie 30/06/17	NOD	NOD	0%	2615		\$13,000						

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predicador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Paraficado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Derengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.															
P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba															
Adquisición de equipo y material de investigación criminal y verificación de la prueba en INACIF															
Proceso de adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016															
Etapas de Adquisición:	114 días	Jun 28/11/16	Jun 15/05/17	Jun 28/11/16	NOD	9%		\$106,000.00	\$52,088	\$106,000.00					
Elaboración de Especificaciones Técnicas	3 días	Jun 28/11/16	mié 30/11/16	Jun 28/11/16	mié 30/11/16	100%			\$0 \$	\$ -					
No Objeción a documentos	6 días	Jun 01/12/16	Jun 08/12/16	Jun 01/12/16	Jun 08/12/16	100%	3040		\$0 \$	\$ -					
Publicación	30 días	Jun 13/01/17	Jun 23/02/17			0%	3041C-20 días		\$0 \$	\$ -					
Evaluación	5 días	Jun 24/02/17	Jun 02/03/17			0%	3042		\$0 \$	\$ -					
No Objeción a Adjudicación	5 días	Jun 03/03/17	Jun 09/03/17			0%	3043		\$0 \$	\$ -					
Contratación	5 días	Jun 10/03/17	Jun 16/03/17			0%	3044		\$0 \$	\$ -					
Etapas de Ejecución de pagos:	45 días	Jun 10/03/17	Jun 15/05/17	NOD	NOD	0%			\$52,088	\$ -					
Entrega de equipo	45 días	Jun 10/03/17	Jun 15/05/17			0%	3044		\$52,088 \$	\$ -					
Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el fortalecimiento institucional de los Operadores del Sector Justicia															
Etapas de Adquisición:	96 días	mié 10/08/16	Jun 26/12/16	mié 10/08/16	NOD	71%		\$ -	\$193,000	\$ -					
Elaboración de TDR's y Expresión de Interés	7 días	mié 10/08/16	Jun 18/08/16	mié 10/08/16	Jun 18/08/16	100%			\$0 \$	\$ -					
Solicitud de No Objeción	1 día	Jun 19/08/16	Jun 19/08/16	Jun 19/08/16	Jun 19/08/16	100%	3059		\$0 \$	\$ -					
No Objeción Expresión de Interés	3 días	Jun 19/08/16	Jun 23/08/16	Jun 19/08/16	Jun 23/08/16	100%	3060		\$0 \$	\$ -					
Emisión de PP simplificado	4 días	Jun 01/09/16	Jun 06/09/16	Jun 01/09/16	Jun 06/09/16	100%	3061		\$0 \$	\$ -					
No Objeción a PP y Lista Corta	25 días	mié 07/09/16	Jun 13/10/16	mié 07/09/16	Jun 13/10/16	100%	3062		\$0 \$	\$ -					
Invitación (Lara Firma)	8 días	mié 16/11/16	Jun 25/11/16	mié 16/11/16	Jun 25/11/16	100%	3063		\$0 \$	\$ -					
Evaluación	5 días	Jun 28/11/16	Jun 02/12/16			0%	3064		\$0 \$	\$ -					
No Objeción a Evaluación	5 días	Jun 05/12/16	Jun 09/12/16			0%	3065		\$0 \$	\$ -					
Adjudicación y Contratación	10 días	Jun 12/12/16	Jun 26/12/16			0%	3066		\$0 \$	\$ -					
Etapas de Ejecución de pagos:	30 días	Jun 02/01/17	Jun 10/02/17	NOD	NOD	0%			\$193,000	\$ -					
Entrega de Protocolos	30 días	Jun 02/01/17	Jun 10/02/17			0%	3067		\$193,000 \$	\$ -					
P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas															
Capacitación de los funcionarios en INACIF (SE)															
Proceso de Contratación: Módulo en Investigación Criminal para Jueces OI															
Etapas de Adquisición:	303 días	Jun 11/01/16	Mar 30/05/17	Jun 11/01/16	NOD	65%		\$ -	\$144,840	\$ -					
Modelo de Gestión	187 días	Jun 11/01/16	mié 28/09/16	Jun 11/01/16	mié 28/09/16	100%			\$0 \$	\$ -					
Preparación de TDR's	10 días	Jun 09/01/17	Jun 20/01/17			0%	3233		\$0 \$	\$ -					
Solicitud de No Objeción	5 días	Jun 23/01/17	Jun 27/01/17			0%	3234		\$0 \$	\$ -					
No Objeción	5 días	Jun 30/01/17	Jun 03/02/17			0%	3235		\$0 \$	\$ -					
Publicación y evaluación	15 días	Jun 06/02/17	Jun 24/02/17			0%	3236		\$0 \$	\$ -					
No Objeción Evaluación	5 días	Jun 27/02/17	Jun 03/03/17			0%	3236		\$0 \$	\$ -					
Adjudicación y contratación	10 días	Jun 06/03/17	Jun 17/03/17			0%	3237		\$0 \$	\$ -					
Etapas de Ejecución de Pagos:	50 días	Jun 20/03/17	Mar 30/05/17	NOD	NOD	0%			\$144,840	\$ -					
Ejecución de la Consultoría	50 días	Jun 20/03/17	Mar 30/05/17			0%	3238		\$144,840 \$	\$ -					
P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba															
Proceso de Adquisición: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala															
Etapas de Adquisición:	160 días	Jun 06/06/16	Jun 26/01/17	Jun 06/06/16	NOD	50%		\$ -	\$250,000	\$ -					
Elaboración de TDR's y Expresión de Interés	10 días	Jun 06/06/16	Jun 17/06/16	Jun 06/06/16	Jun 17/06/16	100%			\$0 \$	\$ -					
No Objeción Expresión de Interés	7 días	Jun 12/08/16	Jun 22/08/16	Jun 12/08/16	Jun 22/08/16	100%	3245		\$0 \$	\$ -					
Publicación Expresión de Interés	13 días	Jun 25/08/16	Jun 12/09/16	Jun 25/08/16	Jun 12/09/16	100%	3246		\$0 \$	\$ -					
Evaluación	25 días	Jun 29/09/16	Jun 09/11/16	Jun 29/09/16	Jun 09/11/16	100%	3247		\$0 \$	\$ -					
No Objeción a PP y Lista Corta	5 días	Jun 04/11/16	Jun 10/11/16	Jun 04/11/16	Jun 10/11/16	0%	3248		\$0 \$	\$ -					
Emisión de PP	5 días	Jun 11/11/16	Jun 17/11/16			0%	3249		\$0 \$	\$ -					
Invitación y Evaluación	30 días	Jun 18/11/16	Jun 05/01/17			0%	3250		\$0 \$	\$ -					
No Objeción a Evaluación	5 días	Jun 06/01/17	Jun 12/01/17			0%	3251		\$0 \$	\$ -					
Adjudicación y Contratación	10 días	Jun 13/01/17	Jun 26/01/17			0%	3252		\$0 \$	\$ -					
Etapas de Ejecución de pagos:	30 días	Jun 27/01/17	Jun 09/03/17	NOD	NOD	0%			\$250,000	\$ -					
Entrega de Protocolos	30 días	Jun 27/01/17	Jun 09/03/17			0%	3253		\$250,000 \$	\$ -					

Administración	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Derogado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
	Gastos indirectos e imprevisos (5%)															
	Proceso de Adquisiciones: Adquisición de Vehículos (5 Pick Up) 2016	132 días	lun 29/08/16	lun 09/03/17	lun 29/08/16	NOD	71%		\$ -	\$130,000	\$ -	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	111 días	lun 29/08/16	lun 09/02/17	lun 29/08/16	NOD	85%									
	Elaboración de Especificaciones	10 días	lun 29/08/16	lun 09/09/16	lun 29/08/16	vie 09/09/16	100%	4678		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a documentos	9 días	lun 12/09/16	vie 23/09/16	lun 12/09/16	vie 23/09/16	100%	4678		\$0	\$ -	\$ -				
	Publicación	25 días	lun 10/10/16	lun 14/11/16	lun 10/10/16	lun 14/11/16	100%	4679		\$0	\$ -	\$ -				
	Evaluación	12 días	mar 15/11/16	mar 30/11/16	mar 15/11/16	mar 30/11/16	100%	4680		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Adjudicación	31 días	lun 01/12/16	lun 19/01/17	lun 01/12/16	lun 19/01/17	100%	4681		\$0	\$ -	\$ -				
	Notificación y Contratación	15 días	lun 20/01/17	lun 09/02/17	lun 20/01/17	NOD	0%	4682		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	20 días	lun 20/02/17	lun 09/03/17	NOD	NOD	0%			\$130,000	\$ -	\$ -				
	Entrega de vehículos	20 días	lun 10/02/17	lun 09/03/17	NOD	NOD	0%	4683		\$130,000	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo	231 días	lun 20/01/17	lun 18/12/17	lun 20/01/17	NOD	29%		\$287,175.60	\$17,604	\$287,175.60	\$ -				
	2017	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	4880		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	4880		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de Contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	4881		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$17,604	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Asistente Contable	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	NOD	29%		\$287,175.60	\$17,604	\$287,175.60	\$ -				
	Financiera 2017	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	4924		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	4924		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	4925		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$17,604	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	NOD	29%		\$287,175.60	\$28,800	\$287,175.60	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	5010		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	5010		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de Contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	5011		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$28,800	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	NOD	29%		\$287,175.60	\$28,800	\$287,175.60	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	5053		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	5053		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de Contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	5054		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$28,800	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	NOD	29%		\$287,175.60	\$28,800	\$287,175.60	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	5170		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	5171		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de Contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	5171		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$28,800	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	NOD	33%		\$287,175.60	\$28,800	\$287,175.60	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	5198		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	3 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	5198		\$0	\$ -	\$ -				
	Contratación	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	5199		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$28,800	\$ -	\$ -				
	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	231 días	vie 20/01/17	lun 18/12/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%		\$287,175.60	\$28,800	\$287,175.60	\$ -				
	Etapas de Adquisición:	8 días	vie 20/01/17	mar 31/01/17	vie 20/01/17	mar 31/01/17	100%			\$0	\$ -	\$ -				
	Solicitud de No Objeción a Recontratación	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	vie 20/01/17	100%	5109		\$0	\$ -	\$ -				
	No Objeción a Recontratación	3 días	vie 20/01/17	mar 24/01/17	vie 20/01/17	mar 24/01/17	100%	5109		\$0	\$ -	\$ -				
	Firma de contrato	2 días	lun 30/01/17	mar 31/01/17	lun 30/01/17	mar 31/01/17	100%	5110		\$0	\$ -	\$ -				
	Etapas de Ejecución de pagos:	206 días	vie 24/02/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$28,800	\$ -	\$ -				

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Derengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
Administración															
Gastos Indirectos e Imprevistos (SE)															
Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	76 días	Jun 14/11/16	Jun 06/03/17	Jun 14/11/16	NOD	8%		\$287,175.60	\$20,803	\$287,175.60					
Etapas de Adquisición:	16 días	Jun 14/11/16	Jun 05/12/16	Jun 14/11/16	NOD	38%			\$0	\$					
Elaboración de Términos de Referencia y Evaluación	5 días	Jun 14/11/16	Vie 18/11/16	Jun 14/11/16	Vie 18/11/16	100%	5298		\$0	\$					
Solicitud de No Objeción	1 día	Jun 21/11/16	Jun 21/11/16	Jun 21/11/16	Jun 21/11/16	100%	5299		\$0	\$					
No Objeción de Tdr's y Selección de Consultor	5 días	Jun 21/11/16	Jun 28/11/16	Jun 21/11/16	NOD	0%	5300		\$0	\$					
Contratación	5 días	Mar 29/11/16	Jun 05/12/16	NOD	NOD	0%			\$20,803	\$					
Etapas de Ejecución de pagos:	60 días	Mar 06/12/16	Jun 06/03/17	NOD	NOD	0%	5301		\$20,803	\$					
Ejecución del Contrato	60 días	Mar 06/12/16	Jun 06/03/17	NOD	NOD	0%			\$20,803	\$					
Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	115 días	Jun 05/01/17	Vie 16/06/17	NOD	NOD	0%		\$287,175.60	\$30,000	\$287,175.60					
Etapas de Adquisición:	35 días	Jun 05/01/17	mié 22/02/17	NOD	NOD	0%			\$0	\$					
Elaboración de Términos de referencia	10 días	Jun 05/01/17	mié 18/01/17	NOD	NOD	0%	5306		\$0	\$					
No Objeción	5 días	Jun 19/01/17	mié 25/01/17	NOD	NOD	0%	5307		\$0	\$					
Invitación y Evaluación	5 días	Jun 26/01/17	mié 01/02/17	NOD	NOD	0%	5308		\$0	\$					
No Objeción a Evaluación	5 días	Jun 02/02/17	mié 08/02/17	NOD	NOD	0%	5309		\$0	\$					
Adjudicación y Contratación	10 días	Jun 09/02/17	mié 22/02/17	NOD	NOD	0%			\$30,000	\$					
Etapas de Ejecución de pagos:	80 días	Jun 23/02/17	Vie 16/06/17	NOD	NOD	0%	5310		\$30,000	\$					
Ejecución del Contrato 2016	80 días	Jun 23/02/17	Vie 16/06/17	NOD	NOD	0%			\$30,000	\$					
Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el área de influencia de las construcciones del Sector Justicia	180 días	mié 15/03/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%		\$287,175.60	\$38,839	\$287,175.60					
Etapas de Adquisición:	100 días	mié 15/03/17	Jun 07/08/17	NOD	NOD	0%			\$0	\$					
Elaboración de Términos de referencia	10 días	mié 15/03/17	Mar 28/03/17	NOD	NOD	0%	5323		\$0	\$					
No Objeción a Tdr	5 días	mié 29/03/17	mié 05/04/17	NOD	NOD	0%	5324		\$0	\$					
Publicación	30 días	Jun 06/04/17	Jun 18/05/17	NOD	NOD	0%	5325		\$0	\$					
No Objeción a PP y Lista Corta	5 días	Vie 19/05/17	Vie 25/05/17	NOD	NOD	0%	5326		\$0	\$					
Emisión de PP	5 días	Vie 26/05/17	Jun 01/06/17	NOD	NOD	0%	5327		\$0	\$					
Invitación y Evaluación	30 días	Vie 02/06/17	Jun 13/07/17	NOD	NOD	0%	5328		\$0	\$					
No Objeción a Evaluación	5 días	Vie 14/07/17	Jun 20/07/17	NOD	NOD	0%	5329		\$0	\$					
Adjudicación y Contratación	10 días	Vie 21/07/17	Jun 07/08/17	NOD	NOD	0%			\$38,839	\$					
Etapas de Ejecución de pagos:	80 días	Mar 08/08/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	5330		\$38,839	\$					
Ejecución del Contrato	80 días	Mar 08/08/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$38,839	\$					
Proceso de Adquisición: Mantenimiento y reparación de Oficina para la Coordinación de la UE 2017	25 días	Jun 06/02/17	Vie 10/03/17	NOD	NOD	0%		\$287,175.60	\$4,000	\$287,175.60					
Etapas de Adquisición:	20 días	Jun 06/02/17	Vie 03/03/17	NOD	NOD	0%			\$0	\$					
Elaboración de Especificaciones	5 días	Jun 06/02/17	Vie 10/02/17	NOD	NOD	0%	5436		\$0	\$					
Publicación y Evaluación	10 días	Jun 13/02/17	Vie 24/02/17	NOD	NOD	0%	5437		\$0	\$					
Adjudicación y Contratación	5 días	Jun 27/02/17	Vie 03/03/17	NOD	NOD	0%			\$4,000	\$					
Etapas de Ejecución de pagos:	5 días	Jun 06/03/17	Vie 10/03/17	NOD	NOD	0%	5438		\$4,000	\$					
Entrega	5 días	Jun 06/03/17	Vie 10/03/17	NOD	NOD	0%			\$4,000	\$					
Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	41 días	Jun 09/02/17	Vie 07/04/17	NOD	NOD	0%		\$287,175.60	\$10,998	\$287,175.60					
Etapas de Adquisición:	26 días	Jun 09/02/17	Jun 16/03/17	NOD	NOD	0%			\$0	\$					
Elaboración de Términos de Referencia y Evaluación	5 días	Jun 09/02/17	mié 15/02/17	NOD	NOD	0%	5459		\$0	\$					
Solicitud de No Objeción	1 día	Jun 16/02/17	Jun 16/02/17	NOD	NOD	0%	5460		\$0	\$					
Invitación	5 días	Vie 17/02/17	Jun 23/02/17	NOD	NOD	0%	5461		\$0	\$					
Evaluación de Consultor	5 días	Vie 24/02/17	Jun 02/03/17	NOD	NOD	0%	5462		\$0	\$					
No Objeción a Contratación	5 días	Vie 03/03/17	Jun 09/03/17	NOD	NOD	0%	5463		\$0	\$					
Contratación	5 días	Vie 10/03/17	Jun 16/03/17	NOD	NOD	0%			\$10,998	\$					
Etapas de Ejecución de pagos:	15 días	Vie 17/03/17	Vie 07/04/17	NOD	NOD	0%	5464		\$10,998	\$					
Ejecución del Contrato	15 días	Vie 17/03/17	Vie 07/04/17	NOD	NOD	0%			\$10,998	\$					

A7 Observaciones/Desafíos

-

A8 Riesgos:

-
Empresas no oferten o que no cumplan con los requerimientos mínimos.

Elaborado por: Licda. Ana Jessica Bonilla Navichoque

Aprobado por: Ing. Juan Carlos Linares

Aprobado por Lic. Héctor Anibal De León Polanco

Fecha de actualización: 31 de Enero del 2017.

