

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Número de Préstamo | BID-1905/OC-GU | Fecha de última actualización | 12/02/2018 |
| Código Presupuestario | 5204020104 | Fecha del Decreto | 08/12/2011 |
| Organismo Financiero | BID | Fecha de Suscripción | 14/12/2011 |
| Moneda del Préstamo | USD | Fecha de Vigencia | 14/12/2011 |
| Monto contratado | 30,000,000.00 | Fecha de Elegibilidad | 21/02/2013 |
| Monto contratado Entidad ejecutora | 2,718,546.00 | Fecha de cierre actual | 14/12/2017 |
| Monto Entidad Ejecutora Dolares | 2,718,546.00 | Meses de Prórroga | 12 |
| Monto contratado Entidad ejecutora Q. | 19,981,313.10 | Plazo de ejecución | 90.44% |
| Desembolsos realizados a la fecha | 2,823,882.23 | 103.87% | Monto por desembolsar USD\$ -105,336.23 -3.87% |

Gráfica de Ejecución

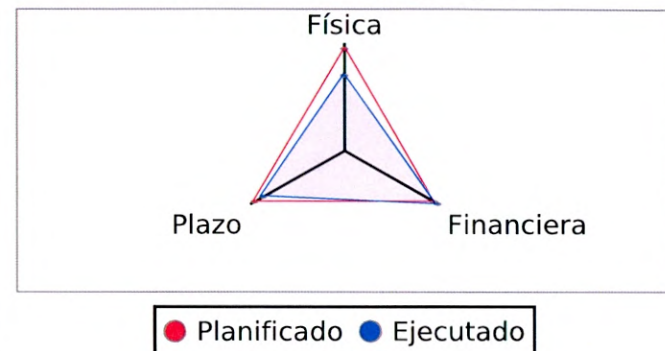

Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



| Ejecución Presupuestaria Anual | | Desembolsos Mensuales Enero | | Indicadores de Avance Anuales 2018 | | Total | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------|--|---------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria | 11,500,000.00 | Desembolso planificado en el | 0.00 | Desembolsos Acumulados del Año | 0 | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual | 11,500,000.00 | Desembolso realizado en el mes | 0.00 | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 0.00% / 0.00% | | |
| Presupuesto Devengado | 99,000.00 | Diferencia | 0.00 | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos | 0.00% / 0.00% | | |
| Porcentaje de Ejecución | 0.86% | Próximo desembolso del mes | Mes | Plazo de ejecucion Actual | 103.00% | | |
| | | Presupuesto planificado próximo | 0.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual | 0 | | |

Metas año fiscal


| Producto | Unidad de medida | Meta cuatrimestre I | | Meta cuatrimestre II | | Meta cuatrimestre III | | Meta anual | |
|---|------------------|---------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia | | | | | | | | | |
| Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización | Unidad | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | |
| Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal | | | | | | | | | |
| Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística | Unidad | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica | | | | | | | | | |
| Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba | Unidad | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |
| Componente: Administración | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento Institucional | Unidad | 30 | | 12 | | 0 | | 42 | |

Plan Adquisiciones Año Fiscal

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|---|---|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Mejoramiento del Acceso a la Justicia | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indigenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales | | | | | | | | | | | |
| Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala" | Contratación Directa | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 26/12/2017 | 04/01/2018 | 27/12/2017 | 08/01/2018 | 05/01/2018 | 08/01/2018 |
| Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales | Contratación Directa | 08/11/2017 | | 08/11/2017 | | 04/12/2017 | | 14/12/2017 | | 09/01/2018 | |
| Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica | | | | | | | | | | | |
| Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba | | | | | | | | | | | |
| Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial | Selección basada en la Calidad (SBC) | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 11/07/2017 | 18/01/2017 | 04/08/2017 | 13/02/2017 | 29/12/2017 | | 12/01/2018 | |
| Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala | Contratación Directa | 13/11/2017 | 22/11/2017 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 12/02/2018 | | 16/02/2018 | |
| Administración | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | | | |
| Auditoría Externa | Selección Basada en las Calificaciones de | 28/08/2017 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 16/10/2017 | 22/09/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 |
| Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa | Contratación Directa | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Asistente Administrativo | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Asistente Contable Financiero | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |

| Adquisición | Metodo | Preparación de documentos | | Lanzamiento de evento | | Recepción y evaluación de | | Adjudicación | | Firma de contrato | |
|--|---|---------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real | Planificado | Real |
| Especialista en Infraestructura | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Asistente de Adquisiciones | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Especialista en Planificación | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia | Selección sobre la base la comparación de | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

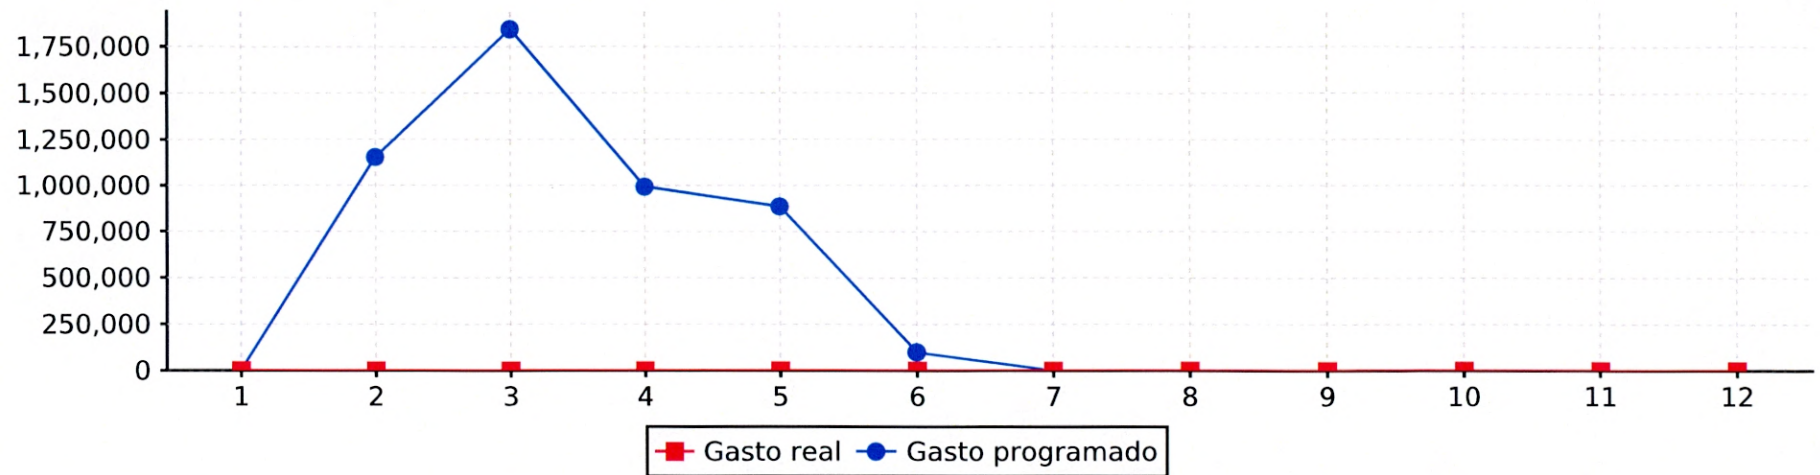

| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------|
| Gasto real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto programado | 0.00 | 1,151,392.60 | 1,843,908.84 | 992,468.84 | 885,848.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto real | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total Gasto programado | | | | | | | | | | | | 4,972,618.28 |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividades Atrasadas | Actividades Próximas Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real |
|----|-------------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| 0 | 0 | 88% | PEP_SMART_1905,0 | 25 | 24 | mié 24/10/07 | 1200 días | mié 02/10/13 | jue 14/06/18 | mié 02/10/13 | | NOD | \$3,228,682 Fin | | \$2,403,621 |
| 1 | 1 | 43% | Componente 1: Acceso a la Justicia | 5 | 2 | mié 24/10/... | 863 días | lun 06/10/14 | mié 28/02/1 | lun 06/10/14 | | NOD | \$51,309 Fin | | \$1,309 |
| 2 | 1.1 | 10% | P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ) | 5 | 2 | mar 03/11/... | 80 días | mié 08/11/17 | mié 28/02/1 | mié 08/11/17 | | NOD | \$50,000 Fin | | \$0 |
| 3 | 1.1.1 | 21% | Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala" | 1 | 1 | lun 05/06/17 | 47 días | mar 26/12/17 | mié 28/02/18 | mar 26/12/17 | | NOD | \$25,000 Fin | | \$0 |
| 4 | 1.1.1.1 | 100% | Etapas de Adquisición: | 0 | 0 | lun 05/06/17 | 10 días | mar 26/12/17 | lun 08/01/18 | mar 26/12/17 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 5 | 1.1.1.1.1 | 100% | Elaboración de Terminos de Referencia | 0 | 0 | lun 05/06/17 | 8 días | mar 26/12/17 | jue 04/01/18 | mar 26/12/17 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 6 | 1.1.1.1.2 | 100% | No Objeción a Tdr y Contratación Directa | 0 | 0 | lun 19/06/17 | 1 día | jue 04/01/18 | dom 07/01/18 | jue 04/01/18 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 7 | 1.1.1.1.3 | 100% | Adjudicación y Contratación | 0 | 0 | mié 16/08/... | 1 día | lun 08/01/18 | lun 08/01/18 | lun 08/01/18 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 8 | 1.1.1.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 1 | 1 | mié 30/08/... | 37 días | mar 09/01/18 | mié 28/02/1 | NOD | | NOD | \$25,000 Fin | | \$0 |
| 9 | 1.1.1.2.1 | 0% | Pago Producto #1 | 1 | 0 | mié 30/08/... | 17 días | mar 09/01/18 | mié 31/01/1 | NOD | | NOD 7 | \$5,000 Fin | | \$0 |
| 10 | 1.1.1.2.2 | 0% | Pago Producto #2 | 0 | 1 | mié 30/08/... | 20 días | jue 01/02/18 | mié 28/02/1 | NOD | | NOD 9 | \$20,000 Fin | | \$0 |
| 11 | 1.1.2 | 0% | Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales | 4 | 1 | lun 05/06/17 | 80 días | mié 08/11/17 | mié 28/02/18 | NOD | | NOD | \$25,000 Fin | | \$0 |
| 12 | 1.1.2.1 | 0% | Etapas de Adquisición: | 3 | 0 | lun 05/06/17 | 25 días | mié 08/11/17 | mar 12/12/1 | NOD | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 13 | 1.1.2.1.1 | 0% | Elaboración de Terminos de Referencia | 1 | 0 | lun 05/06/17 | 10 días | mié 08/11/17 | mar 21/11/1 | NOD | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 14 | 1.1.2.1.2 | 0% | No Objeción a Tdr y Contratación Directa | 1 | 0 | lun 19/06/17 | 5 días | mié 22/11/17 | mar 28/11/1 | NOD | | NOD 13 | \$0 Fin | | \$0 |
| 15 | 1.1.2.1.3 | 0% | Adjudicación y Contratación | 1 | 0 | mié 13/09/... | 10 días | mié 29/11/17 | mar 12/12/1 | NOD | | NOD 14 | \$0 Fin | | \$0 |
| 16 | 1.1.2.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 1 | 1 | jue 28/09/17 | 30 días | jue 18/01/18 | mié 28/02/1 | NOD | | NOD | \$25,000 Fin | | \$0 |
| 17 | 1.1.2.2.1 | 0% | Pago Producto #1 | 1 | 0 | mié 30/08/... | 10 días | jue 18/01/18 | mié 31/01/1 | NOD | | NOD 15FC+2! | \$5,000 Fin | | \$0 |
| 18 | 1.1.2.2.2 | 0% | Pago Producto #2 | 0 | 1 | jue 28/09/17 | 20 días | jue 01/02/18 | mié 28/02/1 | NOD | | NOD 17 | \$20,000 Fin | | \$0 |
| 19 | 1.2 | 100% | P4. Comisarias de Policía TIPO construidas (MG) | 0 | 0 | mié 24/10/... | 126 días | lun 06/10/14 | vie 27/03/15 | lun 06/10/14 | | NOD | \$1,309 Fin | | \$1,309 |
| 20 | 1.2.1 | 100% | Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarias MINGOB | 0 | 0 | lun 06/10/14 | 126 días | lun 06/10/14 | vie 27/03/15 | lun 06/10/14 | | NOD | \$1,309 Fin | | \$1,309 |
| 21 | 1.2.1.1 | 100% | Etapas de Adquisición: | 0 | 0 | lun 06/10/14 | 48 días | lun 06/10/14 | mié 10/12/14 | lun 06/10/14 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 22 | 1.2.1.1.1 | 100% | Elaboración de TDR's | 0 | 0 | lun 06/10/14 | 5 días | lun 06/10/14 | vie 10/10/14 | lun 06/10/14 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 23 | 1.2.1.1.2 | 100% | No Objeción a Tdr's | 0 | 0 | lun 13/10/14 | 5 días | lun 13/10/14 | vie 17/10/14 | lun 13/10/14 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 24 | 1.2.1.1.3 | 100% | Invitación Muestra de Interes | 0 | 0 | lun 20/10/14 | 22 días | lun 20/10/14 | mar 18/11/1 | lun 20/10/14 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 25 | 1.2.1.1.4 | 100% | Contratación de la consultoría | 0 | 0 | mié 19/11/... | 16 días | mié 19/11/14 | mié 10/12/1 | mié 19/11/14 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 26 | 1.2.1.2 | 100% | Etapas de Ejecución de pagos: | 0 | 0 | jue 11/12/14 | 10 días | lun 16/03/15 | vie 27/03/15 | lun 16/03/15 | | NOD | \$1,309 Fin | | \$1,309 |
| 28 | 2 | 96% | Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de información y Gestión Penal Integrado) | 2 | 0 | NOD | 850 días | mié 24/09/14 | mar 30/01/18 | mié 24/09/14 | | NOD | \$634,602 Fin | | \$584,998 |
| 29 | 2.1 | 96% | P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las Instituciones | 2 | 0 | NOD | 850 días | mié 24/09/14 | mar 30/01/18 | mié 24/09/14 | | NOD | \$634,602 Fin | | \$584,998 |
| 30 | 2.1.1 | 96% | Interconexión en Secretaría e INACIF | 2 | 0 | mié 24/09/... | 850 días | mié 24/09/14 | mar 30/01/18 | mié 24/09/14 | | NOD | \$634,602 Fin | | \$584,998 |
| 31 | 2.1.1.1 | 100% | Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015 | 0 | 0 | vie 21/08/15 | 69 días | vie 21/08/15 | vie 27/11/15 | vie 21/08/15 | | NOD | \$142,498 Fin | | \$142,498 |
| 42 | 2.1.1.2 | 84% | Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016 | 1 | 0 | lun 29/02/16 | 357 días | jue 01/09/16 | mar 30/01/18 | jue 01/09/16 | | NOD | \$84,964 Fin | | \$44,587 |
| 43 | 2.1.1.2.1 | 100% | Etapas de Adquisición: | 0 | 0 | jue 01/09/16 | 157 días | jue 01/09/16 | mar 18/04/17 | jue 01/09/16 | | NOD | \$0 Fin | | \$0 |
| 50 | 2.1.1.2.2 | 6% | Etapas de Ejecución de pagos: | 1 | 0 | lun 29/02/16 | 189 días | vie 05/05/17 | mar 30/01/18 | vie 05/05/17 | | NOD | \$84,964 Fin | | \$44,587 |
| 51 | 2.1.1.2.2.1 | 100% | Pago de Corporación de Bienes y Servicios Tecnológicos, S.A. | 0 | 0 | NOD | 2 días | vie 05/05/17 | lun 08/05/17 | vie 05/05/17 | | NOD | \$44,587 Fin | | \$44,587 |
| 52 | 2.1.1.2.2.2 | 0% | Pago a Insertec | 1 | 0 | jue 12/01/17 | 30 días | mar 19/12/17 | mar 30/01/18 | NOD | | NOD 49FC+1: | \$40,377 Fin | | \$0 |
| 53 | 2.1.1.3 | 100% | Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEIC | 0 | 0 | NOD | 80 días | lun 02/11/15 | vie 26/02/16 | lun 02/11/15 | | NOD | \$1,137 Fin | | \$1,137 |
| 63 | 2.1.1.4 | 100% | Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia | 0 | 0 | mié 24/09/... | 49 días | mié 24/09/14 | mar 02/12/14 | mié 24/09/14 | | NOD | \$7,494 Fin | | \$7,494 |
| 69 | 2.1.1.5 | 100% | Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia | 0 | 0 | lun 17/11/14 | 294 días | lun 17/11/14 | mié 20/01/15 | lun 10/11/14 | | NOD | \$78,164 Fin | | \$78,164 |
| 75 | 2.1.1.6 | 100% | Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia | 0 | 0 | lun 18/01/16 | 238 días | lun 18/01/16 | vie 16/12/16 | lun 18/01/16 | | NOD | \$114,770 Fin | | \$114,770 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|
| División crítica | | Project Summary | ▬ | Inactive Summary | ▬ | Start-only | ☐ | Margen de demora | ▬ |
| Task | ▬ | External Tasks | ▬ | Manual Task | ▬ | Finish-only | ☐ | Retrasada | ▬ |
| Split | | External Milestone | ◊ | Duration-only | ▬ | Deadline | ↓ | Tareas críticas | ▬ |
| Milestone | ◆ | Inactive Task | ▬ | Manual Summary Rollup | ▬ | Progress | ▬ | | |
| Summary | ▬ | Inactive Milestone | ▬ | Manual Summary | ▬ | Progreso manual | ▬ | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasadas | Actividades Próximos Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real | |
|-----|--------------|----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------|-----|---------------|----------|------|----------------|------------|---------------|-----------|
| 91 | 2.1.1.7 | 100% | Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF | 0 | 0 | 0 lun 23/05/16 | 146 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | \$104,369 Fin | \$104,369 |
| 101 | 2.1.1.8 | 100% | Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2014 | 0 | 0 | 0 lun 24/11/14 | 27 días | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | \$2,584 Fin | \$2,584 |
| 107 | 2.1.1.9 | 100% | Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2015 | 0 | 0 | 0 lun 08/12/14 | 200 días | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | \$21,307 Fin | \$21,307 |
| 113 | 2.1.1.10 | 100% | Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de Telecomunicaciones y Software para la SEICMSJ | 0 | 0 | 0 lun 14/11/16 | 232 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | \$32,715 Fin | \$32,715 |
| 131 | 2.1.1.11 | 76% | Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ | 1 | 0 | 0 lun 14/11/16 | 113 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | NOD | | \$23,092 Fin | \$13,865 |
| 132 | 2.1.1.11.1 | 100% | Etapa de Adquisición: | 0 | 0 | 0 lun 14/11/16 | 28 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | \$0 Fin | \$0 |
| 136 | 2.1.1.11.2 | 63% | Etapa de Ejecución de pagos: | 1 | 0 | 0 vie 03/02/17 | 60 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | | \$23,092 Fin | \$13,865 |
| 137 | 2.1.1.11.2.1 | 0% | Ejecucion 23092 | 1 | 0 | 0 vie 03/02/17 | 20 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 135FC+ | \$9,227 Fin | \$0 |
| 138 | 2.1.1.11.2.2 | 100% | Pago Noviembre 2017 | 0 | 0 | 0 vie 03/02/17 | 15 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 135FC+ | \$4,619 Fin | \$4,619 |
| 139 | 2.1.1.11.2.3 | 100% | Pago Diciembre 2017 | 0 | 0 | 0 vie 03/02/17 | 19 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 135FC+ | \$9,245 Fin | \$9,245 |
| 140 | 2.1.1.12 | 100% | Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal | 0 | 0 | 0 jue 09/02/17 | 102 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | \$21,479 Fin | \$21,479 |
| 149 | 2.1.1.13 | 100% | Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos | 0 | 0 | 0 NOD 83 días | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | \$30 Fin | \$30 |
| 150 | 3 | 86% | Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica | 3 | 8 | 0 lun 25/05/15 | 772 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NOD | | \$906,678 Fin | \$432,155 |
| 151 | 3.1 | 93% | P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba | 2 | 0 | 0 lun 05/10/15 | 589 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NOD | | \$433,185 Fin | \$416,662 |
| 152 | 3.1.1 | 93% | Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF | 2 | 0 | 0 lun 05/10/15 | 589 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NOD | | \$433,185 Fin | \$416,662 |
| 153 | 3.1.1.1 | 100% | Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015 | 0 | 0 | 0 mar 13/10/15 | 119 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | \$97,760 Fin | \$97,760 |
| 161 | 3.1.1.2 | 100% | Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016 | 0 | 0 | 0 lun 28/11/16 | 211 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | \$9,655 Fin | \$9,655 |
| 171 | 3.1.1.3 | 100% | Proceso de Adquisición: Vehículos | 0 | 0 | 0 lun 05/10/15 | 58 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | \$50,046 Fin | \$50,046 |
| 180 | 3.1.1.4 | 100% | Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector | 0 | 0 | 0 mié 10/08/16 | 350 días | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | \$192,996 Fin | \$192,996 |
| 198 | 3.1.1.5 | 66% | Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento abreviado | 1 | 0 | 0 jue 05/01/17 | 85 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | | \$45,997 Fin | \$33,544 |
| 199 | 3.1.1.5.1 | 100% | Etapa de Adquisición: | 0 | 0 | 0 jue 05/01/17 | 6 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | \$0 Fin | \$0 |
| 203 | 3.1.1.5.2 | 62% | Etapa de Ejecución de pagos: | 1 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 61 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | | \$45,997 Fin | \$33,544 |
| 204 | 3.1.1.5.2.1 | 0% | Ejecución del Contrato 45997 | 1 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 20 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 202 | \$12,453 Fin | \$0 |
| 205 | 3.1.1.5.2.2 | 100% | Pago Noviembre 2017 | 0 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 15 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 202 | \$20,710 Fin | \$20,710 |
| 206 | 3.1.1.5.2.3 | 100% | Pago Diciembre 2017 | 0 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 17 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 202 | \$12,834 Fin | \$12,834 |
| 207 | 3.1.1.6 | 66% | Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado | 1 | 0 | 0 jue 05/01/17 | 85 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | | \$36,691 Fin | \$32,621 |
| 208 | 3.1.1.6.1 | 100% | Etapa de Adquisición: | 0 | 0 | 0 jue 05/01/17 | 6 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | \$0 Fin | \$0 |
| 212 | 3.1.1.6.2 | 62% | Etapa de Ejecución de pagos: | 1 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 61 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | | \$36,691 Fin | \$32,621 |
| 213 | 3.1.1.6.2.1 | 0% | Ejecución del Contrato 36682 | 1 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 20 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 211 | \$4,070 Fin | \$0 |
| 214 | 3.1.1.6.2.2 | 100% | Pago Noviembre 2017 | 0 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 15 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 211 | \$16,518 Fin | \$16,518 |
| 215 | 3.1.1.6.2.3 | 100% | Pago Diciembre 2017 | 0 | 0 | 0 jue 23/02/17 | 17 días | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NOD | NOD 211 | \$16,103 Fin | \$16,103 |
| 216 | 3.1.1.7 | 100% | Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos | 0 | 0 | 0 NOD 84 días | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | \$40 Fin | \$40 |
| 217 | 3.2 | 85% | P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas | 0 | 4 | 0 lun 25/05/15 | 772 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NOD | | \$283,493 Fin | \$15,493 |
| 218 | 3.2.1 | 85% | Capacitación de los funcionarios en INACIF (SE) | 0 | 4 | 0 lun 25/05/15 | 772 días | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NOD | | \$283,493 Fin | \$15,493 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| División crítica | | Project Summary | | Inactive Summary | | Start-only | | Margen de demora | |
| Task | | External Tasks | | Manual Task | | Finish-only | | Retrasada | |
| Split | | External Milestone | | Duration-only | | Deadline | | Tareas críticas | |
| Milestone | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | Progress | | | |
| Summary | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Progreso manual | | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasadas | Actividades Próximas Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real |
|-----|--------------|----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------------|---------|------------|
| 219 | 3.2.1.1 | 100% | Proceso de Contratación: Gastos de Viáticos John Jay College | 0 | 0 | vie 24/06/16 | 25 días | vie 24/06/16 | vie 29/07/16 | vie 24/06/16 | vie 29/07/16 | | \$13,582 Fin | | \$13,582 |
| 225 | 3.2.1.2 | 100% | Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación | 0 | 0 | lun 20/06/16 | 29 días | lun 20/06/16 | vie 29/07/16 | lun 20/06/16 | vie 29/07/16 | | \$1,667 Fin | | \$1,667 |
| 234 | 3.2.1.3 | 100% | Análisis de consultora | 0 | 0 | lun 25/05/15 | 17 días | lun 25/05/15 | mar 16/06/15 | lun 25/05/15 | mar 16/06/15 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 235 | 3.2.1.4 | 78% | Proceso de Contratación: Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo | 0 | 4 | lun 11/01/16 | 619 días | lun 11/01/16 | mié 13/06/18 | lun 11/01/16 | NOD | | \$268,000 Fin | | \$0 |
| 236 | 3.2.1.4.1 | 94% | Etapas de Adquisición: | 0 | 4 | lun 11/01/16 | 544 días | lun 11/01/16 | lun 26/02/18 | lun 11/01/16 | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 237 | 3.2.1.4.1.1 | 100% | Modelo de Gestión | 0 | 0 | lun 11/01/16 | 187 días | lun 11/01/16 | mié 28/09/16 | lun 11/01/16 | mié 28/09/16 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 238 | 3.2.1.4.1.2 | 100% | Preparación de TDR's | 0 | 0 | NOD | 10 días | mié 09/11/16 | mar 22/11/16 | mié 09/11/16 | mar 22/11/16 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 239 | 3.2.1.4.1.3 | 100% | Solicitud de No Objeción | 0 | 0 | NOD | 5 días | mié 23/11/16 | mar 29/11/16 | mié 23/11/16 | mar 29/11/16 | 238 | \$0 Fin | | \$0 |
| 240 | 3.2.1.4.1.4 | 100% | No Objeción | 0 | 0 | NOD | 6 días | mié 30/11/16 | mié 07/12/16 | mié 30/11/16 | mié 07/12/16 | 239 | \$0 Fin | | \$0 |
| 241 | 3.2.1.4.1.5 | 100% | Publicación Expresión de Interés | 0 | 0 | NOD | 11 días | mié 18/01/17 | mié 01/02/17 | mié 18/01/17 | mié 01/02/17 | 240 | \$0 Fin | | \$0 |
| 242 | 3.2.1.4.1.6 | 100% | Evaluación de Expresiones de Interés | 0 | 0 | NOD | 8 días | lun 13/02/17 | mié 22/02/17 | lun 13/02/17 | mié 22/02/17 | 241 | \$0 Fin | | \$0 |
| 243 | 3.2.1.4.1.7 | 100% | No Objeción Expresión de Interés | 0 | 0 | NOD | 40 días | jue 23/02/17 | jue 20/04/17 | jue 23/02/17 | jue 20/04/17 | 242 | \$0 Fin | | \$0 |
| 244 | 3.2.1.4.1.8 | 100% | Preparación y envío de SP | 0 | 0 | NOD | 25 días | mar 02/05/17 | lun 05/06/17 | mar 02/05/17 | lun 05/06/17 | 243 | \$0 Fin | | \$0 |
| 245 | 3.2.1.4.1.9 | 100% | No Objeción a SP | 0 | 0 | NOD | 5 días | mié 05/07/17 | mar 11/07/17 | mié 05/07/17 | mar 11/07/17 | 244 | \$0 Fin | | \$0 |
| 246 | 3.2.1.4.1.10 | 100% | Invitación | 0 | 0 | NOD | 12 días | mar 11/07/17 | vie 04/08/17 | mar 11/07/17 | vie 04/08/17 | 245FC+ | \$0 Fin | | \$0 |
| 247 | 3.2.1.4.1.11 | 100% | Evaluación de Propuesta Técnica | 0 | 0 | NOD | 28 días | lun 07/08/17 | mié 13/09/17 | lun 07/08/17 | mié 13/09/17 | 246 | \$0 Fin | | \$0 |
| 248 | 3.2.1.4.1.12 | 100% | Objeción Propuesta Técnica | 0 | 0 | NOD | 5 días | lun 27/11/17 | vie 01/12/17 | lun 27/11/17 | vie 01/12/17 | 247 | \$0 Fin | | \$0 |
| 249 | 3.2.1.4.1.13 | 100% | Revisión de observaciones | 0 | 0 | NOD | 1 día | mar 05/12/17 | mar 05/12/17 | mar 05/12/17 | mar 05/12/17 | 248 | \$0 Fin | | \$0 |
| 250 | 3.2.1.4.1.14 | 0% | No Objeción a Propuesta Técnica | 0 | 1 | NOD | 5 días | mar 30/01/18 | lun 05/02/18 | mar 30/01/18 | NOD | 249 | \$0 Fin | | \$0 |
| 251 | 3.2.1.4.1.15 | 0% | Fase de Negociación | 0 | 1 | NOD | 5 días | mar 06/02/18 | lun 12/02/18 | NOD | NOD | 250 | \$0 Fin | | \$0 |
| 252 | 3.2.1.4.1.16 | 0% | No Objeción Fase de Negociación | 0 | 1 | NOD | 5 días | mar 13/02/18 | lun 19/02/18 | NOD | NOD | 251 | \$0 Fin | | \$0 |
| 253 | 3.2.1.4.1.17 | 0% | Adjudicación y contratación | 0 | 1 | NOD | 5 días | mar 20/02/18 | lun 26/02/18 | NOD | NOD | 252 | \$0 Fin | | \$0 |
| 254 | 3.2.1.4.2 | 0% | Etapas de Ejecución de Pago: | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 75 días | mar 27/02/18 | mié 13/06/18 | NOD | NOD | | \$268,000 Fin | | \$0 |
| 255 | 3.2.1.4.2.1 | 0% | Pago del Primer Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 22 días | mar 27/02/18 | mié 28/03/18 | NOD | NOD | 253 | \$53,600 Fin | | \$0 |
| 256 | 3.2.1.4.2.2 | 0% | Pago del Segundo Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 15 días | jue 29/03/18 | jue 19/04/18 | NOD | NOD | 255 | \$53,600 Fin | | \$0 |
| 257 | 3.2.1.4.2.3 | 0% | Pago del Tercer Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 22 días | vie 20/04/18 | mar 22/05/18 | NOD | NOD | 256 | \$53,600 Fin | | \$0 |
| 258 | 3.2.1.4.2.4 | 0% | Pago del Cuarto Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 15 días | mié 23/05/18 | mar 12/06/18 | NOD | NOD | 257 | \$53,600 Fin | | \$0 |
| 259 | 3.2.1.4.2.5 | 0% | Pago del Quinto Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | lun 20/03/17 | 1 día | mié 13/06/18 | mié 13/06/18 | NOD | NOD | 258 | \$53,600 Fin | | \$0 |
| 260 | 3.2.1.5 | 100% | Impuestos, Derecho y Tasas 2016 | 0 | 0 | vie 01/04/16 | 180 días | vie 01/04/16 | mié 14/12/16 | vie 01/04/16 | mié 14/12/16 | | \$245 Prorrata | | \$245 |
| 261 | 3.3 | 79% | P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba | 1 | 4 | lun 06/06/16 | 481 días | lun 06/06/16 | lun 30/04/18 | lun 06/06/16 | NOD | | \$190,000 Fin | | \$0 |
| 262 | 3.3.1 | 100% | Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del | 0 | 0 | lun 06/06/16 | 371 días | lun 06/06/16 | jue 23/11/17 | lun 06/06/16 | jue 23/11/17 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 283 | 3.3.2 | 39% | Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de | 1 | 4 | lun 06/06/16 | 119 días | lun 13/11/17 | lun 30/04/18 | lun 13/11/17 | NOD | | \$190,000 Fin | | \$0 |
| 284 | 3.3.2.1 | 67% | Etapas de Adquisición: | 1 | 3 | lun 06/06/16 | 69 días | lun 13/11/17 | vie 16/02/18 | lun 13/11/17 | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 285 | 3.3.2.1.1 | 100% | Elaboración de TDR's y SP | 0 | 0 | NOD | 8 días | lun 13/11/17 | mié 22/11/17 | lun 13/11/17 | mié 22/11/17 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 286 | 3.3.2.1.2 | 100% | No Objeción Tdr's y SP | 0 | 0 | NOD | 38 días | jue 23/11/17 | mar 16/01/18 | jue 23/11/17 | mar 16/01/18 | 285 | \$0 Fin | | \$0 |
| 287 | 3.3.2.1.3 | 0% | Invitación a Firma | 1 | 0 | NOD | 8 días | mar 16/01/18 | vie 26/01/18 | mar 16/01/18 | NOD | 286 | \$0 Fin | | \$0 |
| 288 | 3.3.2.1.4 | 0% | Evaluación de Propuesta Técnica y Económica | 0 | 1 | NOD | 5 días | lun 29/01/18 | vie 02/02/18 | NOD | NOD | 287 | \$0 Fin | | \$0 |
| 289 | 3.3.2.1.5 | 0% | No Objeción a Propuesta Técnica y Económica | 0 | 1 | NOD | 5 días | lun 05/02/18 | vie 09/02/18 | NOD | NOD | 288 | \$0 Fin | | \$0 |
| 290 | 3.3.2.1.6 | 0% | Adjudicación y Contratación | 0 | 1 | NOD | 5 días | lun 12/02/18 | vie 16/02/18 | NOD | NOD | 289 | \$0 Fin | | \$0 |
| 291 | 3.3.2.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 0 | 1 | vie 27/01/17 | 50 días | lun 19/02/18 | lun 30/04/18 | NOD | NOD | | \$190,000 Fin | | \$0 |
| 292 | 3.3.2.2.1 | 0% | Pago de Primer Producto 20% del valor del contrato | 0 | 1 | vie 27/01/17 | 8 días | lun 19/02/18 | mié 28/02/18 | NOD | NOD | 290 | \$38,000 Fin | | \$0 |
| 293 | 3.3.2.2.2 | 0% | Pago del Segundo Producto 60% del valor del contrato | 0 | 0 | vie 27/01/17 | 22 días | jue 01/03/18 | vie 30/03/18 | NOD | NOD | 292 | \$114,000 Fin | | \$0 |
| 294 | 3.3.2.2.3 | 0% | Pago del Tercer Producto 20% del valor del contrato | 0 | 0 | vie 27/01/17 | 20 días | lun 02/04/18 | lun 30/04/18 | NOD | NOD | 293 | \$38,000 Fin | | \$0 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|
| División crítica | | Project Summary | ▬ | Inactive Summary | ▬ | Start-only | ▬ | Margen de demora | ▬ |
| Task | ▬ | External Tasks | ▬ | Manual Task | ▬ | Finish-only | ▬ | Retrasada | ▬ |
| Split | | External Milestone | ◊ | Duration-only | ▬ | Deadline | ▬ | Tareas críticas | ▬ |
| Milestone | ◆ | Inactive Task | ▬ | Manual Summary Rollup | ▬ | Progress | ▬ | | |
| Summary | ▬ | Inactive Milestone | ▬ | Manual Summary | ▬ | Progreso manual | ▬ | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasadas | Actividades Próximos Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real |
|-----|------------|----------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 295 | 4 | 88% | Administración | 15 | 14 | 10/06/13 | 1200 días | mié 02/10/13 | jue 14/06/14 | mié 02/10/13 | NOD | | \$1,636,094 Fin | | \$1,385,160 |
| 296 | 4.1 | 88% | Gastos indirectos e imprevistos (SE) | 15 | 14 | mié 02/10/13 | 1200 días | mié 02/10/13 | jue 14/06/14 | mié 02/10/13 | NOD | | \$1,636,094 Fin | | \$1,385,160 |
| 297 | 4.1.1 | 100% | Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB | 0 | 0 | jue 11/12/14 | 15 días | jue 11/12/14 | mié 31/12/14 | jue 11/12/14 | mié 31/12/14 | 25 | \$1,974 Fin | | \$1,974 |
| 298 | 4.1.2 | 100% | Pagos Administrativos 2013 | 0 | 0 | mié 02/10/13 | 65 días | mié 02/10/13 | mar 31/12/13 | mié 02/10/13 | mar 31/12/13 | | \$20,995 Fin | | \$20,995 |
| 299 | 4.1.3 | 100% | Proceso de Adquisiciones: Adquisición de Vehiculos (Camionetas) | 2 | 0 | jue 16/04/15 | 75 días | jue 16/04/15 | jue 30/07/15 | jue 16/04/15 | jue 30/07/15 | | \$66,393 Fin | | \$66,393 |
| 306 | 4.1.4 | 100% | Proceso de Adquisiciones: Adquisición de Vehiculos (5 Pick Up) | 201 | 0 | 0 | 29/08/16 | 141 días | mié 22/03/16 | 0 | 29/08/16 | mié 22/03/17 | | \$147,041 Fin | \$147,041 |
| 316 | 4.1.5 | 100% | Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014 | 0 | 0 | jue 02/01/14 | 160 días | jue 02/01/14 | mié 13/08/14 | jue 02/01/14 | mié 13/08/14 | | \$1,804 Fin | | \$1,804 |
| 321 | 4.1.6 | 100% | Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015 | 0 | 0 | 0 | 02/01/15 | 161 días | vie 02/01/15 | 0 | 02/01/15 | lun 24/08/15 | | \$1,935 Fin | \$1,935 |
| 326 | 4.1.7 | 100% | Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016 | 0 | 0 | 0 | 17/02/15 | 220 días | mié 17/02/15 | 0 | 17/02/15 | jue 22/12/16 | | \$9,290 Fin | \$9,290 |
| 337 | 4.1.8 | 100% | Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017 | 0 | 0 | 0 | 02/01/17 | 84 días | jue 02/02/17 | 0 | 02/01/17 | mié 31/05/17 | | \$3,758 Fin | \$3,758 |
| 344 | 4.1.9 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014 | 0 | 0 | 0 | 02/01/14 | 260 días | jue 02/01/14 | 0 | 02/01/14 | mié 31/12/14 | | \$8,941 Fin | \$8,941 |
| 349 | 4.1.10 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015 | 0 | 0 | 0 | 05/01/15 | 252 días | lun 05/01/15 | 0 | 05/01/15 | vie 08/01/16 | | \$8,393 Fin | \$8,393 |
| 354 | 4.1.11 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016 | 0 | 0 | 0 | 04/01/16 | 248 días | lun 04/01/16 | 0 | 04/01/16 | vie 16/12/16 | | \$7,756 Fin | \$7,756 |
| 366 | 4.1.12 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017 | 0 | 0 | 0 | 02/01/17 | 192 días | lun 13/03/17 | 0 | 02/01/17 | lun 11/12/17 | | \$8,415 Fin | \$8,415 |
| 380 | 4.1.13 | 0% | Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018 | 2 | 1 | 0 | 02/01/17 | 116 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/01/17 | 14/06/18 | | \$5,040 Fin | \$0 |
| 381 | 4.1.13.1 | 0% | Etapas de Adquisición: | 1 | 0 | 0 | 02/01/17 | 5 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/01/17 | lun 08/01/18 | | \$0 Fin | \$0 |
| 382 | 4.1.13.1.1 | 0% | Contratación | 1 | 0 | 0 | 02/01/17 | 5 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/01/17 | lun 08/01/18 | | \$0 Fin | \$0 |
| 383 | 4.1.13.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 1 | 1 | 0 | 06/02/17 | 116 días | mar 02/01/18 | 0 | 06/02/17 | jue 14/06/18 | | \$5,040 Fin | \$0 |
| 384 | 4.1.13.2.1 | 0% | Enero 2018 | 1 | 0 | 0 | 02/01/18 | 10 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/01/18 | lun 15/01/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 385 | 4.1.13.2.2 | 0% | Febrero 2018 | 0 | 1 | 0 | 02/02/18 | 10 días | vie 02/02/18 | 0 | 02/02/18 | jue 15/02/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 386 | 4.1.13.2.3 | 0% | Marzo 2018 | 0 | 0 | 0 | 03/18 | 20 días | vie 02/03/18 | 0 | 03/18 | jue 29/03/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 387 | 4.1.13.2.4 | 0% | Abril 2018 | 0 | 0 | 0 | 02/04/18 | 20 días | lun 02/04/18 | 0 | 02/04/18 | lun 30/04/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 388 | 4.1.13.2.5 | 0% | Mayo 2018 | 0 | 0 | 0 | 02/05/18 | 20 días | mié 02/05/18 | 0 | 02/05/18 | mar 29/05/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 389 | 4.1.13.2.6 | 0% | Junio 2018 | 0 | 0 | 0 | 06/18 | 10 días | vie 01/06/18 | 0 | 06/18 | jue 14/06/18 | | \$840 Fin | \$0 |
| 390 | 4.1.14 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2014 | 0 | 0 | 0 | 02/01/14 | 239 días | jue 02/01/14 | 0 | 02/01/14 | mar 02/12/14 | | \$12,347 Fin | \$12,347 |
| 395 | 4.1.15 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2015 | 0 | 0 | 0 | 02/16 | 20 días | mar 02/02/16 | 0 | 02/16 | 29/02/16 | | \$6,244 Fin | \$6,244 |
| 400 | 4.1.16 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2016 | 0 | 0 | 0 | 02/16 | 213 días | mar 02/02/16 | 0 | 02/16 | 28/11/16 | | \$33,135 Fin | \$33,135 |
| 411 | 4.1.17 | 100% | Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2017 | 0 | 0 | 0 | 02/17 | 221 días | lun 06/02/17 | 0 | 02/17 | vie 15/12/17 | | \$38,194 Fin | \$38,194 |
| 425 | 4.1.18 | 0% | Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2018 | 0 | 0 | 0 | 02/17 | 103 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/17 | 28/05/18 | | \$21,000 Fin | \$0 |
| 426 | 4.1.18.1 | 0% | Etapas de Adquisición: | 0 | 0 | 0 | 02/17 | 80 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/17 | mar 24/04/18 | | \$0 Fin | \$0 |
| 427 | 4.1.18.1.1 | 0% | Contratación | 0 | 0 | 0 | 02/17 | 80 días | mar 02/01/18 | 0 | 02/17 | mar 24/04/18 | | \$0 Fin | \$0 |
| 428 | 4.1.18.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 0 | 0 | 0 | 06/17 | 80 días | vie 02/02/18 | 0 | 06/17 | lun 28/05/18 | | \$21,000 Fin | \$0 |
| 429 | 4.1.18.2.1 | 0% | Entrega 10000 | 0 | 0 | 0 | 06/17 | 80 días | vie 02/02/18 | 0 | 06/17 | lun 28/05/18 | | \$21,000 Prorrate | \$0 |
| 430 | 4.1.19 | 100% | Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 220 días | jue 02/01/14 | 0 | 02/14 | mié 05/11/14 | | \$4,241 Fin | \$4,241 |
| 435 | 4.1.20 | 100% | Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 222 días | lun 02/02/15 | 0 | 02/15 | vie 18/12/15 | | \$2,021 Fin | \$2,021 |
| 440 | 4.1.21 | 100% | Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016 | 0 | 0 | 0 | 02/16 | 226 días | mar 02/02/16 | 0 | 02/16 | 15/12/16 | | \$19,651 Fin | \$19,651 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|
| División crítica | | Project Summary | ▬ | Inactive Summary | ▬ | Start-only | ☐ | Margen de demora | ▬ |
| Task | ▬ | External Tasks | ▬ | Manual Task | ▬ | Finish-only | ☐ | Retrasada | ▬ |
| Split | | External Milestone | ◇ | Duration-only | ▬ | Deadline | ↓ | Tareas críticas | ▬ |
| Milestone | ◆ | Inactive Task | ▬ | Manual Summary Rollup | ▬ | Progress | ▬ | | |
| Summary | ▬ | Inactive Milestone | ▬ | Manual Summary | ▬ | Progreso manual | ▬ | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasadas | Actividad Próximo Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real |
|------|------------|----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|----------------|---------|------------|
| 973 | 4.1.65.2.2 | 0% | Febrero 2018 | 0 | 1 | mar 04/04/... | 20 días | jue 01/02/18 | mié 28/02/18 | NOD | NOD | 972 | \$2,725 Fin | | \$0 |
| 974 | 4.1.65.2.3 | 0% | Marzo 2018 | 0 | 0 | mié 03/05/... | 22 días | jue 01/03/18 | vie 30/03/18 | NOD | NOD | 973 | \$2,725 Fin | | \$0 |
| 975 | 4.1.65.2.4 | 0% | Abril 2018 | 0 | 0 | vie 02/06/17 | 20 días | lun 02/04/18 | lun 30/04/18 | NOD | NOD | 974 | \$2,725 Fin | | \$0 |
| 976 | 4.1.65.2.5 | 0% | Mayo 2018 | 0 | 0 | vie 02/06/17 | 22 días | mié 02/05/18 | jue 31/05/18 | NOD | NOD | 975 | \$2,725 Fin | | \$0 |
| 977 | 4.1.65.2.6 | 0% | Junio 2018 | 0 | 0 | vie 02/06/17 | 10 días | vie 01/06/18 | jue 14/06/18 | NOD | NOD | 976 | \$2,725 Fin | | \$0 |
| 978 | 4.1.66 | 100% | Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ | 0 | 0 | vie 20/01/17 | 5 días | lun 28/08/17 | vie 01/09/17 | lun 28/08/17 | vie 01/09/17 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 988 | 4.1.67 | 100% | Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos | 0 | 0 | vie 20/01/17 | 117 días | mar 13/06/17 | lun 27/11/17 | mar 13/06/17 | lun 27/11/17 | | \$7,653 Fin | | \$7,653 |
| 998 | 4.1.68 | 100% | Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas en | 0 | 0 | vie 20/01/17 | 20 días | lun 20/11/17 | vie 15/12/17 | lun 20/11/17 | vie 15/12/17 | | \$954 Fin | | \$954 |
| 1005 | 4.1.69 | 100% | Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la | 0 | 0 | lun 11/08/14 | 197 días | lun 11/08/14 | mié 13/05/15 | lun 11/08/14 | mié 13/05/15 | | \$31,281 Fin | | \$31,281 |
| 1013 | 4.1.70 | 100% | Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil | 0 | 0 | lun 05/10/15 | 58 días | lun 05/10/15 | mié 23/12/15 | lun 05/10/15 | mié 23/12/15 | | \$1,311 Fin | | \$1,311 |
| 1020 | 4.1.71 | 100% | Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil | 0 | 0 | mar 08/12/15 | 41 días | mar 08/12/15 | mié 10/02/16 | mar 08/12/15 | mié 10/02/16 | | \$5,195 Fin | | \$5,195 |
| 1027 | 4.1.72 | 100% | Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en | 0 | 0 | lun 02/05/16 | 126 días | lun 02/05/16 | vie 28/10/16 | lun 02/05/16 | vie 28/10/16 | | \$28,536 Fin | | \$28,536 |
| 1037 | 4.1.73 | 100% | Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de | 0 | 0 | mar 01/12/15 | 169 días | mar 01/12/15 | vie 29/07/16 | mar 01/12/15 | vie 29/07/16 | | \$5,930 Fin | | \$5,930 |
| 1048 | 4.1.74 | 100% | Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en Jalapa y | 0 | 0 | lun 02/05/16 | 63 días | lun 02/05/16 | jue 28/07/16 | lun 02/05/16 | jue 28/07/16 | | \$7,930 Fin | | \$7,930 |
| 1058 | 4.1.75 | 100% | Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de la | 0 | 0 | lun 17/10/16 | 45 días | lun 17/10/16 | vie 16/12/16 | lun 17/10/16 | vie 16/12/16 | | \$8,011 Fin | | \$8,011 |
| 1067 | 4.1.76 | 100% | Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP | 0 | 0 | lun 22/08/16 | 83 días | lun 22/08/16 | vie 16/12/16 | lun 22/08/16 | vie 16/12/16 | | \$24,832 Fin | | \$24,832 |
| 1077 | 4.1.77 | 100% | Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB | 0 | 0 | mié 01/06/16 | 139 días | mié 01/06/16 | vie 16/12/16 | mié 01/06/16 | vie 16/12/16 | | \$25,385 Fin | | \$25,385 |
| 1087 | 4.1.78 | 100% | Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP | 0 | 0 | lun 14/11/16 | 199 días | lun 14/11/16 | lun 28/08/17 | lun 14/11/16 | lun 28/08/17 | | \$20,930 Fin | | \$20,930 |
| 1096 | 4.1.79 | 100% | Proceso de Contratación: Peritraje Cultural en Guatemala | 0 | 0 | jue 05/01/17 | 201 días | lun 16/01/17 | vie 27/10/17 | lun 16/01/17 | vie 27/10/17 | | \$41,594 Fin | | \$41,594 |
| 1105 | 4.1.80 | 29% | Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ | 1 | 0 | jue 05/01/17 | 108 días | lun 30/10/17 | jue 29/03/18 | lun 30/10/17 | NOD | | \$25,410 Fin | | \$5,090 |
| 1106 | 4.1.80.1 | 100% | Etapa de Adquisición: | 0 | 0 | jue 05/01/17 | 5 días | lun 30/10/17 | vie 03/11/17 | lun 30/10/17 | vie 03/11/17 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1107 | 4.1.80.1.1 | 100% | Elaboracion de Terminos de referencia | 0 | 0 | jue 05/01/17 | 2 días | lun 30/10/17 | mar 31/10/17 | lun 30/10/17 | mar 31/10/17 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1108 | 4.1.80.1.2 | 100% | No Objeción a Tdr's y Contratación Directa | 0 | 0 | jue 02/02/17 | 2 días | mar 31/10/17 | jue 02/11/17 | mar 31/10/17 | jue 02/11/17 | 1107 | \$0 Fin | | \$0 |
| 1109 | 4.1.80.1.3 | 100% | Adjudicación y Contratación | 0 | 0 | jue 09/02/17 | 1 día | vie 03/11/17 | vie 03/11/17 | vie 03/11/17 | vie 03/11/17 | 1108 | \$0 Fin | | \$0 |
| 1110 | 4.1.80.2 | 23% | Etapa de Ejecución de pagos: | 1 | 0 | jue 23/02/17 | 78 días | lun 11/12/17 | jue 29/03/17 | lun 11/12/17 | NOD | | \$25,410 Fin | | \$5,090 |
| 1111 | 4.1.80.2.1 | 100% | Pago Producto No. 1 20% del valor del contrato | 0 | 0 | jue 23/02/17 | 12 días | lun 11/12/17 | mié 27/12/17 | lun 11/12/17 | mié 27/12/17 | 1109 | \$5,090 Fin | | \$5,090 |
| 1112 | 4.1.80.2.2 | 0% | Pago Producto No. 2 50% del valor del contrato | 1 | 0 | jue 23/02/17 | 22 días | mar 02/01/18 | mié 31/01/18 | NOD | NOD | | \$12,706 Fin | | \$0 |
| 1113 | 4.1.80.2.3 | 0% | Pago Producto No. 3 30% del valor del contrato | 0 | 0 | jue 23/02/17 | 19 días | lun 05/03/18 | jue 29/03/18 | NOD | NOD | 1112FC- | \$7,614 Fin | | \$0 |
| 1114 | 4.1.81 | 100% | Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile | 0 | 0 | jue 05/01/17 | 132 días | lun 22/05/17 | vie 24/11/17 | lun 22/05/17 | vie 24/11/17 | | \$28,541 Fin | | \$28,541 |
| 1122 | 4.1.82 | 100% | Proceso de Contratación: Encuesta de percepcion social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015 | 0 | 0 | lun 12/01/15 | 89 días | lun 12/01/15 | vie 15/05/15 | lun 12/01/15 | vie 15/05/15 | | \$15,666 Fin | | \$15,666 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|
| División crítica | | Project Summary | ▬ | Inactive Summary | ▬ | Start-only | ⌈ | Margen de demora | ▬ |
| Task | ▬ | External Tasks | ▬ | Manual Task | ▬ | Finish-only | ⌋ | Retrasada | ▬ |
| Split | | External Milestone | ◇ | Duration-only | ▬ | Deadline | ↓ | Tareas críticas | ▬ |
| Milestone | ◆ | Inactive Task | ▬ | Manual Summary Rollup | ▬ | Progress | ▬ | | |
| Summary | ▬ | Inactive Milestone | ▬ | Manual Summary | ▬ | Progreso manual | ▬ | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasadas | Actividades Próximas Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real |
|------|------------|----------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|------|----------------|---------|------------|
| 1130 | 4.1.83 | 100% | Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015 | 0 | 0 | 0 lun 04/05/15 | 80 días | 04/05/15 | vie 28/08/15 | 04/05/15 | vie 28/08/15 | | \$1,130 Fin | | \$1,130 |
| 1135 | 4.1.84 | 100% | Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016 | 0 | 0 | 02/02/16 | mar 230 días | 02/02/16 | mié 21/12/16 | 02/02/16 | mié 21/12/16 | | \$1,501 Fin | | \$1,501 |
| 1141 | 4.1.85 | 100% | Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017 | 0 | 0 | 02/02/17 | 128 días | 13/03/17 | vie 08/09/17 | 13/03/17 | vie 08/09/17 | | \$1,460 Fin | | \$1,460 |
| 1147 | 4.1.86 | 100% | Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014 | 0 | 0 | 02/09/14 | 29 días | 22/09/14 | jue 30/10/14 | 22/09/14 | jue 30/10/14 | | \$1,800 Fin | | \$1,800 |
| 1152 | 4.1.87 | 100% | Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015 | 0 | 0 | 02/03/15 | 173 días | 23/03/15 | lun 30/11/15 | 23/03/15 | lun 30/11/15 | | \$8,543 Fin | | \$8,543 |
| 1157 | 4.1.88 | 100% | Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016 | 0 | 0 | 04/07/16 | 157 días | 04/07/16 | lun 20/02/17 | 04/07/16 | lun 20/02/17 | | \$13,742 Fin | | \$13,742 |
| 1166 | 4.1.89 | 100% | Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017 | 0 | 0 | 05/06/17 | 34 días | 08/08/17 | lun 25/09/17 | 08/08/17 | lun 25/09/17 | | \$1,147 Fin | | \$1,147 |
| 1175 | 4.1.90 | 0% | Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018 | 0 | 4 | 05/06/17 | 24 días | 05/02/18 | jue 08/03/18 | NOD | NOD | | \$1,000 Fin | | \$0 |
| 1176 | 4.1.90.1 | 0% | Etapas de Adquisición: | 0 | 4 | 05/06/17 | 23 días | 05/02/18 | mié 07/03/18 | NOD | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1177 | 4.1.90.1.1 | 0% | Elaboracion de Especificaciones | 0 | 1 | 05/06/17 | 3 días | 05/02/18 | mié 07/02/18 | NOD | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1178 | 4.1.90.1.2 | 0% | No Objeción | 0 | 1 | NOD | 5 días | 08/02/18 | mié 14/02/18 | NOD | NOD 1177 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1179 | 4.1.90.1.3 | 0% | Publicación y Evaluación | 0 | 1 | 12/06/17 | 5 días | 15/02/18 | mié 21/02/18 | NOD | NOD 1178 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1180 | 4.1.90.1.4 | 0% | No Objeción | 0 | 1 | NOD | 5 días | 22/02/18 | mié 28/02/18 | NOD | NOD 1179 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1181 | 4.1.90.1.5 | 0% | Adjudicación y Contratación | 0 | 0 | 26/06/17 | 5 días | 01/03/18 | mié 07/03/18 | NOD | NOD 1180 | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1182 | 4.1.90.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 0 | 0 | 10/07/17 | 1 día | 08/03/18 | jue 08/03/18 | NOD | NOD | | \$1,000 Fin | | \$0 |
| 1183 | 4.1.90.2.1 | 0% | Pago | 0 | 0 | 10/07/17 | 1 día | 08/03/18 | jue 08/03/18 | NOD | NOD 1181 | | \$1,000 Fin | | \$0 |
| 1184 | 4.1.91 | 100% | Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015 | 0 | 0 | 02/03/15 | 123 días | 02/03/15 | vie 28/08/15 | 02/03/15 | vie 28/08/15 | | \$2,306 Fin | | \$2,306 |
| 1189 | 4.1.92 | 100% | Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016 | 0 | 0 | 22/08/16 | 7 días | 22/08/16 | mar 30/08/16 | 22/08/16 | mar 30/08/16 | | \$1,961 Fin | | \$1,961 |
| 1194 | 4.1.93 | 100% | Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick Up) | 0 | 0 | 17/07/17 | 10 días | 04/04/17 | lun 17/04/17 | 04/04/17 | lun 17/04/17 | | \$4,975 Fin | | \$4,975 |
| 1199 | 4.1.94 | 100% | Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camion) | 0 | 0 | 17/07/17 | 42 días | 17/07/17 | mié 13/09/17 | 17/07/17 | mié 13/09/17 | | \$1,808 Fin | | \$1,808 |
| 1204 | 4.1.95 | 100% | Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2015 | 0 | 0 | 08/06/15 | 16 días | 08/06/15 | lun 29/06/15 | 08/06/15 | lun 29/06/15 | | \$681 Fin | | \$681 |
| 1209 | 4.1.96 | 100% | Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2016 | 0 | 0 | 01/04/16 | 174 días | 01/04/16 | mar 06/12/16 | 01/04/16 | mar 06/12/16 | | \$1,236 Fin | | \$1,236 |
| 1216 | 4.1.97 | 100% | Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2017 | 0 | 0 | 17/02/17 | 193 días | 08/03/17 | jue 07/12/17 | 08/03/17 | jue 07/12/17 | | \$1,084 Fin | | \$1,084 |
| 1224 | 4.1.98 | 0% | Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2018 | 1 | 0 | 17/02/17 | 116 días | 02/01/18 | jue 14/06/18 | NOD | NOD | | \$5,000 Fin | | \$0 |
| 1225 | 4.1.98.1 | 0% | Etapas de Adquisición: | 1 | 0 | 17/02/17 | 4 días | 02/01/18 | vie 05/01/18 | NOD | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1226 | 4.1.98.1.1 | 0% | Proceso de Compra | 1 | 0 | 17/02/17 | 4 días | 02/01/18 | vie 05/01/18 | NOD | NOD | | \$0 Fin | | \$0 |
| 1227 | 4.1.98.2 | 0% | Etapas de Ejecución de pagos: | 0 | 0 | 03/03/17 | 116 días | 02/01/18 | jue 14/06/18 | NOD | NOD | | \$5,000 Fin | | \$0 |
| 1228 | 4.1.98.2.1 | 0% | Entrega | 0 | 0 | 03/03/17 | 116 días | 02/01/18 | jue 14/06/18 | NOD | NOD | | \$5,000 Fin | | \$0 |
| 1229 | 4.1.99 | 100% | Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015 | 0 | 0 | 04/05/15 | 19 días | 04/05/15 | jue 28/05/15 | 04/05/15 | jue 28/05/15 | | \$3,731 Fin | | \$3,731 |
| 1234 | 4.1.100 | 100% | Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016 | 0 | 0 | 29/08/16 | 24 días | 29/08/16 | vie 30/09/16 | 29/08/16 | vie 30/09/16 | | \$305 Fin | | \$305 |
| 1239 | 4.1.101 | 100% | Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017 | 0 | 0 | 29/08/16 | 21 días | 06/02/17 | lun 06/03/17 | 06/02/17 | lun 06/03/17 | | \$1,777 Fin | | \$1,777 |
| 1244 | 4.1.102 | 100% | Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014 | 0 | 0 | 16/12/13 | 273 días | 16/12/13 | mié 31/12/13 | 16/12/13 | mié 31/12/14 | | \$4,121 Fin | | \$4,121 |
| 1249 | 4.1.103 | 100% | Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015 | 0 | 0 | 15/12/14 | 261 días | 15/12/14 | mié 23/12/14 | 15/12/14 | mié 23/12/15 | | \$5,084 Fin | | \$5,084 |
| 1254 | 4.1.104 | 100% | Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017 | 0 | 0 | 15/12/14 | 190 días | 06/03/17 | jue 30/11/17 | 06/03/17 | jue 30/11/17 | | \$3,914 Fin | | \$3,914 |
| 1263 | 4.1.105 | 100% | Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II | 0 | 0 | 15/12/14 | 58 días | 03/04/17 | jue 22/06/17 | 03/04/17 | jue 22/06/17 | | \$3,845 Fin | | \$3,845 |
| 1269 | 4.1.106 | 100% | Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017 | 0 | 0 | 15/12/14 | 38 días | 03/04/17 | jue 25/05/17 | 03/04/17 | jue 25/05/17 | | \$1,968 Fin | | \$1,968 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|
| División crítica | | Project Summary | ▬ | Inactive Summary | ▬ | Start-only | ☐ | Margen de demora | ▬ |
| Task | ▬ | External Tasks | ▬ | Manual Task | ▬ | Finish-only | ☐ | Retrasada | ▬ |
| Split | | External Milestone | ◊ | Duration-only | ▬ | Deadline | ↓ | Tareas críticas | ▬ |
| Milestone | ◆ | Inactive Task | ▬ | Manual Summary Rollup | ▬ | Progress | ▬ | | |
| Summary | ▬ | Inactive Milestone | ▬ | Manual Summary | ▬ | Progreso manual | ▬ | | |

| Id | EDT | % Avance | Nombre de la Tarea | Actividad Atrasada | Actividad Próximo Mes | Comienzo previsto | Duración | Inicio | Fin | Comienzo real | Fin real | Pred | Financiamiento | Acumula | Costo Real | |
|------|---------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|----------------|---------|--------------|----------|
| 1274 | 4.1.107 | 100% | Proceso de Contratación: Remodelacion de la Oficina para la Coordinacion de la UE de la SEICMSJ | 0 | 0 | lun 04/05/15 | 41 días | lun 04/05/15 | lun 29/06/15 | lun 04/05/15 | lun 29/06/15 | | | | \$13,734 Fin | \$13,734 |
| 1282 | 4.1.108 | 0% | Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de Oficina para la Coordinación de la UE 2017 | 0 | 0 | lun 06/02/17 | 25 días | lun 06/02/17 | vie 10/03/17 | NOD | NOD | | | \$0 Fin | \$0 | |
| 1289 | 4.1.109 | 100% | Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E. | 0 | 0 | mié 10/12/14 | 305 días | mié 10/12/14 | vie 26/02/16 | mié 10/12/14 | vie 26/02/16 | | | | \$32,055 Fin | \$32,055 |
| 1298 | 4.1.110 | 100% | Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado | 0 | 0 | lun 11/05/15 | 25 días | lun 11/05/15 | vie 12/06/15 | lun 11/05/15 | vie 12/06/15 | | | | \$5,262 Fin | \$5,262 |
| 1305 | 4.1.111 | 100% | Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial | 0 | 0 | jue 09/02/17 | 101 días | lun 31/10/16 | lun 27/03/17 | lun 31/10/16 | lun 27/03/17 | | | | \$11,052 Fin | \$11,052 |
| 1313 | 4.1.112 | 100% | Pago para Participar en el Congreso Amercian Academy Of Forensic : | 0 | 0 | vie 26/02/16 | 1 día | vie 26/02/16 | vie 26/02/16 | vie 26/02/16 | vie 26/02/16 | | | | \$2,480 Fin | \$2,480 |
| 1314 | 4.1.113 | 100% | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones | 0 | 0 | vie 02/01/15 | 260 días | vie 02/01/15 | mié 20/01/16 | vie 02/01/15 | mié 20/01/16 | | | | \$1,704 Fin | \$1,704 |
| 1315 | 4.1.114 | 100% | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015 | 0 | 0 | vie 02/01/15 | 246 días | vie 02/01/15 | mié 23/12/15 | vie 02/01/15 | mié 23/12/15 | | | | \$10 Fin | \$10 |
| 1316 | 4.1.115 | 100% | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016 | 0 | 0 | lun 04/01/16 | 253 días | lun 04/01/16 | lun 26/12/16 | lun 04/01/16 | lun 26/12/16 | | | | \$70 Fin | \$70 |
| 1317 | 4.1.116 | 100% | Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017 | 0 | 0 | NOD | 201 días | vie 17/03/17 | vie 29/12/17 | vie 17/03/17 | vie 29/12/17 | | | | \$80 Fin | \$80 |
| 1318 | 4.1.117 | 100% | Impuestos, Derecho y Tasas 2015 | 0 | 0 | lun 17/08/15 | 5 días | lun 17/08/15 | vie 28/08/15 | lun 17/08/15 | vie 28/08/15 | | | | \$336 Fin | \$336 |
| 1319 | 4.1.118 | 100% | Impuestos, Derecho y Tasas 2016 | 0 | 0 | vie 01/04/16 | 180 días | vie 01/04/16 | mié 14/12/16 | vie 01/04/16 | mié 14/12/16 | | | | \$858 Fin | \$858 |
| 1320 | 4.1.119 | 100% | Impuestos, Derecho y Tasas 2017 | 0 | 0 | NOD | 232 días | jue 02/02/17 | vie 29/12/17 | jue 02/02/17 | vie 29/12/17 | | | | \$825 Fin | \$825 |

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
| División crítica | | Project Summary | | Inactive Summary | | Start-only | | Margen de demora | |
| Task | | External Tasks | | Manual Task | | Finish-only | | Retrasada | |
| Split | | External Milestone | | Duration-only | | Deadline | | Tareas críticas | |
| Milestone | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | Progress | | | |
| Summary | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Progreso manual | | | |

Observaciones / Desafíos

- No aparece el monto actualizado para la Unidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ del Programa "Apoyo Al Sector Justicia Penal" de acuerdo a la última modificación entre componentes sin afectar los montos globales de las categorías asignadas en la segunda transferencia, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-3083/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017.

Alertivos:

- Cambio de autoridades en MINGOB.
- Que no se concluyan los procesos planificados dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

12/2/2018 - 2:59 PM
