

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Abril / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/05/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	23,934,823.15	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

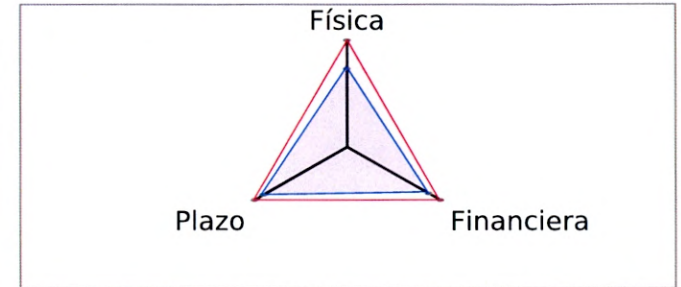

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.41 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	10,900,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1,155,092.77	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	23.23% / 80.19%		
Porcentaje de Ejecución	10.60%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0		0		2	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2		0		2	
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12		0		42	27

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

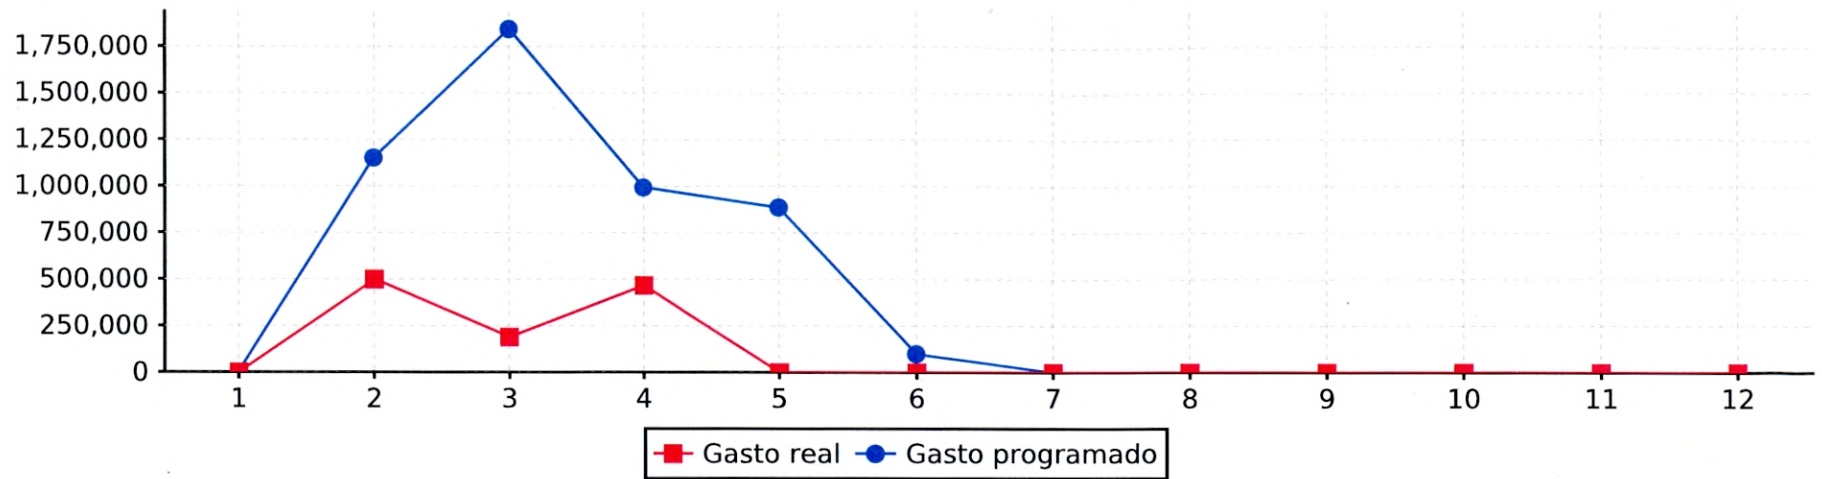

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												1,155,092.77
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	Fuente	Identifica empresa	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo	Trimestres				
																		3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre		
920	BID	No 4.1.66	100%	No			Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17				\$7,653	Fin	\$7,653	\$0			
930	BID	No 4.1.67	100%	No			Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas en el Componente	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17				\$954	Fin	\$954	\$0			
937	BID	No 4.1.68	100%	No			Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15				\$31,281	Fin	\$31,281	\$0			
945	BID	No 4.1.69	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15				\$1,311	Fin	\$1,311	\$0			
952	BID	No 4.1.70	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16				\$5,195	Fin	\$5,195	\$0			
959	BID	No 4.1.71	100%	No			Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16				\$28,536	Fin	\$28,536	\$0			
969	BID	No 4.1.72	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16				\$5,930	Fin	\$5,930	\$0			
980	BID	No 4.1.73	100%	No			Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en Jalapa y Mixco	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16				\$7,930	Fin	\$7,930	\$0			
990	BID	No 4.1.74	100%	No			Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de la	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$8,011	Fin	\$8,011	\$0			
999	BID	No 4.1.75	100%	No			Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16				\$24,832	Fin	\$24,832	\$0			
1009	BID	No 4.1.76	100%	No			Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16				\$25,385	Fin	\$25,385	\$0			
1019	BID	No 4.1.77	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17				\$20,930	Fin	\$20,930	\$0			
1028	BID	No 4.1.78	100%	No			Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17				\$41,594	Fin	\$41,594	\$0			
1037	BID	No 4.1.79	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18				\$25,410	Fin	\$25,410	\$0			
1046	BID	No 4.1.80	100%	No			Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17				\$28,541	Fin	\$28,541	\$0			
1054	BID	No 4.1.81	100%	No			Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15				\$15,666	Fin	\$15,666	\$0			
1062	BID	No 4.1.82	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15				\$1,130	Fin	\$1,130	\$0			
1067	BID	No 4.1.83	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16				\$1,501	Fin	\$1,501	\$0			
1073	BID	No 4.1.84	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17				\$1,460	Fin	\$1,460	\$0			
1079	BID	No 4.1.85	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14				\$1,800	Fin	\$1,800	\$0			
1084	BID	No 4.1.86	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15				\$8,543	Fin	\$8,543	\$0			
1089	BID	No 4.1.87	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17				\$13,742	Fin	\$13,742	\$0			
1098	BID	No 4.1.88	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17				\$1,147	Fin	\$1,147	\$0			
1107	BID	No 4.1.89	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18				\$266	Fin	\$266	\$0			
1116	BID	No 4.1.90	52%	No			Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	22 días	jue 12/04/18	lun 14/05/18	jue 12/04/18	NOD				\$809	Fin	\$0	\$0			
1117		No 4.1.90.	100%	No			Etapas de Adquisición:	12 días	jue 12/04/18	vie 27/04/18	jue 12/04/18	vie 27/04/18				\$0	Fin	\$0	\$0			
1123	BID	No 4.1.90.0%	No	No			Etapas de Ejecución de pagos:	10 días	lun 30/04/18	lun 14/05/18	NOD	NOD				\$809	Fin	\$0	\$0			
1124	BID	No 4.1.90.0%	No	No			Pago	10 días	lun 30/04/18	lun 14/05/18	NOD	NOD	1122			\$809	Fin	\$0	\$0			
1125	BID	No 4.1.91	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18				\$453	Fin	\$453	\$0			
1132	BID	No 4.1.92	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15				\$2,306	Fin	\$2,306	\$0			
1137	BID	No 4.1.93	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16				\$1,961	Fin	\$1,961	\$0			
1142	BID	No 4.1.94	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick Up)	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17				\$4,975	Fin	\$4,975	\$0			
1147	BID	No 4.1.95	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17				\$1,808	Fin	\$1,808	\$0			
1152	BID	No 4.1.96	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15				\$681	Fin	\$681	\$0			
1157	BID	No 4.1.97	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16				\$1,236	Fin	\$1,236	\$0			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: lun 07/05/18

División crítica: Summary

Task: ■■■■■ Project Summary

Split: External Tasks

Milestone: ◆ External Milestone

Inactive Task: □

Inactive Milestone: □

Inactive Summary: □

Manual Task: □

Duration-only: ■■■■■

Manual Summary Rollup: ■■■■■

Manual Summary: ■■■■■

Start-only: ■■■■■

Finish-only: ■■■■■

Deadline: ■■■■■

Progress: ■■■■■

Progreso manual: ■■■■■

Margen de demora: ■■■■■

Retrasada: ■■■■■

Tareas criticas: ■■■■■

Id	Fuente	Identifica empresa	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo	Trimestres			
																	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre	
1164	BID	No 4.1.98	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/...	jue 07/12/17			\$1,084	Fin	\$1,084	\$0			
1172	BID	No 4.1.99	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18			\$593	Fin	\$593	\$0			
1178	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15			\$3,731	Fin	\$3,731	\$0			
1183	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16			\$305	Fin	\$305	\$0			
1188	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17			\$1,777	Fin	\$1,777	\$0			
1193	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14			\$4,121	Fin	\$4,121	\$0			
1198	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15			\$5,084	Fin	\$5,084	\$0			
1203	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17			\$3,914	Fin	\$3,914	\$0			
1212	BID	No 4.1.10	35%	No		Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	23 días	vie 20/04/18	mié 23/05/18	vie 20/04/18	NOD			\$2,037	Fin	\$0	\$0			
1213		No 4.1.10	100%	No		Etapa de Adquisición:	8 días	vie 20/04/18	mié 02/05/18	vie 20/04/18	mié 02/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1214		No 4.1.10	100%	Sí		Contratación	8 días	vie 20/04/18	mié 02/05/18	vie 20/04/18	mié 02/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1215	BID	No 4.1.10	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	15 días	jue 03/05/18	mié 23/05/18	NOD	NOD			\$2,037	Fin	\$0	\$0			
1216	BID	No 4.1.10	0%	No		Pago Hotel Real Continental Guatemala	15 días	jue 03/05/18	mié 23/05/18	NOD	NOD 1214			\$2,037	Fin	\$0	\$0			
1217	BID	No 4.1.10	8%	No		Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	24 días	vie 20/04/18	jue 24/05/18	vie 20/04/18	NOD			\$4,195	Fin	\$0	\$0			
1218		No 4.1.10	100%	No		Etapa de Adquisición:	2 días	vie 20/04/18	lun 23/04/18	vie 20/04/18	lun 23/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1219		No 4.1.10	100%	Sí		Contratación	2 días	vie 20/04/18	lun 23/04/18	vie 20/04/18	lun 23/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1220	BID	No 4.1.10	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	22 días	mar 24/04/18	jue 24/05/18	NOD	NOD			\$4,195	Fin	\$0	\$0			
1221	BID	No 4.1.10	0%	No		Pago	22 días	mar 24/04/18	jue 24/05/18	NOD	NOD 1219			\$4,195	Fin	\$0	\$0			
1222	BID	No 4.1.10	15%	No		Proceso de Contratación: Pago del Impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	26 días	jue 19/04/18	vie 25/05/18	jue 19/04/18	NOD			\$552	Fin	\$0	\$0			
1223		No 4.1.10	100%	No		Etapa de Adquisición:	4 días	jue 19/04/18	mar 24/04/18	jue 19/04/18	mar 24/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1224		No 4.1.10	100%	Sí		Contratación	4 días	jue 19/04/18	mar 24/04/18	jue 19/04/18	mar 24/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1225	BID	No 4.1.10	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	22 días	mié 25/04/18	vie 25/05/18	NOD	NOD			\$552	Fin	\$0	\$0			
1226	BID	No 4.1.10	0%	No		Pago SAT	22 días	mié 25/04/18	vie 25/05/18	NOD	NOD 1224			\$552	Fin	\$0	\$0			
1227	BID	No 4.1.10	48%	No		Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría Ejecutiva de la	23 días	mié 18/04/18	lun 21/05/18	mié 18/04/18	NOD			\$1,351	Fin	\$0	\$0			
1228		No 4.1.10	100%	No		Etapa de Adquisición:	11 días	mié 18/04/18	jue 03/05/18	mié 18/04/...	jue 03/05/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1229		No 4.1.10	100%	No		Elaboración de Terminos de Referencia y Evaluación	4 días	mié 18/04/18	lun 23/04/18	mié 18/04/...	lun 23/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
1230		No 4.1.10	100%	Sí	NO	No Objeción a Contratación	5 días	mar 24/04/18	lun 30/04/18	mar 24/04/...	lun 30/04/18 1229			\$0	Fin	\$0	\$0			
1231		No 4.1.10	100%	No	F	Contratación	2 días	mié 02/05/18	jue 03/05/18	mié 02/05/...	jue 03/05/18 1230			\$0	Fin	\$0	\$0			
1232	BID	No 4.1.10	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	12 días	vie 04/05/18	lun 21/05/18	NOD	NOD			\$1,351	Fin	\$0	\$0			
1233	BID	No 4.1.10	0%	No		Ejecución del Contrato	12 días	vie 04/05/18	lun 21/05/18	NOD	NOD 1231			\$1,351	Fin	\$0	\$0			
1234	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17			\$3,845	Fin	\$3,845	\$0			
1240	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017	38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17			\$1,968	Fin	\$1,968	\$0			
1245	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15			\$13,734	Fin	\$13,734	\$0			
1253	BID	No 4.1.11	0%	No		Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ								\$0	Fin	\$0	\$0			
1260	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/...	vie 26/02/16			\$32,055	Fin	\$32,055	\$0			
1269	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15			\$5,262	Fin	\$5,262	\$0			
1276	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17			\$11,052	Fin	\$11,052	\$0			
1284	BID	No 4.1.11	100%	No		Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16			\$2,480	Fin	\$2,480	\$0			
1285	BID	No 4.1.11	100%	No		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16			\$1,704	Fin	\$1,704	\$0			
1286	BID	No 4.1.11	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15			\$10	Fin	\$10	\$0			
1287	BID	No 4.1.12	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16			\$70	Fin	\$70	\$0			
1288	BID	No 4.1.12	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17			\$80	Fin	\$80	\$0			
1289	BID	No 4.1.12	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2015	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15			\$336	Fin	\$336	\$0			
1290	BID	No 4.1.12	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16			\$858	Fin	\$858	\$0			
1291	BID	No 4.1.12	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2017	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17			\$825	Fin	\$825	\$0			
1292		No 5	2%	No		Clausulas	2655 días	mié 24/10/07	mar 30/01/18	mié 24/10/...	NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			
1306		No 6	3%	No		Plan de Preparación de Cierre	145 días	mié 22/11/17	mié 13/06/18	mié 22/11/...	NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			
1338		No 7	0%	No		Fase de Cierre	34 días	lun 30/04/18	vie 15/06/18	NOD	NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			
1364		No 8	0%	Sí		Fin del Programa	1 día	jue 14/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: lun 07/05/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬇ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de Abril / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 14/6/2018; así como el total de meses de ampliación que son 18 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-3007/2017 de fecha 8/12/2017.

Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 14/6/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navarcho



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

9/5/2018 - 9:57 AM
