

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	11/09/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,419,333.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

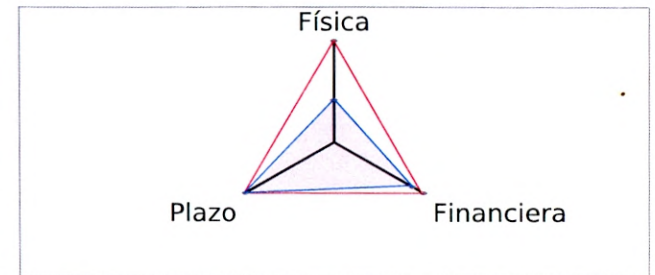

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,518,783.47	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	110.98% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	84.90%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	21	0		42	48

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoria Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Termino y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Ajudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

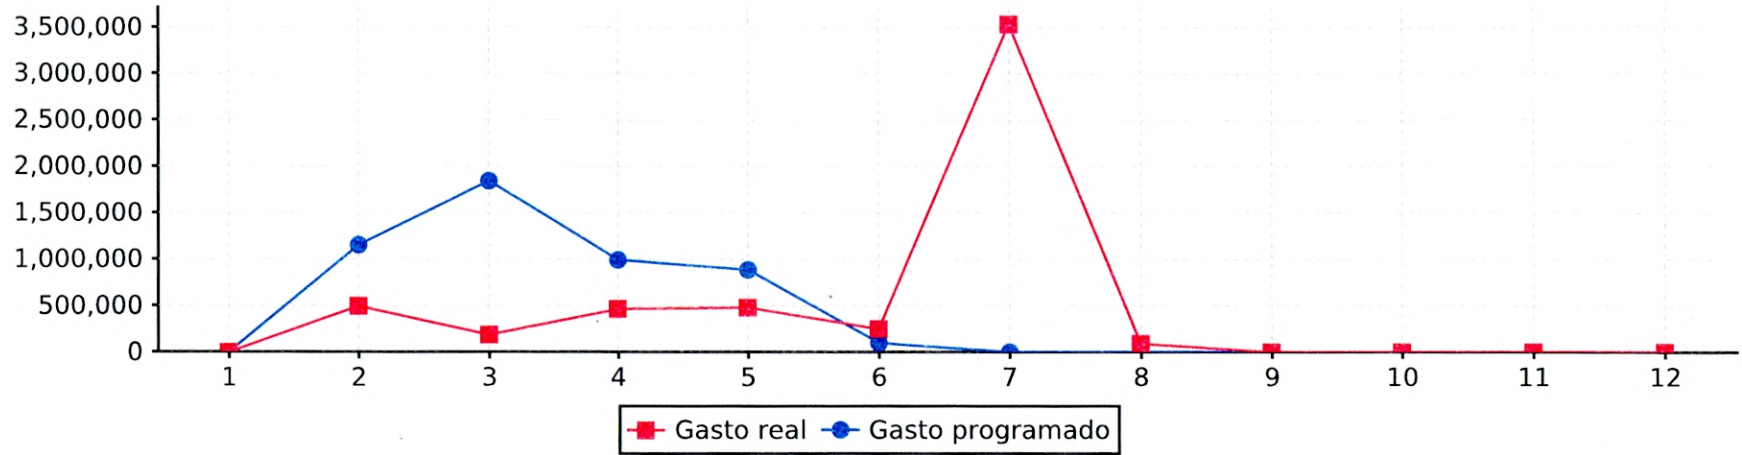

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												5,518,783.47
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	Fuen	Ident	EDT	%	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamient	Acumula	Costo Real	Anticipo	Años		
																				Atasad	Proxim	Mes
0	0%	No 0	91%	No			PEP_SMART_1905_7_9 2018	20	16 2849 días	mié 24/10/07	mié 31/10/18	mié 24/10/07		NOD		\$3,245,784 Fin	\$3,145,010	\$0				
1	...	BID No 1	100%	No			Componente 1: Acceso a la Justicia	0	0 947 días	lun 06/10/14	mar 26/06/18	lun 06/10/14	mar 26/06/18			\$25,479 Fin	\$25,479	\$0				
2	...	BID No 1.1	100%	No			P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0	0 131 días	mar 26/12/11	mar 26/06/18	mar 26/12...	mar 26/06/18			\$24,170 Fin	\$24,170	\$0				
3	...	BID No 1.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	0	0 131 días	mar 26/12/17	mar 26/06/18	mar 26/12/17	mar 26/06/18			\$24,170 Fin	\$24,170	\$0				
11	...	BID No 1.2	100%	No			P4. Comisarías de Policía TIPO construidas (MG)	0	0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15			\$1,309 Fin	\$1,309	\$0				
12	...	BID No 1.2.1	100%	No			Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB	0	0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15			\$1,309 Fin	\$1,309	\$0				
20	...	BID No 2	100%	No			Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	0	0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18			\$634,548 Fin	\$634,548	\$0				
21	...	BID No 2.1	100%	No			P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	0	0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18			\$634,548 Fin	\$634,548	\$0				
22	...	BID No 2.1.1	100%	No			Interconexión en SE	0	0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18			\$634,548 Fin	\$634,548	\$0				
23	...	BID No 2.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015	0	0 069 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15			\$142,498 Fin	\$142,498	\$0				
34	...	BID No 2.1.1.2	100%	No			Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016	0	0 379 días	jue 01/09/16	mié 28/02/18	jue 01/09/16	mié 28/02/18			\$84,909 Fin	\$84,909	\$0				
45	...	BID No 2.1.1.3	100%	No			Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEICMSJ	0	0 080 días	lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16			\$1,137 Fin	\$1,137	\$0				
55	...	BID No 2.1.1.4	100%	No			Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia 20	0	0 049 días	mié 24/09/14	mar 02/12/14	mié 24/09/14	mar 02/12/14			\$7,494 Fin	\$7,494	\$0				
61	...	BID No 2.1.1.5	100%	No			Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia 20	0	0 294 días	lun 17/11/14	mié 20/01/16	lun 10/11/14	mié 23/12/15			\$78,164 Fin	\$78,164	\$0				
67	...	BID No 2.1.1.6	100%	No			Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia 20	0	0 238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16			\$114,770 Fin	\$114,770	\$0				
83	...	BID No 2.1.1.7	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF	0	0 146 días	lun 23/05/16	vie 16/12/16	lun 23/05/16	vie 16/12/16			\$104,369 Fin	\$104,369	\$0				
93	...	BID No 2.1.1.8	100%	No			Proceso de Contratación: Administración Interoperatividad 2014	0	0 27 días	lun 24/11/14	mar 30/12/14	lun 24/11/14	mar 30/12/14			\$2,584 Fin	\$2,584	\$0				
99	...	BID No 2.1.1.9	100%	No			Proceso de Contratación: Administración Interoperatividad 2015	0	0 200 días	lun 08/12/14	mar 22/09/15	lun 08/12/14	mar 22/09/15			\$21,307 Fin	\$21,307	\$0				
105	...	BID No 2.1.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de	0	0 232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$32,715 Fin	\$32,715	\$0				
123	...	BID No 2.1.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	0	0 167 días	lun 21/08/17	jue 12/04/18	lun 21/08/17	jue 12/04/18			\$23,093 Fin	\$23,093	\$0				
137	...	BID No 2.1.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal	0	0 102 días	mar 09/05/17	vie 29/09/17	mar 09/05/17	vie 29/09/17			\$21,479 Fin	\$21,479	\$0				
141	...	BID No 2.1.1.11	100%	No			Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0 083 días	lun 05/06/17	vie 29/09/17	lun 05/06/17	vie 29/09/17			\$30 Fin	\$30	\$0				
142	...	BID No 3	88%	No			Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	2	4 849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	NOD			\$952,708 Fin	\$909,133	\$0				
143	...	BID No 3.1	100%	No			P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	0	0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18			\$433,175 Fin	\$433,175	\$0				
144	...	BID No 3.1.1	100%	No			Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	0	0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18			\$433,175 Fin	\$433,175	\$0				
145	...	BID No 3.1.1.1	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0	0 119 días	mar 13/10/15	mié 30/03/16	mar 13/10/15	mié 30/03/16			\$97,760 Fin	\$97,760	\$0				
153	...	BID No 3.1.1.2	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0	0 211 días	lun 28/11/16	jue 28/09/17	lun 28/11/16	jue 28/09/17			\$9,655 Fin	\$9,655	\$0				
163	...	BID No 3.1.1.3	100%	No			Proceso de Adquisición: Vehículos	0	0 058 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15			\$50,046 Fin	\$50,046	\$0				
172	...	BID No 3.1.1.4	100%	No			Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector Justicia	0	0 350 días	mié 10/08/16	jue 28/12/17	mié 10/08/16	jue 28/12/17			\$192,996 Fin	\$192,996	\$0				
190	...	BID No 3.1.1.5	100%	No			Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento abreviado para	0	0 138 días	lun 02/10/17	jue 12/04/18	lun 02/10/17	jue 12/04/18			\$45,997 Fin	\$45,997	\$0				
199	...	BID No 3.1.1.6	100%	No			Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado para pueblos indígenas en los procesos penales	0	0 138 días	lun 02/10/17	jue 12/04/18	lun 02/10/17	jue 12/04/18			\$36,681 Fin	\$36,681	\$0				
208	...	BID No 3.1.1.7	100%	No			Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0 084 días	jue 31/08/17	vie 29/12/17	jue 31/08/17	vie 29/12/17			\$40 Fin	\$40	\$0				
209	...	BID No 3.2	99%	No			P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas	2	0 839 días	lun 25/05/15	vie 14/09/18	lun 25/05/15	NOD			\$301,334 Fin	\$272,759	\$0				
210	...	BID No 3.2.1	99%	No			Capacitación de los funcionarios en SE	2	0 839 días	lun 25/05/15	vie 14/09/18	lun 25/05/15	NOD			\$301,334 Fin	\$272,759	\$0				
211	...	BID No 3.2.1.1	100%	No			Proceso de Contratación: Gastos de Viáticos John Jay College	0	0 025 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16			\$13,582 Fin	\$13,582	\$0				
217	...	BID No 3.2.1.2	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación	0	0 029 días	lun 20/06/16	vie 29/07/16	lun 20/06/16	vie 29/07/16			\$1,667 Fin	\$1,667	\$0				
226	...	No 3.2.1.3	100%	No			Análisis de consultora	0	0 017 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15	lun 25/05/15	mar 16/06/15			\$0 Fin	\$0	\$0				
227	...	BID No 3.2.1.4	98%	No			Proceso de Contratación: Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo	2	0 686 días	lun 11/01/16	vie 14/09/18	lun 11/01/16	NOD			\$285,761 Fin	\$257,186	\$0				

Project: PEP_SMART_1905_7_9 20
Date: mar 11/09/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◊ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	

Id	Fuen	Ident	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiam	Acumula	Costo Real	Anticipo	Años				
																				At	Próxim	Mes	2006	2007
412	...	BID	No 4.1.15	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0 20 días	mar	02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15				\$6,244 Fin	\$6,244	\$0	2006	2007	2008	
417	...	BID	No 4.1.16	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0 213 días	mar	02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16				\$33,135 Fin	\$33,135	\$0				
428	...	BID	No 4.1.17	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0 221 días	lun	06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17				\$38,194 Fin	\$38,194	\$0				
442	...	BID	No 4.1.18	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0 220 días	jue	02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14				\$4,241 Fin	\$4,241	\$0				
447	...	BID	No 4.1.19	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 222 días	lun	02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15				\$2,021 Fin	\$2,021	\$0				
452	...	BID	No 4.1.20	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 226 días	mar	02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16				\$19,651 Fin	\$19,651	\$0				
465	...	BID	No 4.1.21	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 201 días	lun	13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17				\$16,591 Fin	\$16,591	\$0				
476	...	BID	No 4.1.22	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2014	0	0 111 días	lun	02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15				\$13,703 Fin	\$13,703	\$0				
488	...	BID	No 4.1.23	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2015	0	0 164 días	jue	30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17				\$24,325 Fin	\$24,325	\$0				
501	...	BID	No 4.1.24	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2016	0	0 177 días	lun	14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17				\$51,789 Fin	\$51,789	\$0				
509	...	BID	No 4.1.25	60%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2017	1	1 296 días	lun	28/08/17	lun 22/10/18	lun 28/08/17	NOD				\$69,920 Fin	\$23,441	\$0				
510	No 4.1.25	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 63 días	lun	28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17				\$0 Fin	\$0	\$0				
517	...	BID	No 4.1.25	14%	No		Etapas de Ejecución de pagos:	1	1 149 días	vie	23/03/18	lun 22/10/18	vie 23/03/18	NOD				\$69,920 Fin	\$23,441	\$0				
518	...	BID	No 4.1.25	100%	No		Primer Producto 20% del valor del contrato	0	0 2 días	vie	23/03/18	lun 26/03/18	vie 23/03/18	lun 26/03/18	516FC+				\$11,760 Fin	\$11,760	\$0			
519	...	BID	No 4.1.25	100%	No		Segundo Producto 20% del valor del contrato	0	0 4 días	jue	17/05/18	mar 22/05/18	jue 17/05/18	mar 22/05/18	518FC+				\$11,681 Fin	\$11,681	\$0			
520	...	BID	No 4.1.25	0%	No		Tercer Producto 20% del valor del contrato	0	0 11 días	lun	03/09/18	lun 17/09/18	NOD	NOD				\$11,760 Fin	\$0	\$0				
521	...	BID	No 4.1.25	0%	No		Cuarto Producto 40% del valor del contrato	1	0 10 días	lun	03/09/18	vie 14/09/18	NOD	NOD				\$23,519 Fin	\$0	\$0				
522	...	BID	No 4.1.25	0%	No		Ampliación de Tiempo e Incremento al contrato	0	0 15 días	lun	01/10/18	lun 22/10/18	NOD	NOD				\$11,200 Fin	\$0	\$0				
523	...	BID	No 4.1.26	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	0	0 148 días	jue	30/11/17	mar 26/06/18	jue 30/11/17	mar 26/06/18				\$25,328 Fin	\$25,328	\$0				
532	...	BID	No 4.1.27	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	0	0 531 días	lun	02/12/13	mié 23/12/15	lun 02/12/13	mié 23/12/15				\$6,977 Fin	\$6,977	\$0				
539	...	BID	No 4.1.28	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	0	0 264 días	mié	10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15				\$2,362 Fin	\$2,362	\$0				
546	...	BID	No 4.1.29	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	0	0 283 días	lun	02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14				\$10,220 Fin	\$10,220	\$0				
553	...	BID	No 4.1.30	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	0	0 264 días	mié	10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15				\$13,846 Fin	\$13,846	\$0				
560	...	BID	No 4.1.31	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	0	0 259 días	jue	10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16				\$17,634 Fin	\$17,634	\$0				
578	...	BID	No 4.1.32	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	0	0 232 días	vie	20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$17,996 Fin	\$17,996	\$0				
596	...	BID	No 4.1.33	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	0	0 130 días	jue	14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$10,524 Fin	\$10,524	\$0				
608	...	BID	No 4.1.34	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018 (2)	0	0 53 días	vie	15/06/18	jue 30/08/18	vie 15/06/18	jue 30/08/18				\$3,460 Fin	\$3,460	\$0				
617	...	BID	No 4.1.35	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	0	0 220 días	lun	09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15				\$12,957 Fin	\$12,957	\$0				
625	...	BID	No 4.1.36	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	0	0 259 días	jue	10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16				\$17,634 Fin	\$17,634	\$0				
643	...	BID	No 4.1.37	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	0	0 232 días	vie	20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$17,997 Fin	\$17,997	\$0				
661	...	BID	No 4.1.38	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	0	0 130 días	jue	14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$10,524 Fin	\$10,524	\$0				
673	...	BID	No 4.1.39	74%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018 (2)	1	0 64 días	vie	15/06/18	jue 14/09/18	vie 15/06/18	NOD				\$5,230 Fin	\$3,460	\$0				
674	No 4.1.39	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	vie	15/06/18	mar 10/07/18	vie 15/06/18	mar 10/07/18				\$0 Fin	\$0	\$0				
678	...	BID	No 4.1.39	47%	No		Etapas de Ejecución de Pagos:	1	0 38 días	lun	23/07/18	jue 14/09/18	lun 23/07/18	NOD				\$5,230 Fin	\$3,460	\$0				
679	...	BID	No 4.1.39	100%	No		Julio 2018	0	0 4 días	lun	23/07/18	vie 27/07/18	lun 23/07/18	vie 27/07/18				\$1,738 Fin	\$1,738	\$0				
680	...	BID	No 4.1.39	100%	No		Agosto 2018	0	0 5 días	vie	24/08/18	jue 30/08/18	vie 24/08/18	jue 30/08/18				\$1,722 Fin	\$1,722	\$0				
681	...	BID	No 4.1.39	0%	No		Septiembre 2018	1	0 10 días	lun	03/09/18	vie 14/09/18	NOD	NOD				\$1,770 Fin	\$0	\$0				
682	...	BID	No 4.1.40	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	0	0 214 días	mar	17/02/15	mié 23/12/15	mar 17/02/15	mié 23/12/15				\$10,769 Fin	\$10,769	\$0				
689	...	BID	No 4.1.41	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	0	0 259 días	jue	10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16				\$17,634 Fin	\$17,634	\$0				
707	...	BID	No 4.1.42	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	0	0 232 días	vie	20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$17,996 Fin	\$17,996	\$0				
725	...	BID	No 4.1.43	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	0	0 130 días	jue	14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$10,524 Fin	\$10,524	\$0				
737	...	BID	No 4.1.44	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018 (2)	0	0 43 días	vie	15/06/18	jue 16/08/18	vie 15/06/18	jue 16/08/18				\$2,607 Fin	\$2,607	\$0				
746	...	BID	No 4.1.45	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	0	0 261 días	lun	15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15				\$21,539 Fin	\$21,539	\$0				
753	...	BID	No 4.1.46	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	0	0 259 días	jue	10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127	\$0				
771	...	BID	No 4.1.47	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	0	0 232 días	vie	20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448	\$0				
789	...	BID	No 4.1.48	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	0	0 130 días	jue	14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190	\$0				
801	...	BID	No 4.1.49	74%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018 (2)	1	0 64 días	vie	15/06/18	jue 14/09/18	vie 15/06/18	NOD				\$8,048 Fin	\$5,323	\$0				
802	No 4.1.49	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	vie	15/06/18	mar 10/07/18	vie 15/06/18	mar 10/07/18				\$0 Fin	\$0	\$0				
806	...	BID	No 4.1.49	47%	No		Etapas de Ejecución de Pagos:	1	0 38 días	lun	23/07/18	jue 14/09/18	lun 23/07/18	NOD				\$8,048 Fin	\$5,323	\$0				
807	...	BID	No 4.1.49	100%	No		Julio 2018	0	0 4 días	lun	23/07/18	vie 27/07/18	lun 23/07/18	vie 27/07/18				\$2,674 Fin	\$2,674	\$0				

Project: PEP_SMART_1905_79_20
Date: mar 11/09/18

División crítica: Summary
 Task: Project Summary
 Split: External Tasks
 Milestone: ◆ External Milestone

Inactive Task: []
 Inactive Milestone: []
 Inactive Summary: []
 Manual Task: []

Duration-only: []
 Manual Summary Rollup: []
 Manual Summary: []
 Start-only: []

Finish only: []
 Deadline: []
 Progress: []
 Progreso manual: []

Margen de demora: []
 Retrasada: []
 Tareas críticas: []

Id	Fuen	Ident	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo	Años			
																				Atrasad	Próxim	Mes	2006
808	...	BID	No 4.1.49.	100%	No		Agosto 2018	0	0	5 días	vie 24/08/18	jue 30/08/18	vie 24/08/18	jue 30/08/18				\$2,649 Fin	\$2,649	\$0			
809	...	BID	No 4.1.49.	0%	No		Septiembre 2018	1	0	10 días	lun 03/09/18	vie 14/09/18	NOD	NOD				\$2,725 Fin	\$0	\$0			
810	...	BID	No 4.1.50	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015	0	0	080 días	mié 02/09/15	mié 23/12/15	mié 02/09/...	mié 23/12/15				\$6,924 Fin	\$6,924	\$0			
817	...	BID	No 4.1.51	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016	0	0	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
835	...	BID	No 4.1.52	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
853	...	BID	No 4.1.53	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190	\$0			
865	...	BID	No 4.1.54	74%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018 (2)	1	0	64 días	vie 15/06/18	vie 14/09/18	vie 15/06/18	NOD				\$8,048 Fin	\$5,323	\$0			
866	...	BID	No 4.1.54.	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0	18 días	vie 15/06/18	mar 10/07/18	vie 15/06/18	mar 10/07/18				\$0 Fin	\$0	\$0			
870	...	BID	No 4.1.54.	47%	No		Etapas de Ejecución de Pagos:	1	0	38 días	lun 23/07/18	vie 14/09/18	lun 23/07/18	NOD				\$8,048 Fin	\$5,323	\$0			
871	...	BID	No 4.1.54.	100%	No		Julio 2018	0	0	4 días	lun 23/07/18	vie 27/07/18	lun 23/07/18	vie 27/07/18				\$2,674 Fin	\$2,674	\$0			
872	...	BID	No 4.1.54.	100%	No		Agosto 2018	0	0	5 días	vie 24/08/18	jue 30/08/18	vie 24/08/18	jue 30/08/18				\$2,649 Fin	\$2,649	\$0			
873	...	BID	No 4.1.54.	0%	No		Septiembre 2018	1	0	10 días	lun 03/09/18	vie 14/09/18	NOD	NOD				\$2,725 Fin	\$0	\$0			
874	...	BID	No 4.1.55	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2014	0	0	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14				\$2,587 Fin	\$2,587	\$0			
881	...	BID	No 4.1.56	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2015	0	0	225 días	lun 02/02/15	mié 23/12/15	lun 02/02/15	mié 23/12/15				\$20,915 Fin	\$20,915	\$0			
888	...	BID	No 4.1.57	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016	0	0	226 días	mar 08/12/15	vie 28/10/16	mar 08/12...	vie 28/10/16				\$23,328 Fin	\$23,328	\$0			
904	...	BID	No 4.1.58	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016 (2do Consultor)	0	0	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$3,598 Fin	\$3,598	\$0			
912	...	BID	No 4.1.59	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$27,913 Fin	\$27,913	\$0			
929	...	BID	No 4.1.60	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como Apoyo al OJ	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$4,724 Fin	\$4,724	\$0			
937	...	BID	No 4.1.61	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como Apoyo al MP	0	0	64 días	lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16				\$5,992 Fin	\$5,992	\$0			
946	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$3,542 Fin	\$3,542	\$0			
954	...	BID	No 4.1.63	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	0	0	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
972	...	BID	No 4.1.64	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	0	0	112 días	vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17				\$14,687 Fin	\$14,687	\$0			
984	...	BID	No 4.1.65	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	0	0	78 días	lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16				\$8,306 Fin	\$8,306	\$0			
994	...	BID	No 4.1.66	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
1012	...	BID	No 4.1.67	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190	\$0			
1024	...	BID	No 4.1.68	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018 (2)	0	0	53 días	vie 15/06/18	jue 30/08/18	vie 15/06/18	jue 30/08/18				\$5,323 Fin	\$5,323	\$0			
1033	...	BID	No 4.1.69	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSI	0	0	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17				\$0 Fin	\$0	\$0			
1043	...	BID	No 4.1.70	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	0	0	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17				\$7,653 Fin	\$7,653	\$0			
1053	...	BID	No 4.1.71	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas en el Componente	0	0	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17				\$954 Fin	\$954	\$0			
1060	...	BID	No 4.1.72	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	0	0	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15				\$31,281 Fin	\$31,281	\$0			
1068	...	BID	No 4.1.73	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	0	0	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15				\$1,311 Fin	\$1,311	\$0			
1075	...	BID	No 4.1.74	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	0	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16				\$5,195 Fin	\$5,195	\$0			
1082	...	BID	No 4.1.75	100%	No		Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16				\$28,536 Fin	\$28,536	\$0			
1092	...	BID	No 4.1.76	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16				\$5,930 Fin	\$5,930	\$0			
1103	...	BID	No 4.1.77	100%	No		Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en Jalapa y Mixco	0	0	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16				\$7,930 Fin	\$7,930	\$0			
1113	...	BID	No 4.1.78	100%	No		Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de la	0	0	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$8,011 Fin	\$8,011	\$0			

Project: PEP_SMART_1905_79_20
Date: mar 11/09/18

División crítica: Summary
 Task: [Barra azul] Project Summary
 Split: External Tasks
 Milestone: ◆ External Milestone

Inactive Task: [Barra gris] Inactive Task
 Inactive Milestone: [Barra gris] Inactive Milestone
 Inactive Summary: [Barra gris] Inactive Summary
 Manual Task: [Barra gris] Manual Task

Duration-only: [Barra azul] Duration-only
 Manual Summary Rollup: [Barra azul] Manual Summary Rollup
 Manual Summary: [Barra azul] Manual Summary
 Start-only: [Barra azul] Start-only

Finish-only: [Barra azul] Finish-only
 Deadline: [Barra azul] Deadline
 Progress: [Barra azul] Progress
 Progreso manual: [Barra azul] Progreso manual

Margen de demora: [Barra azul] Margen de demora
 Retrasada: [Barra azul] Retrasada
 Tareas críticas: [Barra roja] Tareas críticas

Id	%	Fuen	Ident	EDT	%	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo	2006			2007			2008									
																					co	empr	Avanc	Attras	Próxim	Mes										
1122	...	BID	No 4.1.79	100%	No			Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	083 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16			\$24,832	Fin	\$24,832	\$0																
1132	...	BID	No 4.1.80	100%	No			Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16			\$25,385	Fin	\$25,385	\$0																
1142	...	BID	No 4.1.81	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17			\$20,930	Fin	\$20,930	\$0																
1151	...	BID	No 4.1.82	100%	No			Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17			\$41,594	Fin	\$41,594	\$0																
1160	...	BID	No 4.1.83	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSI	0	0120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18			\$25,410	Fin	\$25,410	\$0																
1169	...	BID	No 4.1.84	100%	No			Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17			\$28,541	Fin	\$28,541	\$0																
1177	...	BID	No 4.1.85	100%	No			Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	089 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15			\$15,666	Fin	\$15,666	\$0																
1185	...	BID	No 4.1.86	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	080 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15			\$1,130	Fin	\$1,130	\$0																
1190	...	BID	No 4.1.87	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16			\$1,501	Fin	\$1,501	\$0																
1196	...	BID	No 4.1.88	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17			\$1,460	Fin	\$1,460	\$0																
1202	...	BID	No 4.1.89	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	029 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14			\$1,800	Fin	\$1,800	\$0																
1207	...	BID	No 4.1.90	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15			\$8,543	Fin	\$8,543	\$0																
1212	...	BID	No 4.1.91	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17			\$13,742	Fin	\$13,742	\$0																
1221	...	BID	No 4.1.92	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	034 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17			\$1,147	Fin	\$1,147	\$0																
1230	...	BID	No 4.1.93	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	053 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18			\$266	Fin	\$266	\$0																
1239	...	BID	No 4.1.94	100%	No			Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	0	028 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18			\$803	Fin	\$803	\$0																
1248	...	BID	No 4.1.95	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	034 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18			\$453	Fin	\$453	\$0																
1255	...	BID	No 4.1.96	40%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	1	05 días	mar 04/09/18	lun 10/09/18	mar 04/09/18	NOD			\$560	Fin	\$0	\$0																
1256	...		No 4.1.96.1	100%	No			Etapas de Adquisición:	0	02 días	mar 04/09/18	mié 05/09/18	mar 04/09/18	mié 05/09/18			\$0	Fin	\$0	\$0																
1260	...	BID	No 4.1.96.0	0%	No			Etapas de Ejecución de pagos:	1	03 días	jue 06/09/18	lun 10/09/18	NOD	NOD			\$560	Fin	\$0	\$0																
1261	...	BID	No 4.1.96.0	0%	No			Pago	1	03 días	jue 06/09/18	lun 10/09/18	NOD	NOD	1259		\$560	Fin	\$0	\$0																
1262	...	BID	No 4.1.97	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15			\$2,306	Fin	\$2,306	\$0																
1267	...	BID	No 4.1.98	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	07 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16			\$1,961	Fin	\$1,961	\$0																
1272	...	BID	No 4.1.99	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick Up)	0	010 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17			\$4,975	Fin	\$4,975	\$0																
1277	...	BID	No 4.1.100	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	042 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17			\$1,808	Fin	\$1,808	\$0																
1282	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	0	016 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15			\$681	Fin	\$681	\$0																
1287	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	0	0174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16			\$1,236	Fin	\$1,236	\$0																
1294	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	0	0193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17			\$1,084	Fin	\$1,084	\$0																
1302	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	0	019 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18			\$593	Fin	\$593	\$0																
1308	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	019 días	lun 04/05/15	vie 28/05/15	lun 04/05/15	vie 28/05/15			\$3,731	Fin	\$3,731	\$0																
1313	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	024 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16			\$305	Fin	\$305	\$0																
1318	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	021 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17			\$1,777	Fin	\$1,777	\$0																
1323	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	0	0273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14			\$4,121	Fin	\$4,121	\$0																
1328	...	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	0	0261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15			\$5,084	Fin	\$5,084	\$0																
1333	...	BID	No 4.1.111	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	0	0190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17			\$3,914	Fin	\$3,914	\$0																
1342	...	BID	No 4.1.111	100%	No			Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	0	026 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18			\$2,018	Fin	\$2,018	\$0																
1347	...	BID	No 4.1.111	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	0	029 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18			\$4,841	Fin	\$4,841	\$0																

Project: PEP_SMART_1905_7 9 20
Date: mar 11/09/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	▬ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	

Id	% Fuen fid co	den emp	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasad	Actividad Próxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo	Año			
																				2006	2007	2008	
1352	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	0	0 28 días		jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18				\$546 Fin	\$546	\$0			
1357	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría Ejecutiva de la	0	0 29 días	mié	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18				\$1,337 Fin	\$1,337	\$0			
1364	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0 58 días		lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17				\$3,845 Fin	\$3,845	\$0			
1370	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017	0	0 38 días		lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17				\$1,968 Fin	\$1,968	\$0			
1375	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	0	0 41 días		lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15				\$13,734 Fin	\$13,734	\$0			
1383	...	BID	No 4.1.12:	0%	No		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de Oficinas para la Coordinación de la UE-2017	0	0 25 días		vie 06/02/17	vie 10/02/17	NOD	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0			
1390	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0 305 días	mié	10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/...	vie 26/02/16				\$32,055 Fin	\$32,055	\$0			
1399	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0 25 días		lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15				\$5,262 Fin	\$5,262	\$0			
1406	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0 101 días		lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17				\$11,052 Fin	\$11,052	\$0			
1414	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	0	0 1 día		vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16				\$2,480 Fin	\$2,480	\$0			
1415	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0 260 días		vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16				\$1,704 Fin	\$1,704	\$0			
1416	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0 246 días		vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15				\$10 Fin	\$10	\$0			
1417	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0 253 días		lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16				\$70 Fin	\$70	\$0			
1418	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0 201 días		vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17				\$80 Fin	\$80	\$0			
1419	...	BID	No 4.1.12:	0%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	0	1 127 días		lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	NOD				\$20 Fin	\$20	\$0			
1420	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0 5 días		lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15				\$336 Fin	\$336	\$0			
1421	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0 180 días		vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16				\$858 Fin	\$858	\$0			
1422	...	BID	No 4.1.13:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0 232 días		jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17				\$825 Fin	\$825	\$0			
1423	...	BID	No 4.1.13:	0%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2018	0	1 106 días		mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/...	NOD				\$547 Fin	\$547	\$0			
1424	...		No 5	67%	No		Clausulas	0	0 2848 días	mié	24/10/07	mar 30/10/18	mié 24/10/...	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0			
1438	...		No 6	10%	No		Plan de Preparación de Cierre	8	0 210 días	mié	22/11/17	vie 14/09/18	mié 22/11/...	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0			
1470	...		No 7	5%	No		Fase de Cierre	2	8 130 días	lun	30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0			
1496	...		No 8	0%	Sí		Fin del Programa	0	1 1 día		dom 30/09/11	dom 30/09/18	NOD	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0			

Project: PEP_SMART_1905_7_9 20
Date: mar 11/09/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬆ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◊ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de agosto / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.

Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 30/9/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Potan



Fecha de actualización

11/9/2018 - 10:33 AM
