



**SECRETARIA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA**

Guatemala, 14 de diciembre de 2018
SEICMSJ-BID-Of. 336-2018 jcl

Ingeniera

Astrid Celeste Cabrera Aldana

Coordinadora de Fortalecimiento Institucional y de Programas

Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Ciudad

Estimada Ingeniera Cabrera:

De manera atenta en referencia a su oficio No. Of. SEICMSJ-FOINP-046/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018 y en referencia al contrato Administrativo para la Prestación de Servicios Personales identificado con el número SEICMSJ/022/005/2018, mediante el cual se establece que prestare los servicios personales como Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa "Apoyo al Sector Justicia Penal", préstamo BID 1905/OC-GU, siendo el plazo del contrato hasta el 14 de diciembre de 2018, traslado a su Coordinación el Informe Plan de Ejecución correspondiente a la fecha del **14 de diciembre de 2018** del Programa BID 1905/OC-GU "Apoyo al Sector Justicia Penal", de acuerdo a la Resolución DCP-001/2017 de fecha 10 de enero de 2017 del Ministerio de Finanzas Publicas, debe publicarse en la página de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora

C.c. Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga, Director General de la SEICMSJ
Licda. Alejandra Isabel Enriquez Orellana, Auditora Interna de la SEICMSJ
Archivo

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARIA EJECUTIVA

14 DIC 2018

Hoy a las
Por:

Mes reportado


14 de Diciembre / 2018

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	14/12/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	406,188.37
			12.58%

Gráfica de Ejecución

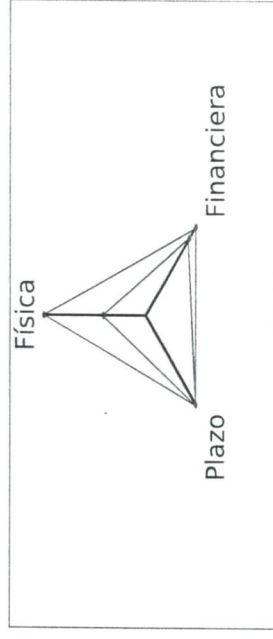

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,862,771.58	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	117.90% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	90.20%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	21	0	4	42	52

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de Contratación Directa	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Termino y PCR del Programa	Selección sobre la base la comparación de	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

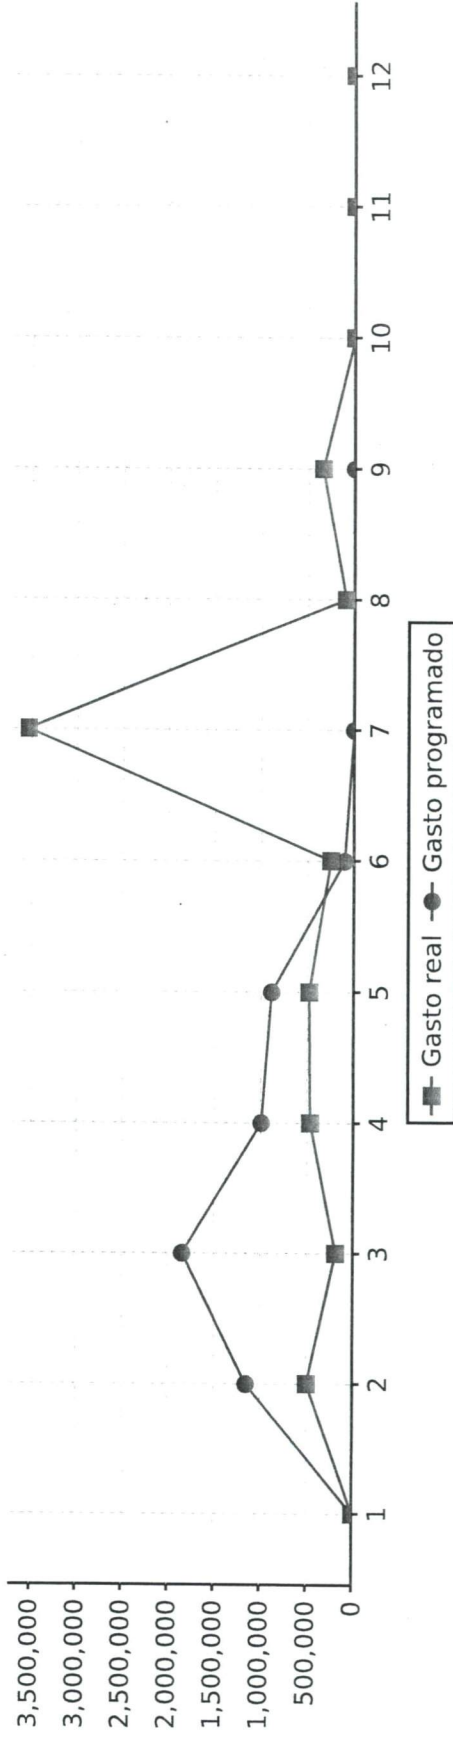

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	92,500.00	343,988.11	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	5,862,771.58											
Total Gasto programado	4,972,618.28											

Id	Identif. emp/	Avanc	Hit	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento Acumulado	Costo real	Año	
													2006	2007
0	No 0	99%	No	PEP SMART_1905_28 9 2018	3840 días	mié 24/07/18	mié 31/07/18	mié 24/07/18	NOD		\$24,426,798 Fin	\$24,379,885	2006	2007
1	No 1	99%	No	Componente 1: Acceso a la Justicia	1471 días	mié 02/01/18	mié 28/09/18	mié 02/01/18	NOD		\$8,608,558 Fin	\$8,605,143	2006	2007
2	No 1.1	100%	No	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	1387 días	mié 02/01/18	mié 31/05/18	mié 02/01/18	NOD		\$50,676 Fin	\$50,676	2006	2007
7	No 1.2	100%	No	P2. Sedes Regionales de Defensa Penal (IDPP)	1205 días	mié 01/01/18	mié 20/09/18	mié 01/01/18	mié 20/09/18		\$1,671,752 Fin	\$1,671,752	2006	2007
363	No 1.3	100%	No	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	720 días	mar 03/11/18	mié 31/08/18	mar 03/11/18	mié 31/08/18		\$504,511 Fin	\$504,511	2006	2007
490	No 1.4	99%	No	P4. Comisarías de Policía TIPO construidas (MG)	1013 días	lun 06/10/14	lun 28/09/18	lun 06/10/14	NOD		\$5,309,742 Fin	\$5,309,742	2006	2007
1612	No 1.5	100%	No	P5. Estudio de Victimización CF (MG)	614 días	lun 02/05/16	mié 28/09/18	lun 02/05/16	mié 28/09/18		\$800,217 Fin	\$800,217	2006	2007
1655	No 1.6	100%	No	P6. Fiscales (MP)	627 días	mié 07/10/15	lun 26/03/18	mié 07/10/15	lun 26/03/18		\$268,245 Fin	\$268,245	2006	2007
1952	No 2	100%	No	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	1114 días	mar 04/02/14	mié 15/06/18	mar 04/02/14	mié 15/06/18		\$14,211,078 Fin	\$14,211,078	2006	2007
1953	No 2.1	100%	No	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	1114 días	mar 04/02/14	mié 15/06/18	mar 04/02/14	mié 15/06/18		\$14,211,078 Fin	\$14,211,078	2006	2007
1954	No 2.1.1	100%	No	Interconexión en OJ	1039 días	mar 20/05/14	mié 15/06/18	mar 20/05/14	mié 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	2006	2007
2193	No 2.1.2	100%	No	Interconexión en IDPP	734 días	mar 04/02/14	mié 16/12/16	mar 04/02/14	mié 16/12/16		\$807,267 Fin	\$807,267	2006	2007
2346	No 2.1.3	100%	No	Interconexión en MINGOB	620 días	lun 25/05/15	mié 08/11/17	lun 25/05/15	mié 08/11/17		\$1,955,192 Fin	\$1,955,192	2006	2007
2550	No 2.1.4	100%	No	Interconexión en MP	973 días	lun 04/08/14	mié 30/05/18	lun 04/08/14	mié 30/05/18		\$9,566,872 Fin	\$9,566,872	2006	2007
3850	No 2.1.5	100%	No	Interconexión en SE	903 días	mié 24/09/14	mié 12/04/18	mié 24/09/14	mié 12/04/18		\$634,548 Fin	\$634,548	2006	2007
3970	No 3	100%	No	Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	863 días	mar 05/05/15	mié 28/09/18	mar 05/05/15	mié 28/09/18		\$2,354,909 Fin	\$2,354,909	2006	2007
3971	No 3.1	100%	No	P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	774 días	mar 05/05/15	mié 24/05/18	mar 05/05/15	mié 24/05/18		\$1,707,905 Fin	\$1,707,905	2006	2007
3972	No 3.1.1	100%	No	Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación en I 329 días	1132 días	vie 15/01/16	mié 28/04/17	vie 15/01/16	mié 28/04/17		\$73,453 Fin	\$73,453	2006	2007
4005	No 3.1.2	100%	No	Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación en I 478 días	1078 días	lun 20/06/16	mar 08/05/18	lun 20/06/16	mar 08/05/18		\$40,191 Fin	\$40,191	2006	2007
4034	No 3.1.3	100%	No	Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación Criminal MP	774 días	mar 05/05/15	mié 24/05/18	mar 05/05/15	mié 24/05/18		\$1,161,086 Fin	\$1,161,086	2006	2007
4683	No 3.1.4	100%	No	Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	642 días	lun 05/10/15	mié 12/04/18	lun 05/10/15	mié 12/04/18		\$433,175 Fin	\$433,175	2006	2007
4748	No 3.2	100%	No	P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas	849 días	lun 25/05/15	mié 28/09/18	lun 25/05/15	mié 28/09/18		\$438,027 Fin	\$438,027	2006	2007
4749	No 3.2.1	100%	No	Capacitación de los funcionarios en IDPP	472 días	lun 22/02/16	mié 28/12/17	lun 22/02/16	mié 28/12/17		\$43,642 Fin	\$43,642	2006	2007
4856	No 3.2.2	100%	No	Capacitación de los funcionarios en MG	297 días	mié 08/06/16	mié 11/08/17	mié 08/06/16	mié 11/08/17		\$28,121 Fin	\$28,121	2006	2007
4891	No 3.2.3	100%	No	Capacitación de los funcionarios en MP	574 días	lun 25/01/16	mié 20/04/18	lun 25/01/16	mié 20/04/18		\$64,922 Fin	\$64,922	2006	2007
4977	No 3.2.4	100%	No	Capacitación de los funcionarios en SE	849 días	lun 25/05/15	mié 28/09/18	lun 25/05/15	mié 28/09/18		\$301,341 Fin	\$301,341	2006	2007
4997	No 3.3	100%	No	P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba	588 días	lun 06/06/16	mié 27/09/18	lun 06/06/16	mié 27/09/18		\$208,978 Fin	\$208,978	2006	2007
4998	No 3.3.1	100%	No	Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala	371 días	lun 06/06/16	mié 23/11/17	lun 06/06/16	mié 23/11/17		\$0 Fin	\$0	2006	2007
5019	No 3.3.2	100%	No	Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de (Combustible y Gastos de Viajeros) 2018	184 días	lun 13/11/17	lun 30/07/18	lun 13/11/17	lun 30/07/18		\$203,200 Fin	\$203,200	2006	2007
5036	No 3.3.3	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viajeros) 2018	4 días	lun 24/09/18	mié 27/09/18	lun 24/09/18	mié 27/09/18		\$3,779 Fin	\$3,779	2006	2007
5041	No 3.3.4	100%	No	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para el Programa Apoyo al Sector Justicia	6 días	mié 20/09/18	mié 27/09/18	mié 20/09/18	mié 27/09/18		\$1,998 Fin	\$1,998	2006	2007
5046	No 4	99%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (OJ)	1374 días	lun 10/06/13	lun 22/10/18	lun 10/06/13	NOD		\$3,208,756 Fin	\$3,208,756	2006	2007
5047	No 4.1	100%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (IDPP)	1248 días	mar 16/07/15	mié 31/05/18	mar 16/07/15	mié 31/05/18		\$262,475 Fin	\$262,475	2006	2007
5517	No 4.2	100%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (MINGOB)	1294 días	lun 10/06/13	mié 28/06/18	lun 10/06/13	mié 28/06/18		\$330,037 Fin	\$330,037	2006	2007
5844	No 4.3	100%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (MINGOB)	922 días	mar 16/09/14	mié 02/05/18	mar 16/09/14	mié 02/05/18		\$532,256 Fin	\$532,256	2006	2007
6216	No 4.4	100%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (MP)	1169 días	mar 03/12/11	mié 29/06/18	mar 03/12/11	mié 29/06/18		\$497,841 Fin	\$497,841	2006	2007
6502	No 4.5	99%	No	Gastos indirectos e imprevisibles (SE)	1292 días	mié 02/10/13	mié 02/10/18	mié 02/10/13	NOD		\$1,632,626 Fin	\$1,632,626	2006	2007
6503	No 4.5.1	100%	No	Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB 2014	15 días	mié 11/12/14	mié 31/12/14	mié 11/12/14	mié 31/12/14		\$1,974 Fin	\$1,974	2006	2007
6504	No 4.5.2	100%	No	Pagos Administrativos 2013	65 días	mié 02/10/13	mié 31/12/13	mié 02/10/13	mié 31/12/13		\$20,995 Fin	\$20,995	2006	2007
6505	No 4.5.3	100%	No	Proceso de Adquisiciones: Vehículos (Cambionetas) 2015	75 días	mié 16/04/15	mié 30/07/15	mié 16/04/15	mié 30/07/15		\$66,393 Fin	\$66,393	2006	2007
6512	No 4.5.4	100%	No	Proceso de Adquisiciones: Vehículos (5 Pick Up) 2016	141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17	lun 29/08/16	mié 22/03/17		\$147,041 Fin	\$147,041	2006	2007
6522	No 4.5.5	100%	No	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	160 días	mié 02/01/14	mié 13/08/14	mié 02/01/14	mié 13/08/14		\$1,804 Fin	\$1,804	2006	2007
6527	No 4.5.6	100%	No	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	161 días	mié 02/01/15	mié 24/08/15	mié 02/01/15	mié 24/08/15		\$1,935 Fin	\$1,935	2006	2007
6532	No 4.5.7	100%	No	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	220 días	mié 17/02/16	mié 17/02/16	mié 17/02/16	mié 17/02/16		\$9,290 Fin	\$9,290	2006	2007
6543	No 4.5.8	100%	No	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	84 días	mié 02/02/17	mié 31/05/17	mié 02/02/17	mié 31/05/17		\$3,758 Fin	\$3,758	2006	2007
6550	No 4.5.9	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Atrendamiento) 2014	260 días	mié 02/01/14	mié 31/12/14	mié 02/01/14	mié 31/12/14		\$8,941 Fin	\$8,941	2006	2007

División crítica: Summary
 Task: Project Summary
 Split: External Tasks
 Milestone: External Milestone

Inactive Task:
 Inactive Milestone:
 Manual Task:

Duration-only:
 Manual Summary Rollup:
 Manual Summary:
 Start-only:

Finish-only:
 Deadline:
 Progress:
 Progreso manual:

Margen de demora:
 Retrasada:
 Tareas críticas:

Project: PEP SMART_1905_28 9 2018
 Date: mar 06/11/18

Page 1

Id	Identif. emp.	% Avanc	Hitos PMR/P/Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Año		
												2006	2007	2008
6555	No 4.5.10	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16		\$8,393 Fin	\$8,393		
6560	No 4.5.11	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16		\$7,756 Fin	\$7,756		
6572	No 4.5.12	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17		\$8,415 Fin	\$8,415		
6586	No 4.5.13	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	167 días	mié 31/01/18	lun 24/09/18	mié 31/01/18	lun 24/09/18		\$7,405 Fin	\$7,405		
6598	No 4.5.14	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viajeros) 2014	239 días	mar 02/01/14	mar 02/12/14	mar 02/01/14	mar 02/12/14		\$12,347 Fin	\$12,347		
6603	No 4.5.15	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viajeros) 2015	20 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15		\$6,244 Fin	\$6,244		
6608	No 4.5.16	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viajeros) 2016	213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16		\$33,135 Fin	\$33,135		
6619	No 4.5.17	100%	No	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viajeros) 2017	221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17		\$38,194 Fin	\$38,194		
6633	No 4.5.18	100%	No	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	220 días	lun 02/01/14	mié 05/11/14	lun 02/01/14	mié 05/11/14		\$4,241 Fin	\$4,241		
6638	No 4.5.19	100%	No	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15		\$2,021 Fin	\$2,021		
6643	No 4.5.20	100%	No	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	226 días	mar 02/02/16	lun 15/12/16	mar 02/02/16	lun 15/12/16		\$19,651 Fin	\$19,651		
6656	No 4.5.21	100%	No	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	201 días	lun 13/03/17	lun 22/12/17	lun 13/03/17	lun 22/12/17		\$16,591 Fin	\$16,591		
6667	No 4.5.22	100%	No	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al periodo 2014	111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15		\$13,703 Fin	\$13,703		
6679	No 4.5.23	100%	No	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al periodo 2015	164 días	lun 30/06/16	lun 27/02/17	lun 30/06/16	lun 27/02/17		\$24,325 Fin	\$24,325		
6692	No 4.5.24	100%	No	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al periodo 2016	177 días	lun 14/11/16	lun 27/07/17	lun 14/11/16	lun 27/07/17		\$51,789 Fin	\$51,789		
6700	No 4.5.25	61%	No	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al periodo 2017	296 días	lun 28/08/17	lun 22/10/18	lun 28/08/17	NOD		\$69,920 Fin	\$23,441		
6701	No 4.5.25	100%	No	Etapas de Adquisición:	63 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17		\$0 Fin	\$0		
6708	No 4.5.25	15%	No	Segundo Producto 20% del valor del contrato	2 días	vie 23/03/18	lun 22/10/18	vie 23/03/18	NOD		\$69,920 Fin	\$23,441		
6709	No 4.5.25	100%	No	Tercer Producto 20% del valor del contrato	4 días	lun 27/05/18	mar 22/05/18	lun 27/05/18	mar 22/05/18	6709FC	\$11,760 Fin	\$11,760		
6711	No 4.5.25	0%	No	Cuarto Producto 40% del valor del contrato	10 días	lun 01/10/18	lun 15/10/18	NOD	NOD		\$11,681 Fin	\$11,681		
6712	No 4.5.25	0%	No	Ampliación de Tiempo e Incremento al contrato	15 días	lun 01/10/18	lun 22/10/18	NOD	NOD		\$0	\$0		
6713	No 4.5.25	0%	No	Programa	148 días	lun 30/11/17	mar 26/06/18	lun 30/11/17	mar 26/06/18		\$25,328 Fin	\$25,328		
6714	No 4.5.26	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	531 días	lun 02/12/13	mié 23/12/15	lun 02/12/13	mié 23/12/15		\$6,977 Fin	\$6,977		
6723	No 4.5.27	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	264 días	mié 10/12/13	mié 10/12/15	mié 10/12/13	mié 10/12/15		\$2,362 Fin	\$2,362		
6730	No 4.5.28	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14		\$10,220 Fin	\$10,220		
6737	No 4.5.29	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15		\$13,846 Fin	\$13,846		
6744	No 4.5.30	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	259 días	lun 10/12/15	vie 16/12/16	lun 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin	\$17,634		
6751	No 4.5.31	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin	\$17,996		
6769	No 4.5.32	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	130 días	lun 14/12/17	lun 14/06/18	lun 14/12/17	lun 14/06/18		\$10,524 Fin	\$10,524		
6787	No 4.5.33	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018 (2)	53 días	vie 15/06/18	lun 30/08/18	vie 15/06/18	lun 30/08/18		\$3,460 Fin	\$3,460		
6799	No 4.5.34	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	220 días	lun 09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15		\$12,957 Fin	\$12,957		
6808	No 4.5.35	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	259 días	lun 10/12/15	vie 16/12/16	lun 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin	\$17,634		
6816	No 4.5.36	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,997 Fin	\$17,997		
6834	No 4.5.37	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	130 días	lun 14/12/17	lun 14/06/18	lun 14/12/17	lun 14/06/18		\$10,524 Fin	\$10,524		
6852	No 4.5.38	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018 (2)	73 días	vie 15/06/18	lun 27/09/18	vie 15/06/18	lun 27/09/18		\$5,148 Fin	\$5,148		
6864	No 4.5.39	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	214 días	mar 17/02/15	mié 23/12/15	mar 17/02/15	mié 23/12/15		\$10,769 Fin	\$10,769		
6870	No 4.5.40	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	259 días	lun 10/12/15	vie 16/12/16	lun 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin	\$17,634		
6883	No 4.5.41	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin	\$17,996		
6898	No 4.5.42	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	130 días	lun 14/12/17	lun 14/06/18	lun 14/12/17	lun 14/06/18		\$10,524 Fin	\$10,524		
6916	No 4.5.43	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018 (2)	43 días	vie 15/06/18	lun 16/08/18	vie 15/06/18	lun 16/08/18		\$2,607 Fin	\$2,607		
6928	No 4.5.44	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$21,539 Fin	\$21,539		
6937	No 4.5.45	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	259 días	lun 10/12/15	vie 16/12/16	lun 10/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin	\$28,127		
6944	No 4.5.46	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin	\$29,448		
6952	No 4.5.47	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin	\$29,448		

Id	Identif. emp	Hito PWR/P/Nombre de la Tarea	% Avance	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real / Fin real	Pred	2005		2006		2007		2008		2009		
									Financiamien	Acumulad	Costo Real	Financiamien	Acumulad	Costo Real	Financiamien	Acumulad	Costo Real	Financiamien	Acumulad
6980	No 4.5.48	100%	No	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17			\$16,190	\$16,190								
6992	No 4.5.49	100%	No	73 días	15/06/18	27/09/18	15/06/18			\$7,920	\$7,920								
7001	No 4.5.50	100%	No	80 días	02/09/15	23/12/15	02/09/15			\$6,924	\$6,924								
7008	No 4.5.51	100%	No	262 días	07/12/15	16/12/16	07/12/15			\$28,127	\$28,127								
7026	No 4.5.52	100%	No	232 días	14/12/17	15/12/17	14/12/17			\$29,448	\$29,448								
7044	No 4.5.53	100%	No	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17			\$16,190	\$16,190								
7056	No 4.5.54	100%	No	283 días	02/12/13	31/12/14	02/12/13			\$2,587	\$2,587								
7065	No 4.5.55	100%	No	225 días	02/02/15	23/12/15	02/02/15			\$20,915	\$20,915								
7072	No 4.5.56	100%	No	226 días	08/12/11	28/10/16	08/12/11			\$23,328	\$23,328								
7079	No 4.5.57	100%	No	232 días	17/10/16	16/12/16	17/10/16			\$3,598	\$3,598								
7095	No 4.5.58	100%	No	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17			\$27,913	\$27,913								
7103	No 4.5.59	100%	No	53 días	13/10/15	13/10/15	13/10/15			\$4,724	\$4,724								
7120	No 4.5.60	100%	No	64 días	19/09/16	16/12/16	19/09/16			\$5,992	\$5,992								
7128	No 4.5.61	100%	No	53 días	13/10/15	13/10/15	13/10/15			\$3,542	\$3,542								
7137	No 4.5.62	100%	No	262 días	07/12/15	16/12/16	07/12/15			\$28,127	\$28,127								
7145	No 4.5.63	100%	No	112 días	20/01/17	27/06/17	20/01/17			\$14,687	\$14,687								
7163	No 4.5.64	100%	No	78 días	29/08/16	16/12/16	29/08/16			\$8,306	\$8,306								
7175	No 4.5.65	100%	No	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17			\$29,448	\$29,448								
7185	No 4.5.66	100%	No	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17			\$16,190	\$16,190								
7203	No 4.5.67	100%	No	53 días	15/06/18	30/08/18	15/06/18			\$5,323	\$5,323								
7215	No 4.5.68	100%	No	5 días	28/08/17	01/09/17	28/08/17			\$0	\$0								
7224	No 4.5.69	100%	No	117 días	13/06/17	27/11/17	13/06/17			\$7,653	\$7,653								
7234	No 4.5.70	100%	No	20 días	20/11/17	15/12/17	20/11/17			\$954	\$954								
7244	No 4.5.71	100%	No	197 días	11/08/14	13/05/15	11/08/14			\$31,281	\$31,281								
7251	No 4.5.72	100%	No	58 días	05/10/15	23/12/15	05/10/15			\$1,311	\$1,311								
7259	No 4.5.73	100%	No	41 días	10/02/16	10/02/16	10/02/16			\$5,195	\$5,195								
7266	No 4.5.74	100%	No	126 días	02/05/16	28/10/16	02/05/16			\$28,536	\$28,536								
7273	No 4.5.75	100%	No	169 días	01/12/15	29/07/16	01/12/15			\$5,930	\$5,930								
7283	No 4.5.76	100%	No	63 días	02/05/16	28/07/16	02/05/16			\$7,930	\$7,930								
7294	No 4.5.77	100%	No	45 días	17/10/16	16/12/16	17/10/16			\$8,011	\$8,011								
7304	No 4.5.78	100%	No	83 días	22/08/16	16/12/16	22/08/16			\$24,832	\$24,832								
7313	No 4.5.79	100%	No	139 días	01/06/16	16/12/16	01/06/16			\$25,385	\$25,385								
7323	No 4.5.80	100%	No	199 días	14/11/16	28/08/17	14/11/16			\$20,930	\$20,930								
7333	No 4.5.81	100%	No																

Project: PEP SMART_1905_289
Date: mar 06/11/18

Division critica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

Margin de demora

Retrasada

Tareas criticas

Id	Identif. emp	Hit % Avanc	PMR/Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento/Acumulado/Costo Real	
										2006	2007
7342	No 4.5.82	100%	No	201 días	16/03/17	16/03/17	16/03/17	16/03/17			\$41,594 Fin
7351	No 4.5.83	100%	No	120 días	30/10/17	13/04/18	30/10/17	13/04/18			\$25,410 Fin
7360	No 4.5.84	100%	No	132 días	22/05/17	24/11/17	22/05/17	24/11/17			\$28,541 Fin
7368	No 4.5.85	100%	No	89 días	12/01/15	15/05/15	12/01/15	15/05/15			\$15,666 Fin
7376	No 4.5.86	100%	No	80 días	04/05/15	28/08/15	04/05/15	28/08/15			\$1,130 Fin
7381	No 4.5.87	100%	No	230 días	02/02/16	21/12/16	02/02/16	21/12/16			\$1,501 Fin
7387	No 4.5.88	100%	No	128 días	13/03/17	08/09/17	13/03/17	08/09/17			\$1,460 Fin
7393	No 4.5.89	100%	No	29 días	22/09/14	30/10/14	22/09/14	30/10/14			\$1,800 Fin
7398	No 4.5.90	100%	No	173 días	23/03/15	30/11/15	23/03/15	30/11/15			\$8,543 Fin
7403	No 4.5.91	100%	No	157 días	04/07/16	20/02/17	04/07/16	20/02/17			\$13,742 Fin
7412	No 4.5.92	100%	No	34 días	08/08/17	25/09/17	08/08/17	25/09/17			\$1,147 Fin
7421	No 4.5.93	100%	No	53 días	14/02/18	04/04/18	14/02/18	04/04/18			\$266 Fin
7430	No 4.5.94	100%	No	28 días	12/04/18	22/05/18	12/04/18	22/05/18			\$803 Fin
7439	No 4.5.95	100%	No	34 días	29/01/18	14/03/18	29/01/18	14/03/18			\$453 Fin
7446	No 4.5.96	100%	No	8 días	04/09/18	13/09/18	04/09/18	13/09/18			\$549 Fin
7453	No 4.5.97	100%	No	123 días	02/03/15	28/08/15	02/03/15	28/08/15			\$2,306 Fin
7458	No 4.5.98	100%	No	7 días	22/08/16	30/08/16	22/08/16	30/08/16			\$1,961 Fin
7463	No 4.5.99	100%	No	10 días	04/04/17	17/04/17	04/04/17	17/04/17			\$4,975 Fin
7468	No 4.5.100	100%	No	42 días	17/07/17	13/09/17	17/07/17	13/09/17			\$1,808 Fin
7473	No 4.5.101	100%	No	16 días	08/06/15	29/06/15	08/06/15	29/06/15			\$681 Fin
7478	No 4.5.102	100%	No	174 días	01/04/16	06/12/16	01/04/16	06/12/16			\$1,236 Fin
7485	No 4.5.103	100%	No	193 días	08/03/17	07/12/17	08/03/17	07/12/17			\$1,084 Fin
7493	No 4.5.104	100%	No	19 días	05/02/18	28/02/18	05/02/18	28/02/18			\$593 Fin
7499	No 4.5.105	100%	No	19 días	04/05/15	28/05/15	04/05/15	28/05/15			\$3,731 Fin
7504	No 4.5.106	100%	No	24 días	29/08/16	30/09/16	29/08/16	30/09/16			\$305 Fin
7509	No 4.5.107	100%	No	21 días	06/02/17	06/03/17	06/02/17	06/03/17			\$1,777 Fin
7514	No 4.5.108	100%	No	273 días	16/12/13	31/12/14	16/12/13	31/12/14			\$4,121 Fin
7519	No 4.5.109	100%	No	261 días	15/12/14	23/12/15	15/12/14	23/12/15			\$5,084 Fin
7524	No 4.5.110	100%	No	190 días	06/03/17	30/11/17	06/03/17	30/11/17			\$3,914 Fin
7533	No 4.5.111	100%	No	26 días	20/04/18	28/05/18	20/04/18	28/05/18			\$2,018 Fin
7538	No 4.5.112	100%	No	29 días	20/04/18	31/05/18	20/04/18	31/05/18			\$4,841 Fin
7543	No 4.5.113	100%	No	28 días	19/04/18	29/05/18	19/04/18	29/05/18			\$546 Fin
7548	No 4.5.114	100%	No	29 días	mié 18/04/18	29/05/18	mié 18/04/18	29/05/18			\$1,337 Fin
7555	No 4.5.115	100%	No	58 días	03/04/17	22/06/17	03/04/17	22/06/17			\$3,845 Fin
7561	No 4.5.116	100%	No	38 días	03/04/17	25/05/17	03/04/17	25/05/17			\$1,968 Fin
7566	No 4.5.117	100%	No	41 días	04/05/15	29/06/15	04/05/15	29/06/15			\$13,734 Fin

División crítica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Milestone

External Milestone

Margin de demora

Retrasada

Tareas críticas

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

Duration-only

Manual Summary

Manual Summary

Manual Summary

Manual Task

Manual Task

Manual Task

Manual Task

Manual Task

Page 4

Id	Identif. emp	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamen	Acumul	Costo Real	Año				
														2006	2007	2008	2009	
7574																		
7581		No 4.5.11:100%	No	Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16		\$32,055 Fin		\$32,055					
7590		No 4.5.12:100%	No	Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin		\$5,262					
7597		No 4.5.12:100%	No	Términos de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar 101 días	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17		\$11,052 Fin		\$11,052					
7605		No 4.5.12:100%	No	Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$2,480 Fin		\$2,480					
7606		No 4.5.12:100%	No	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16		\$1,704 Fin		\$1,704					
7607		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15		\$10 Fin		\$10					
7608		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$70 Fin		\$70					
7609		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17		\$80 Fin		\$80					
7610		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	vie 28/09/18		\$20 Fin		\$20					
7611		No 4.5.12:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2015	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15		\$336 Fin		\$336					
7612		No 4.5.12:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$858 Fin		\$858					
7613		No 4.5.13:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2017	232 días	jue 02/02/17	jue 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17		\$825 Fin		\$825					
7614		No 4.5.13:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2018	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/18	vie 28/09/18		\$547 Fin		\$547					
7615		No 5	67%	Plan de Preparación de Cierre	2848 días	mié 24/10/07	mié 30/10/18	mié 24/10/07	NOD		\$0 Fin		\$0					
7616		No 6	100%	Fase de Cierre	130 días	lun 30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18	NOD		\$0 Fin		\$0					
7617		No 7	97%	Fin del Programa	1 día	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18		\$0 Fin		\$0					
7618		No 8	100%															

Id	Identif. emp	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamen	Acumul	Costo Real	Año			
														2006	2007	2008	2009
7574																	
7581		No 4.5.11:100%	No	Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16		\$32,055 Fin		\$32,055				
7590		No 4.5.12:100%	No	Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin		\$5,262				
7597		No 4.5.12:100%	No	Términos de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar 101 días	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17		\$11,052 Fin		\$11,052				
7605		No 4.5.12:100%	No	Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$2,480 Fin		\$2,480				
7606		No 4.5.12:100%	No	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16		\$1,704 Fin		\$1,704				
7607		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15		\$10 Fin		\$10				
7608		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$70 Fin		\$70				
7609		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17		\$80 Fin		\$80				
7610		No 4.5.12:100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	vie 28/09/18		\$20 Fin		\$20				
7611		No 4.5.12:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2015	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15		\$336 Fin		\$336				
7612		No 4.5.12:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$858 Fin		\$858				
7613		No 4.5.13:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2017	232 días	jue 02/02/17	jue 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17		\$825 Fin		\$825				
7614		No 4.5.13:100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2018	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/18	vie 28/09/18		\$547 Fin		\$547				
7615		No 5	67%	Plan de Preparación de Cierre	2848 días	mié 24/10/07	mié 30/10/18	mié 24/10/07	NOD		\$0 Fin		\$0				
7616		No 6	100%	Fase de Cierre	130 días	lun 30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18	NOD		\$0 Fin		\$0				
7617		No 7	97%	Fin del Programa	1 día	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/18		\$0 Fin		\$0				
7618		No 8	100%														

Project: PEP SMART_1905_28 g 2
Date: mar 06/11/18

Division critica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progress manual

Margen de demora



Retrasada


Tareas criticas

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de octubre / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.
- En Gastos y Desembolsos, no aparecen reflejados los montos desembolsados para la Unidad Ejecutora del Programa en el periodo 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma)  Juan Carlos Linares


Aprobado por: (nombre y firma)  Lic. Héctor Aníbal De León Polanco

Fecha de actualización

14/12/2018 - 10:09 AM
