

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Febrero / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	07/03/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,718,546.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,718,546.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	20,062,869.48	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	103.87%	Monto por desembolsar USD\$ -105,336.23 -3.87%

Gráfica de Ejecución

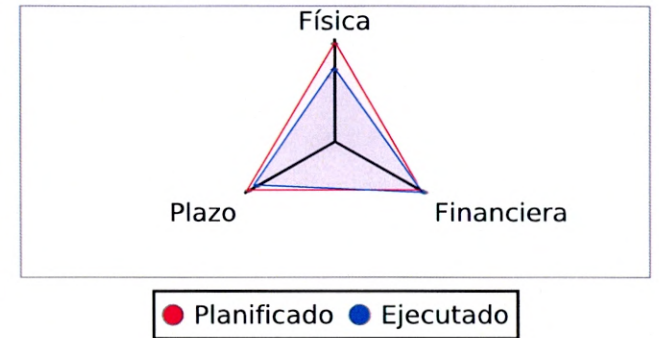

Tipo de cambio: 7.38 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Febrero		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	11,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	498,730.31	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	23.15% / 23.15%		
Porcentaje de Ejecución	4.34%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	104.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0		0		2	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2		0		2	
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	12	12		0		42	12

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017		12/01/2018	
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018		16/02/2018	
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Termino y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

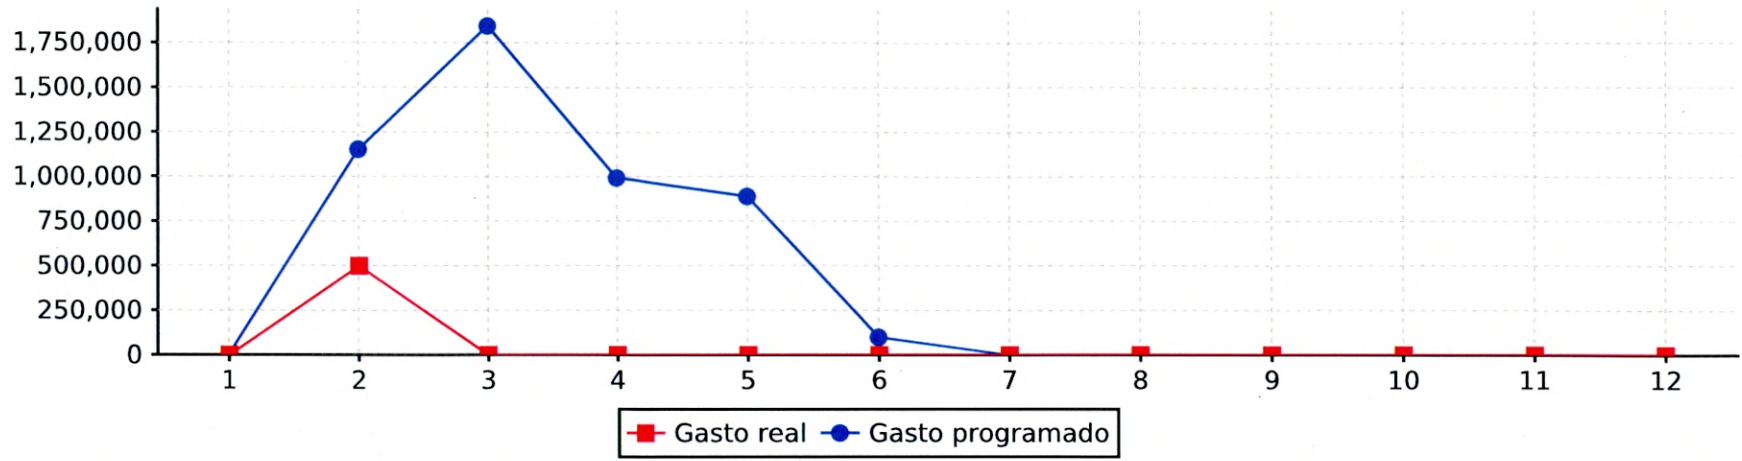

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												498,730.31
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
0	0	80%	PEP_SMART_1905,0		30	25	mié 24/10/07 2751 días	mié 24/10/07	jue 14/06/18	mié 24/10/07	NOD		\$3,188,280 Fin		\$2,471,439	3er trim
1	1	70%	Componente 1: Acceso a la Justicia		1	1	mié 24/10/... 885 días	lun 06/10/14	jue 29/03/18	lun 06/10/14	NOD		\$26,309 Fin		\$1,309	
2	1.1	26%	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"		1	1	lun 05/06/17 69 días	mar 26/12/17	jue 29/03/18	mar 26/12/17	NOD		\$25,000 Fin		\$0	
3	1.1.1	100%	Etapas de Adquisición:		0	0	lun 05/06/17 10 días	mar 26/12/17	lun 08/01/18	mar 26/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0	
4	1.1.1.1	100%	Elaboración de Términos de Referencia		0	0	lun 05/06/17 8 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	jue 04/01/18		\$0 Fin		\$0	
5	1.1.1.2	100%	No Objeción a Tdr y Contratación Directa		0	0	lun 19/06/17 1 día	jue 04/01/18	vie 05/01/18	jue 04/01/18	vie 05/01/18	4	\$0 Fin		\$0	
6	1.1.1.3	100%	Adjudicación y Contratación		0	0	mié 16/08/... 1 día	lun 08/01/18	lun 08/01/18	lun 08/01/18	lun 08/01/18	5	\$0 Fin		\$0	
7	1.1.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:		1	1	mié 30/08/... 29 días	lun 19/02/18	jue 29/03/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin		\$0	
8	1.1.2.1	0%	Pago Producto #1		1	0	mié 30/08/... 17 días	lun 19/02/18	mar 13/03/18	NOD	NOD 6FC+30		\$5,000 Fin		\$0	
9	1.1.2.2	0%	Pago Producto #2		0	1	mié 30/08/... 12 días	mié 14/03/18	jue 29/03/18	NOD	NOD 8		\$20,000 Fin		\$0	
10	1.2	100%	Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB		0	0	lun 06/10/14 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309	
18	2	98%	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)		0	1	NOD 892 días	mié 24/09/14	mié 28/03/18	mié 24/09/14	NOD		\$634,547 Fin		\$625,320	
19	2.1	98%	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones		0	1	NOD 892 días	mié 24/09/14	mié 28/03/18	mié 24/09/14	NOD		\$634,547 Fin		\$625,320	
20	2.1.1	98%	Interconexión en Secretaría e INACIF		0	1	mié 24/09/... 892 días	mié 24/09/14	mié 28/03/18	mié 24/09/14	NOD		\$634,547 Fin		\$625,320	
21	2.1.1.1	100%	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015		0	0	vie 21/08/15 69 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15		\$142,498 Fin		\$142,498	
32	2.1.1.2	100%	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016		0	0	lun 29/02/16 379 días	jue 01/09/16	mié 28/02/18	jue 01/09/16	mié 28/02/18		\$84,909 Fin		\$84,909	
43	2.1.1.3	100%	Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEICMSJ		0	0	NOD 80 días	lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16		\$1,137 Fin		\$1,137	
53	2.1.1.4	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia		0	0	mié 24/09/... 49 días	mié 24/09/14	mar 02/12/14	mié 24/09/14	mar 02/12/14		\$7,494 Fin		\$7,494	
59	2.1.1.5	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia		0	0	lun 17/11/14 294 días	lun 17/11/14	mié 20/01/16	lun 10/11/14	mié 23/12/15		\$78,164 Fin		\$78,164	
65	2.1.1.6	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia		0	0	lun 18/01/16 238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16		\$114,770 Fin		\$114,770	
81	2.1.1.7	100%	Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF		0	0	lun 23/05/16 146 días	lun 23/05/16	vie 16/12/16	lun 23/05/16	vie 16/12/16		\$104,369 Fin		\$104,369	
91	2.1.1.8	100%	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 201		0	0	lun 24/11/14 27 días	lun 24/11/14	mar 30/12/14	lun 24/11/14	mar 30/12/14		\$2,584 Fin		\$2,584	
97	2.1.1.9	100%	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 201		0	0	lun 08/12/14 200 días	lun 08/12/14	mar 22/09/15	lun 08/12/14	mar 22/09/15		\$21,307 Fin		\$21,307	
103	2.1.1.10	100%	Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de		0	0	lun 14/11/16 232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$32,715 Fin		\$32,715	
121	2.1.1.11	76%	Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ		0	1	lun 14/11/16 156 días	lun 21/08/17	mié 28/03/18	lun 21/08/17	NOD		\$23,092 Fin		\$13,865	
122	2.1.1.11.1	100%	Etapas de Adquisición:		0	0	lun 14/11/16 28 días	lun 21/08/17	jue 28/09/17	lun 21/08/17	jue 28/09/17		\$0 Fin		\$0	
126	2.1.1.11.2	63%	Etapas de Ejecución de pagos:		0	1	vie 03/02/17 103 días	lun 06/11/17	mié 28/03/18	lun 06/11/17	NOD		\$23,092 Fin		\$13,865	
127	2.1.1.11.2.1	0%	Ejecución 23092		0	1	vie 03/02/17 20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD 125FC+		\$9,227 Fin		\$0	
128	2.1.1.11.2.2	100%	Pago Noviembre 2017		0	0	vie 03/02/17 15 días	lun 06/11/17	vie 24/11/17	lun 06/11/17	vie 24/11/17	125FC+	\$4,619 Fin		\$4,619	
129	2.1.1.11.2.3	100%	Pago Diciembre 2017		0	0	vie 03/02/17 19 días	vie 01/12/17	jue 28/12/17	vie 01/12/17	jue 28/12/17	125FC+	\$9,245 Fin		\$9,245	
130	2.1.1.12	100%	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal		0	0	jue 09/02/17 102 días	mar 09/05/17	vie 29/09/17	mar 09/05/17	vie 29/09/17		\$21,479 Fin		\$21,479	
139	2.1.1.13	100%	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos		0	0	NOD 83 días	lun 05/06/17	vie 29/09/17	lun 05/06/17	vie 29/09/17		\$30 Fin		\$30	
140	3	87%	Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica		2	6	lun 25/05/15 773 días	lun 25/05/15	mié 13/06/18	lun 25/05/15	NOD		\$906,678 Fin		\$432,155	
141	3.1	86%	P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba		0	2	lun 05/10/15 632 días	lun 05/10/15	jue 29/03/18	lun 05/10/15	NOD		\$433,185 Fin		\$416,662	
142	3.1.1	86%	Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF		0	2	lun 05/10/15 632 días	lun 05/10/15	jue 29/03/18	lun 05/10/15	NOD		\$433,185 Fin		\$416,662	

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	▬	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◆	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
143	3.1.1.1	100%	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0	0	mar 13/10/15	119 días	mar 13/10/15	mié 30/03/16	mar 13/10/15	mié 30/03/16		\$97,760 Fin		\$97,760	3er trim
151	3.1.1.2	100%	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0	0	lun 28/11/16	211 días	lun 28/11/16	jue 28/09/17	lun 28/11/16	jue 28/09/17		\$9,655 Fin		\$9,655	
161	3.1.1.3	100%	Proceso de Adquisición: Vehículos	0	0	lun 05/10/15	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15		\$50,046 Fin		\$50,046	
170	3.1.1.4	100%	Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector	0	0	mié 10/08/16	350 días	mié 10/08/16	jue 28/12/17	mié 10/08/16	jue 28/12/17		\$192,996 Fin		\$192,996	
188	3.1.1.5	48%	Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento abreviado	0	1	jue 05/01/17	128 días	lun 02/10/17	jue 29/03/18	lun 02/10/17	NOD		\$45,997 Fin		\$33,544	
189	3.1.1.5.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	lun 02/10/17	lun 09/10/17		\$0 Fin		\$0	
193	3.1.1.5.2	43%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	104 días	lun 06/11/17	jue 29/03/18	lun 06/11/17	NOD		\$45,997 Fin		\$33,544	
194	3.1.1.5.2.1	0%	Ejecución del Contrato 45997	0	1	jue 23/02/17	42 días	jue 01/02/18	jue 29/03/18	NOD	NOD 192FC+		\$12,453 Fin		\$0	
195	3.1.1.5.2.2	100%	Pago Noviembre 2017	0	0	jue 23/02/17	15 días	lun 06/11/17	vie 24/11/17	lun 06/11/17	vie 24/11/17	192	\$20,710 Fin		\$20,710	
196	3.1.1.5.2.3	100%	Pago Diciembre 2017	0	0	jue 23/02/17	17 días	lun 04/12/17	mié 27/12/17	lun 04/12/17	mié 27/12/17	192	\$12,834 Fin		\$12,834	
197	3.1.1.6	48%	Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado	0	1	jue 05/01/17	128 días	lun 02/10/17	jue 29/03/18	lun 02/10/17	NOD		\$36,691 Fin		\$32,621	
198	3.1.1.6.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	lun 02/10/17	lun 09/10/17		\$0 Fin		\$0	
202	3.1.1.6.2	43%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	104 días	lun 06/11/17	jue 29/03/18	lun 06/11/17	NOD		\$36,691 Fin		\$32,621	
203	3.1.1.6.2.1	0%	Ejecución del Contrato 36682	0	1	jue 23/02/17	42 días	jue 01/02/18	jue 29/03/18	NOD	NOD 201FC+		\$4,070 Fin		\$0	
204	3.1.1.6.2.2	100%	Pago Noviembre 2017	0	0	jue 23/02/17	15 días	lun 06/11/17	vie 24/11/17	lun 06/11/17	vie 24/11/17	201	\$16,518 Fin		\$16,518	
205	3.1.1.6.2.3	100%	Pago Diciembre 2017	0	0	jue 23/02/17	17 días	lun 04/12/17	mié 27/12/17	lun 04/12/17	mié 27/12/17	201	\$16,103 Fin		\$16,103	
206	3.1.1.7	100%	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0	NOD	84 días	jue 31/08/17	vie 29/12/17	jue 31/08/17	vie 29/12/17		\$40 Fin		\$40	
207	3.2	89%	P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la	1	3	lun 25/05/15	773 días	lun 25/05/15	mié 13/06/18	lun 25/05/15	NOD		\$283,493 Fin		\$15,493	
208	3.2.1	89%	Capacitación de los funcionarios en INACIF (SE)	1	3	lun 25/05/15	773 días	lun 25/05/15	mié 13/06/18	lun 25/05/15	NOD		\$283,493 Fin		\$15,493	
209	3.2.1.1	100%	Proceso de Contratación: Gastos de Viáticos John Jay College	0	0	vie 24/06/16	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16		\$13,582 Fin		\$13,582	
215	3.2.1.2	100%	Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación	0	0	lun 20/06/16	29 días	lun 20/06/16	vie 29/07/16	lun 20/06/16	vie 29/07/16		\$1,667 Fin		\$1,667	
224	3.2.1.3	100%	Análisis de consultora	0	0	lun 25/05/15	17 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15	lun 25/05/15	mar 16/06/15		\$0 Fin		\$0	
225	3.2.1.4	83%	Proceso de Contratación: Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo	1	3	lun 11/01/16	620 días	lun 11/01/16	mié 13/06/18	lun 11/01/16	NOD		\$268,000 Fin		\$0	
226	3.2.1.4.1	96%	Etapas de Adquisición:	1	2	lun 11/01/16	565 días	lun 11/01/16	lun 26/03/18	lun 11/01/16	NOD		\$0 Fin		\$0	
227	3.2.1.4.1.1	100%	Modelo de Gestión	0	0	lun 11/01/16	187 días	lun 11/01/16	mié 28/09/16	lun 11/01/16	mié 28/09/16		\$0 Fin		\$0	
228	3.2.1.4.1.2	100%	Preparación de TDR's	0	0	NOD	10 días	mié 09/11/16	mar 22/11/16	mié 09/11/16	mar 22/11/16		\$0 Fin		\$0	
229	3.2.1.4.1.3	100%	Solicitud de No Objeción	0	0	NOD	5 días	mié 23/11/16	mar 29/11/16	mié 23/11/16	mar 29/11/16	228	\$0 Fin		\$0	
230	3.2.1.4.1.4	100%	No Objeción	0	0	NOD	6 días	mié 30/11/16	mié 07/12/16	mié 30/11/16	mié 07/12/16	229	\$0 Fin		\$0	
231	3.2.1.4.1.5	100%	Publicación Expresión de Interés	0	0	NOD	11 días	mié 18/01/17	mié 01/02/17	mié 18/01/17	mié 01/02/17	230	\$0 Fin		\$0	
232	3.2.1.4.1.6	100%	Evaluación de Expresiones de Interés	0	0	NOD	8 días	lun 13/02/17	mié 22/02/17	lun 13/02/17	mié 22/02/17	231	\$0 Fin		\$0	
233	3.2.1.4.1.7	100%	No Objeción Expresión de Interés	0	0	NOD	40 días	jue 23/02/17	jue 20/04/17	jue 23/02/17	jue 20/04/17	232	\$0 Fin		\$0	
234	3.2.1.4.1.8	100%	Preparación y envío de SP	0	0	NOD	25 días	mar 02/05/17	lun 05/06/17	mar 02/05/17	lun 05/06/17	233	\$0 Fin		\$0	
235	3.2.1.4.1.9	100%	No Objeción a SP	0	0	NOD	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	mié 05/07/17	mar 11/07/17	234	\$0 Fin		\$0	
236	3.2.1.4.1.10	100%	Invitación	0	0	NOD	12 días	mar 11/07/17	vie 04/08/17	mar 11/07/17	vie 04/08/17	235FC+	\$0 Fin		\$0	
237	3.2.1.4.1.11	100%	Evaluación de Propuesta Técnica	0	0	NOD	28 días	lun 07/08/17	mié 13/09/17	lun 07/08/17	mié 13/09/17	236	\$0 Fin		\$0	
238	3.2.1.4.1.12	100%	Objeción Propuesta Técnica	0	0	NOD	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	lun 27/11/17	vie 01/12/17	237	\$0 Fin		\$0	
239	3.2.1.4.1.13	100%	Revisión de observaciones	0	0	NOD	1 día	mar 05/12/17	mar 05/12/17	mar 05/12/17	mar 05/12/17	238	\$0 Fin		\$0	
240	3.2.1.4.1.14	100%	No Objeción a Propuesta Técnica	0	0	NOD	8 días	jue 22/02/18	lun 05/03/18	jue 22/02/18	lun 05/03/18	239	\$0 Fin		\$0	
241	3.2.1.4.1.15	0%	Fase de Negociación	1	0	NOD	5 días	lun 05/03/18	lun 12/03/18	lun 05/03/18	NOD 240		\$0 Fin		\$0	
242	3.2.1.4.1.16	0%	No Objeción Fase de Negociación	0	1	NOD	5 días	mar 13/03/18	lun 19/03/18	NOD	NOD 241		\$0 Fin		\$0	

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividades	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
				Atrasadas	Próximo Mes											
243	3.2.1.4.1.17	0%	Adjudicación y contratación	0	1	NOD 5 días	mar 20/03/18	lun 26/03/18		NOD	NOD 242		\$0 Fin		\$0	
244	3.2.1.4.2	0%	Etapas de Ejecución de Pago:	0	1	lun 20/03/17 55 días	mar 27/03/17	mié 13/06/18		NOD	NOD		\$268,000 Fin		\$0	
250	3.2.1.5	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	vie 01/04/16 180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16		vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$245 Prorate		\$245	
251	3.3	85%	P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba	1	1	lun 06/06/16 498 días	lun 06/06/16	mié 23/05/18		lun 06/06/16	NOD		\$190,000 Fin		\$0	
252	3.3.1	100%	Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del	0	0	lun 06/06/16 371 días	lun 06/06/16	jue 23/11/17		lun 06/06/16	jue 23/11/17		\$0 Fin		\$0	
273	3.3.2	58%	Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	1	1	lun 06/06/16 136 días	lun 13/11/17	mié 23/05/18		lun 13/11/17	NOD		\$190,000 Fin		\$0	
274	3.3.2.1	94%	Etapas de Adquisición:	1	0	lun 06/06/16 86 días	lun 13/11/17	lun 12/03/18		lun 13/11/17	NOD		\$0 Fin		\$0	
275	3.3.2.1.1	100%	Elaboración de TdR's y SP	0	0	NOD 8 días	lun 13/11/17	mié 22/11/17		lun 13/11/17	mié 22/11/17		\$0 Fin		\$0	
276	3.3.2.1.2	100%	No Objeción Tdr's y SP	0	0	NOD 38 días	jue 23/11/17	mar 16/01/18		jue 23/11/17	mar 16/01/18 275		\$0 Fin		\$0	
277	3.3.2.1.3	100%	Invitación a Firma	0	0	NOD 8 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18		mar 16/01/18	vie 26/01/18 276		\$0 Fin		\$0	
278	3.3.2.1.4	100%	Evaluación de Propuesta Técnica y Económica	0	0	NOD 14 días	lun 05/02/18	mié 21/02/18		lun 05/02/18	mié 21/02/18 277		\$0 Fin		\$0	
279	3.3.2.1.5	100%	No Objeción a Propuesta Técnica y Económica	0	0	NOD 8 días	jue 22/02/18	lun 05/03/18		jue 22/02/18	lun 05/03/18 278		\$0 Fin		\$0	
280	3.3.2.1.6	0%	Adjudicación y Contratación	1	0	NOD 5 días	lun 05/03/18	lun 12/03/18		lun 05/03/18	NOD 279		\$0 Fin		\$0	
281	3.3.2.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	vie 27/01/17 50 días	mar 13/03/17	mié 23/05/18		NOD	NOD		\$190,000 Fin		\$0	
285	4	90%	Administración	7	12	lun 10/06/13 1201 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18		mié 02/10/13	NOD		\$1,620,746 Fin		\$1,412,656	
286	4.1	90%	Gastos indirectos e imprevistos (SE)	7	12	mié 02/10/13 1201 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18		mié 02/10/13	NOD		\$1,620,746 Fin		\$1,412,656	
287	4.1.1	100%	Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB	0	0	jue 11/12/14 15 días	jue 11/12/14	mié 31/12/14		jue 11/12/14	mié 31/12/14 15		\$1,974 Fin		\$1,974	
288	4.1.2	100%	Pagos Administrativos 2013	0	0	mié 02/10/13 65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13		mié 02/10/13	mar 31/12/13		\$20,995 Fin		\$20,995	
289	4.1.3	100%	Proceso de Adquisiciones: Vehiculos (Camionetas) 2015	0	0	jue 16/04/15 75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15		jue 16/04/15	jue 30/07/15		\$66,393 Fin		\$66,393	
296	4.1.4	100%	Proceso de Adquisiciones: Vehiculos (5 Pick Up) 2016	0	0	lun 29/08/16 141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17		lun 29/08/16	mié 22/03/17		\$147,041 Fin		\$147,041	
306	4.1.5	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0	jue 02/01/14 160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14		jue 02/01/14	mié 13/08/14		\$1,804 Fin		\$1,804	
311	4.1.6	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0	vie 02/01/15 161 días	vie 02/01/15	lun 24/08/15		vie 02/01/15	lun 24/08/15		\$1,935 Fin		\$1,935	
316	4.1.7	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0	mié 17/02/16 220 días	mié 17/02/16	jue 22/12/16		mié 17/02/16	jue 22/12/16		\$9,290 Fin		\$9,290	
327	4.1.8	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0	lun 02/01/17 84 días	jue 02/02/17	mié 31/05/17		jue 02/02/17	mié 31/05/17		\$3,758 Fin		\$3,758	
334	4.1.9	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0	jue 02/01/14 260 días	jue 02/01/14	mié 31/12/14		jue 02/01/14	mié 31/12/14		\$8,941 Fin		\$8,941	
339	4.1.10	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0	lun 05/01/15 252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16		lun 05/01/15	vie 08/01/16		\$8,393 Fin		\$8,393	
344	4.1.11	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0	lun 04/01/16 248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16		lun 04/01/16	vie 16/12/16		\$7,756 Fin		\$7,756	
356	4.1.12	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0	lun 02/01/17 192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17		lun 13/03/17	lun 11/12/17		\$8,415 Fin		\$8,415	
370	4.1.13	33%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	0	1	lun 02/01/17 96 días	mié 31/01/18	jue 14/06/18		mié 31/01/18	NOD		\$5,060 Fin		\$0	
371	4.1.13.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	lun 02/01/17 8 días	mié 31/01/18	vie 09/02/18		mié 31/01/18	vie 09/02/18		\$0 Fin		\$0	
373	4.1.13.2	27%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	lun 06/02/17 87 días	lun 12/02/18	jue 14/06/18		lun 12/02/18	NOD		\$5,060 Fin		\$0	
374	4.1.13.2.1	100%	Enero 2018	0	0	NOD 13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18		lun 12/02/18	mié 28/02/18		\$0 Fin		\$0	
375	4.1.13.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	NOD 13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18		lun 12/02/18	mié 28/02/18		\$0 Fin		\$0	
376	4.1.13.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	NOD 20 días	vie 02/03/18	jue 29/03/18		NOD	NOD		\$2,540 Fin		\$0	
377	4.1.13.2.4	0%	Abril 2018	0	0	NOD 20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18		NOD	NOD		\$840 Fin		\$0	
378	4.1.13.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	NOD 20 días	mié 02/05/18	mar 29/05/18		NOD	NOD		\$840 Fin		\$0	
379	4.1.13.2.6	0%	Junio 2018	0	0	NOD 10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18		NOD	NOD		\$840 Fin		\$0	
380	4.1.14	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2014	0	0	jue 02/01/14 239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14		jue 02/01/14	mar 02/12/14		\$12,347 Fin		\$12,347	

3er trim

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	┌	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	└	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividades Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
385	4.1.15	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2015	0	0	mar 20 días 02/02/16	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15			\$6,244 Fin		\$6,244
390	4.1.16	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2016	0	0	mar 213 días 02/02/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16			\$33,135 Fin		\$33,135
401	4.1.17	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2017	0	0	lun 02/01/17 221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17			\$38,194 Fin		\$38,194
415	4.1.18	0%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2018	0	0	lun 02/01/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,000 Fin		\$0
416	4.1.18.1	0%	Etapas de Adquisición:	0	0	lun 02/01/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0 Fin		\$0
417	4.1.18.1.1	0%	Contratación	0	0	lun 02/01/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0 Fin		\$0
418	4.1.18.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	lun 06/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,000 Fin		\$0
419	4.1.18.2.1	0%	Entrega	0	0	lun 06/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,000 Prorrate		\$0
420	4.1.19	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	jue 02/01/14 220 días	jue 02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14			\$4,241 Fin		\$4,241
425	4.1.20	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	lun 02/02/15 222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15			\$2,021 Fin		\$2,021
430	4.1.21	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	mar 226 días 02/02/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16			\$19,651 Fin		\$19,651
443	4.1.22	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	jue 02/02/17 201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17			\$16,591 Fin		\$16,591
454	4.1.23	0%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0	jue 02/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,560 Fin		\$0
455	4.1.23.1	0%	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 02/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0 Fin		\$0
456	4.1.23.1.1	0%	Proceso de Compra	0	0	jue 02/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0 Fin		\$0
457	4.1.23.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	jue 09/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,560 Fin		\$0
458	4.1.23.2.1	0%	Entrega 10000	0	0	jue 09/02/17 74 días	jue 01/03/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$21,560 Prorrate		\$0
459	4.1.24	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2014	0	0	lun 02/02/15 111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15			\$13,703 Fin		\$13,703
471	4.1.25	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2015	0	0	jue 30/06/16 164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17			\$24,325 Fin		\$24,325
484	4.1.26	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2016	0	0	mar 177 días 02/05/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17			\$51,789 Fin		\$51,789
492	4.1.27	34%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2017	0	1	mar 195 días 02/05/17	lun 28/08/17	jue 31/05/18	lun 28/08/17	NOD			\$54,000 Fin		\$0
493	4.1.27.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 02/05... 63 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17			\$0 Fin		\$0
500	4.1.27.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	vie 22/09/17 97 días	mar 16/01/18	jue 31/05/18	NOD	NOD			\$54,000 Fin		\$0
501	4.1.27.2.1	0%	Primer Producto 20% del valor del contrato	0	1	vie 22/09/17 55 días	mar 16/01/18	vie 30/03/18	NOD	NOD 499FC+			\$14,000 Fin		\$0
502	4.1.27.2.2	0%	Segundo Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17 20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 501			\$20,000 Fin		\$0
503	4.1.27.2.3	0%	Tercer Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17 22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 502			\$20,000 Fin		\$0
504	4.1.28	25%	Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	0	1	mar 116 días 02/05/17	jue 30/11/17	lun 14/05/18	jue 30/11/17	NOD			\$25,314 Fin		\$0
505	4.1.28.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 02/05... 27 días	jue 30/11/17	lun 08/01/18	jue 30/11/17	lun 08/01/18			\$0 Fin		\$0
509	4.1.28.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	vie 22/09/17 81 días	vie 19/01/18	lun 14/05/18	NOD	NOD			\$25,314 Fin		\$0
510	4.1.28.2.1	0%	Primer Producto 20% del valor del contrato 25313.80	0	1	vie 22/09/17 51 días	vie 19/01/18	jue 29/03/18	NOD	NOD 508FC+			\$5,063 Fin		\$0
511	4.1.28.2.2	0%	Segundo Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17 20 días	vie 30/03/18	vie 27/04/18	NOD	NOD 510			\$10,126 Fin		\$0
512	4.1.28.2.3	0%	Tercer Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17 10 días	lun 30/04/18	lun 14/05/18	NOD	NOD 511			\$10,126 Fin		\$0
513	4.1.29	100%	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	0	0	lun 02/12/13 531 días	lun 02/12/13	mié 23/12/15	lun 02/12/13	mié 23/12/15			\$6,977 Fin		\$6,977
520	4.1.30	100%	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	0	0	mié 10/12/... 264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15			\$2,362 Fin		\$2,362
527	4.1.31	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	0	0	lun 02/12/13 283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14			\$10,220 Fin		\$10,220

3er trim

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◆	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
534	4.1.32	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	0	0	mié 10/12/...	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15		\$13,846 Fin		\$13,846
541	4.1.33	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
559	4.1.34	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
577	4.1.35	15%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	0	1	mar 03/01/...	129 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
578	4.1.35.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/...	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
582	4.1.35.2	8%	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	1	mié 04/01/...	94 días	vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
583	4.1.35.2.1	100%	Enero 2018	0	0	jue 02/03/17	2 días	vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18	581	\$1,769 Fin		\$1,769
584	4.1.35.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	mar 04/04/...	4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18	583	\$1,764 Fin		\$1,764
585	4.1.35.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	mié 03/05/...	20 días	lun 26/02/18	vie 23/03/18	NOD	NOD 584		\$1,770 Fin		\$0
586	4.1.35.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 585		\$1,770 Fin		\$0
587	4.1.35.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 642		\$1,770 Fin		\$0
588	4.1.35.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 587		\$1,770 Fin		\$0
589	4.1.36	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	0	0	lun 09/02/15	220 días	lun 09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15		\$12,957 Fin		\$12,957
597	4.1.37	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
615	4.1.38	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,997 Fin		\$17,997
633	4.1.39	16%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	0	1	mar 03/01/...	129 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
634	4.1.39.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/...	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
638	4.1.39.2	8%	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	1	mié 04/01/...	94 días	vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
639	4.1.39.2.1	100%	Enero 2018	0	0	jue 02/03/17	2 días	vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18	637	\$1,769 Fin		\$1,769
640	4.1.39.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	mar 04/04/...	4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18	639	\$1,764 Fin		\$1,764
641	4.1.39.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	mié 03/05/...	20 días	lun 26/02/18	vie 23/03/18	NOD	NOD 640		\$1,770 Fin		\$0
642	4.1.39.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 641		\$1,770 Fin		\$0
643	4.1.39.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 642		\$1,770 Fin		\$0
644	4.1.39.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 643		\$1,770 Fin		\$0
645	4.1.40	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	0	0	mar 17/02/...	214 días	mar 17/02/15	mié 23/12/15	mar 17/02/15	mié 23/12/15		\$10,769 Fin		\$10,769
652	4.1.41	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
670	4.1.42	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
688	4.1.43	16%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	0	1	vie 20/01/17	129 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
689	4.1.43.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	vie 20/01/17	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
693	4.1.43.2	8%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	vie 24/02/17	94 días	vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$10,613 Fin		\$3,533
694	4.1.43.2.1	100%	Enero 2018	0	0	vie 24/02/17	2 días	vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18	692	\$1,769 Fin		\$1,769
695	4.1.43.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	vie 24/02/17	4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18	694	\$1,764 Fin		\$1,764
696	4.1.43.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	mar 28/03/...	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD 695		\$1,770 Fin		\$0
697	4.1.43.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 28/04/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 696		\$1,770 Fin		\$0
698	4.1.43.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 697		\$1,770 Fin		\$0
699	4.1.43.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 698		\$1,770 Fin		\$0
700	4.1.44	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	0	0	lun 15/12/14	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$21,539 Fin		\$21,539
707	4.1.45	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
725	4.1.46	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
743	4.1.47	16%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	0	1	mar 03/01/...	129 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
744	4.1.47.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/...	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
748	4.1.47.2	8%	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	1	mié 04/01/...	94 días	vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
749	4.1.47.2.1	100%	Enero 2018	0	0	jue 02/03/17	2 días	vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18	747	\$2,721 Fin		\$2,721
750	4.1.47.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	mar 04/04/...	4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18	749	\$2,714 Fin		\$2,714
751	4.1.47.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	mié 03/05/...	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD 750		\$2,725 Fin		\$0
752	4.1.47.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 751		\$2,725 Fin		\$0
753	4.1.47.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 752		\$2,725 Fin		\$0
754	4.1.47.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 753		\$2,725 Fin		\$0

3er trim

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	▬	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividades Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
755	4.1.48	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015	0	0	mié 02/09/... 80 días		mié 02/09/15	mié 23/12/15	mié 02/09/15	mié 23/12/15		\$6,924 Fin		\$6,924
762	4.1.49	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016	0	0	0 lun 07/12/15 262 días		lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
780	4.1.50	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	0	0	0 vie 20/01/17 232 días		vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
798	4.1.51	16%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018	0	1	1 mar 03/01... 129 días		jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
799	4.1.51.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	0 mar 03/01... 17 días		jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
803	4.1.51.2	8%	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	1	1 mié 04/01/... 94 días		vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
804	4.1.51.2.1	100%	Enero 2018	0	0	0 jue 02/03/17 2 días		vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18 802		\$2,721 Fin		\$2,721
805	4.1.51.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	0 mar 04/04/... 4 días		mar 20/02/18	lun 26/02/18	mar 20/02/18	lun 26/02/18 804		\$2,714 Fin		\$2,714
806	4.1.51.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	1 mié 03/05/... 20 días		mar 27/02/18	lun 26/03/18	NOD	NOD 805		\$2,725 Fin		\$0
807	4.1.51.2.4	0%	Abril 2018	0	0	0 vie 02/06/17 20 días		lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 806		\$2,725 Fin		\$0
808	4.1.51.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	0 vie 02/06/17 22 días		mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 807		\$2,725 Fin		\$0
809	4.1.51.2.6	0%	Junio 2018	0	0	0 vie 02/06/17 10 días		vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		\$2,725 Fin		\$0
810	4.1.52	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2014	0	0	0 lun 02/12/13 283 días		lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14		\$2,587 Fin		\$2,587
817	4.1.53	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2015	0	0	0 lun 02/02/15 225 días		lun 02/02/15	mié 23/12/15	lun 02/02/15	mié 23/12/15		\$20,915 Fin		\$20,915
824	4.1.54	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016	0	0	0 mar 08/12... 226 días		mar 08/12/15	vie 28/10/16	mar 08/12/15	vie 28/10/16		\$23,328 Fin		\$23,328
840	4.1.55	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016 (2do Consultor)	0	0	0 lun 17/10/16 45 días		lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16		\$3,598 Fin		\$3,598
848	4.1.56	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	0	0	0 vie 20/01/17 232 días		vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$27,913 Fin		\$27,913
865	4.1.57	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como	0	0	0 mar 13/10... 53 días		mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15		\$4,724 Fin		\$4,724
873	4.1.58	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como	0	0	0 lun 19/09/16 64 días		lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16		\$5,992 Fin		\$5,992
882	4.1.59	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	0	0	0 mar 13/10/15 53 días		mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15		\$3,542 Fin		\$3,542
890	4.1.60	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	0	0	0 lun 07/12/15 262 días		lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
908	4.1.61	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	0	0	0 vie 20/01/17 112 días		vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17		\$14,687 Fin		\$14,687
920	4.1.62	100%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	0	0	0 lun 29/08/16 78 días		lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16		\$8,306 Fin		\$8,306
930	4.1.63	100%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	0	0	0 vie 20/01/17 232 días		vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
948	4.1.64	16%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	0	1	1 mar 03/01/17 129 días		jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
949	4.1.64.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	0 mar 03/01... 17 días		jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
953	4.1.64.2	8%	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	1	1 mié 04/01/... 94 días		vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD		\$16,335 Fin		\$5,435
954	4.1.64.2.1	100%	Enero 2018	0	0	0 jue 02/03/17 2 días		vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18 952		\$2,721 Fin		\$2,721
955	4.1.64.2.2	100%	Febrero 2018	0	0	0 mar 04/04/... 4 días		mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18 954		\$2,714 Fin		\$2,714
956	4.1.64.2.3	0%	Marzo 2018	0	1	1 mié 03/05/... 22 días		jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD 955		\$2,725 Fin		\$0
957	4.1.64.2.4	0%	Abril 2018	0	0	0 vie 02/06/17 20 días		lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 956		\$2,725 Fin		\$0
958	4.1.64.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	0 vie 02/06/17 22 días		mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 957		\$2,725 Fin		\$0
959	4.1.64.2.6	0%	Junio 2018	0	0	0 vie 02/06/17 10 días		vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 958		\$2,725 Fin		\$0
960	4.1.65	100%	Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucion	0	0	0 vie 20/01/17 5 días		lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17		\$0 Fin		\$0
970	4.1.66	100%	Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	0	0	0 vie 20/01/17 117 días		mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17		\$7,653 Fin		\$7,653
980	4.1.67	100%	Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas	0	0	0 vie 20/01/17 20 días		lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17		\$954 Fin		\$954
987	4.1.68	100%	Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la	0	0	0 lun 11/08/14 197 días		lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15		\$31,281 Fin		\$31,281
995	4.1.69	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil	0	0	0 lun 05/10/15 58 días		lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15		\$1,311 Fin		\$1,311

3er trim

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◆	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
1002	4.1.70	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil	0	0	mar 08/12/15	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16		\$5,195 Fin		\$5,195	3er trim
1009	4.1.71	100%	Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en	0	0	lun 02/05/16	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16		\$28,536 Fin		\$28,536	
1019	4.1.72	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de	0	0	mar 01/12/15	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16		\$5,930 Fin		\$5,930	
1030	4.1.73	100%	Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Geron, Guatemala y Fiscalía en	0	0	lun 02/05/16	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16		\$7,930 Fin		\$7,930	
1040	4.1.74	100%	Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de	0	0	lun 17/10/16	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16		\$8,011 Fin		\$8,011	
1049	4.1.75	100%	Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	0	lun 22/08/16	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16		\$24,832 Fin		\$24,832	
1059	4.1.76	100%	Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0	mié 01/06/16	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16		\$25,385 Fin		\$25,385	
1069	4.1.77	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0	lun 14/11/16	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17		\$20,930 Fin		\$20,930	
1078	4.1.78	100%	Proceso de Contratación: Peritraje Cultural en Guatemala	0	0	jue 05/01/17	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17		\$41,594 Fin		\$41,594	
1087	4.1.79	30%	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	0	1 jue 05/01/17	129 días	lun 30/10/17	vie 27/04/18	lun 30/10/17	NOD		\$25,410 Fin		\$5,090	
1088	4.1.79.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	15 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	vie 03/11/17		\$0 Fin		\$0	
1092	4.1.79.2	24%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	99 días	lun 11/12/17	vie 27/04/18	lun 11/12/17	NOD		\$25,410 Fin		\$5,090	
1093	4.1.79.2.1	100%	Pago Producto No. 1 20% del valor del contrato	0	0	jue 23/02/17	12 días	lun 11/12/17	mié 27/12/17	lun 11/12/17	mié 27/12/17	1091	\$5,090 Fin		\$5,090	
1094	4.1.79.2.2	0%	Pago Producto No. 2 50% del valor del contrato	0	1	jue 23/02/17	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD		\$12,706 Fin		\$0	
1095	4.1.79.2.3	0%	Pago Producto No. 3 30% del valor del contrato	0	0	jue 23/02/17	19 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD		\$7,614 Fin		\$0	
1096	4.1.80	100%	Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de	0	0	jue 05/01/17	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17		\$28,541 Fin		\$28,541	
1104	4.1.81	100%	Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	0	lun 12/01/15	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15		\$15,666 Fin		\$15,666	
1112	4.1.82	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	lun 04/05/15	80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15		\$1,130 Fin		\$1,130	
1117	4.1.83	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	mar 02/02/16	230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16		\$1,501 Fin		\$1,501	
1123	4.1.84	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	jue 02/02/17	128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17		\$1,460 Fin		\$1,460	
1129	4.1.85	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	lun 22/09/14	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14		\$1,800 Fin		\$1,800	
1134	4.1.86	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	lun 23/03/15	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15		\$8,543 Fin		\$8,543	
1139	4.1.87	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	lun 04/07/16	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17		\$13,742 Fin		\$13,742	
1148	4.1.88	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	lun 05/06/17	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17		\$1,147 Fin		\$1,147	
1157	4.1.89	38%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	2	2	lun 05/06/17	26 días	mié 14/02/18	mié 21/03/18	mié 14/02/18	NOD		\$2,050 Fin		\$0	
1158	4.1.89.1	40%	Etapas de Adquisición:	2	1	lun 05/06/17	25 días	mié 14/02/18	mar 20/03/18	mié 14/02/18	NOD		\$0 Fin		\$0	
1159	4.1.89.1.1	100%	Elaboración de Especificaciones	0	0	lun 05/06/17	4 días	mié 14/02/18	lun 19/02/18	mié 14/02/18	lun 19/02/18		\$0 Fin		\$0	
1160	4.1.89.1.2	100%	No Objeción	0	0	NOD	6 días	mar 20/02/18	mar 27/02/18	mar 20/02/18	mar 27/02/18	1159	\$0 Fin		\$0	
1161	4.1.89.1.3	0%	Publicación y Evaluación	1	0	lun 12/06/17	5 días	mié 28/02/18	mar 06/03/18	NOD	NOD	1160	\$0 Fin		\$0	

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	▬	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próximo Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
1162	4.1.89.1.4	0%	No Objeción	1	0	NOD 5 días		mié 07/03/18	mar 13/03/18		NOD	NOD 1161		\$0 Fin	\$0	
1163	4.1.89.1.5	0%	Adjudicacion y Contratacion	0	1	lun 26/06/17 5 días		mié 14/03/18	mar 20/03/18		NOD	NOD 1162		\$0 Fin	\$0	
1164	4.1.89.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	1 lun 10/07/17 1 día		mié 21/03/18	mié 21/03/18		NOD	NOD	\$2,050 Fin	\$0		
1165	4.1.89.2.1	0%	Pago	0	1	lun 10/07/17 1 día		mié 21/03/18	mié 21/03/18		NOD	NOD 1163		\$2,050 Fin	\$0	
1166	4.1.90	0%	Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	4	0	0 lun 05/06/17 14 días		lun 05/02/18	mié 21/02/18		NOD	NOD	\$440 Fin	\$0		
1167	4.1.90.1	0%	Etapas de Adquisición:	3	0	0 lun 05/06/17 13 días		lun 05/02/18	mar 20/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0		
1168	4.1.90.1.1	0%	Elaboracion de Especificaciones, Invitación y Adjudicación	1	0	0 lun 05/06/17 3 días		lun 05/02/18	mié 07/02/18		NOD	NOD	\$0 Fin	\$0		
1169	4.1.90.1.2	0%	No Objeción	1	0	NOD 5 días		jue 08/02/18	mar 13/02/18		NOD	NOD 1168		\$0 Fin	\$0	
1170	4.1.90.1.3	0%	Adjudicacion y Contratacion	1	0	0 lun 26/06/17 5 días		mié 14/02/18	mar 20/02/18		NOD	NOD 1169		\$0 Fin	\$0	
1171	4.1.90.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1	0	0 lun 10/07/17 1 día		mié 21/02/18	mié 21/02/18		NOD	NOD	\$440 Fin	\$0		
1172	4.1.90.2.1	0%	Pago	1	0	0 lun 10/07/17 1 día		mié 21/02/18	mié 21/02/18		NOD	NOD 1170		\$440 Fin	\$0	
1173	4.1.91	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	0 lun 02/03/15 123 días		lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15		\$2,306 Fin	\$2,306		
1178	4.1.92	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	0 lun 22/08/16 7 días		lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16		\$1,961 Fin	\$1,961		
1183	4.1.93	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick U)	0	0	0 lun 17/07/17 10 días		mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17		\$4,975 Fin	\$4,975		
1188	4.1.94	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0	0 lun 17/07/17 42 días		lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17		\$1,808 Fin	\$1,808		
1193	4.1.95	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	0	0	0 lun 08/06/15 16 días		lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15		\$681 Fin	\$681		
1198	4.1.96	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	0	0	0 vie 01/04/16 174 días		vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16		\$1,236 Fin	\$1,236		
1205	4.1.97	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	0	0	0 vie 17/02/17 193 días		mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17		\$1,084 Fin	\$1,084		
1213	4.1.98	19%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	1	0	0 vie 17/02/17 89 días		lun 05/02/18	vie 08/06/18	lun 05/02/18	NOD		\$5,000 Fin	\$593		
1214	4.1.98.1	0%	Etapas de Adquisición:	1	0	0 vie 17/02/17 4 días		lun 05/02/18	jue 08/02/18	lun 05/02/18	NOD		\$0 Fin	\$0		
1215	4.1.98.1.1	0%	Proceso de Compra	1	0	0 vie 17/02/17 4 días		lun 05/02/18	jue 08/02/18	lun 05/02/18	NOD		\$0 Fin	\$0		
1216	4.1.98.2	20%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	0 vie 03/03/17 87 días		mié 07/02/18	vie 08/06/18	mié 07/02/18	NOD		\$5,000 Fin	\$593		
1217	4.1.98.2.1	0%	Entrega	0	0	0 vie 03/03/17 70 días		jue 01/03/18	vie 08/06/18		NOD		\$4,407 Fin	\$0		
1218	4.1.98.2.2	100%	Pago Febrero	0	0	0 vie 03/03/17 17 días		mié 07/02/18	mié 28/02/18	mié 07/02/18	mié 28/02/18		\$593 Fin	\$593		
1219	4.1.99	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	0 lun 04/05/15 19 días		lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15		\$3,731 Fin	\$3,731		
1224	4.1.100	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	0 lun 29/08/16 24 días		lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16		\$305 Fin	\$305		
1229	4.1.101	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	0 lun 29/08/16 21 días		lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17		\$1,777 Fin	\$1,777		
1234	4.1.102	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2014	0	0	0 lun 16/12/13 273 días		lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14		\$4,121 Fin	\$4,121		
1239	4.1.103	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2015	0	0	0 lun 15/12/14 261 días		lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$5,084 Fin	\$5,084		
1244	4.1.104	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2017	0	0	0 lun 15/12/14 190 días		lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17		\$3,914 Fin	\$3,914		
1253	4.1.105	100%	Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Proji	0	0	0 lun 15/12/14 58 días		lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17		\$3,845 Fin	\$3,845		
1259	4.1.106	100%	Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017	0	0	0 lun 15/12/14 38 días		lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17		\$1,968 Fin	\$1,968		
1264	4.1.107	100%	Proceso de Contratación: Remodelacion de la Oficina para la Coordinacion de la UE de la SEICMSJ	0	0	0 lun 04/05/15 41 días		lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15		\$13,734 Fin	\$13,734		
1272	4.1.108	0%	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparacion de Oficina para la coordinacion de la UE 2017	0	0	0 lun 06/02/17 25 días		lun 06/02/17	vie 10/03/17		NOD		\$0 Fin	\$0		
1279	4.1.109	100%	Proceso de Adquisicion: Equipamiento de la U.E.	0	0	0 mié 10/12/14 305 días		mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16		\$32,055 Fin	\$32,055		
1288	4.1.110	100%	Proceso de Adquisicion: Aire Acondicionado	0	0	0 lun 11/05/15 25 días		lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin	\$5,262		
1295	4.1.111	100%	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0	0 jue 09/02/17 101 días		lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17		\$11,052 Fin	\$11,052		
1303	4.1.112	100%	Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic	0	0	0 vie 26/02/16 1 día		vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$2,480 Fin	\$2,480		
1304	4.1.113	100%	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	0 vie 02/01/15 260 días		vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16		\$1,704 Fin	\$1,704		
1305	4.1.114	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	0 vie 02/01/15 246 días		vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15		\$10 Fin	\$10		
1306	4.1.115	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	0 lun 04/01/16 253 días		lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$70 Fin	\$70		
1307	4.1.116	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	NOD 201 días		vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17		\$80 Fin	\$80		
1308	4.1.117	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	0 lun 17/08/15 5 días		lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15		\$336 Fin	\$336		

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◆	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real		
1309	4.1.118	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	vie 01/04/16	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16						3er trim
1310	4.1.119	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	NOD	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17			\$858 Fin	\$858		
1311	5	2%	Clausulas	5	0	mié 24/10/...	2655 días	mié 24/10/07	mar 30/01/18	mié 24/10/07	NOD			\$0 Fin	\$0		
1326	6	1%	Plan de Preparación de Cierre	13	1	NOD	145 días	mié 22/11/17	jue 14/06/18	mié 22/11/17	NOD			\$0 Fin	\$0		
1360	7	0%	Fase de Cierre	2	4	NOD	75 días	mié 28/02/18	jue 14/06/18	NOD	NOD			\$0 Fin	\$0		

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 06/03/18

División crítica		Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Margen de demora	
Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Retrasada	
Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress			
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Progreso manual			

Observaciones / Desafíos

- No aparece los montos actualizados para la Unidad Ejecutora en los Datos Generales del Avance del mes de Febrero / 2018, de acuerdo a la última modificación entre componentes sin afectar los montos globales de las categorías asignadas en la segunda transferencia, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-3083/2017 de fecha 11/12/2017.

Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 14/6/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

7/3/2018 - 8:39 AM
