

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Julio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/08/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,160,928.09	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

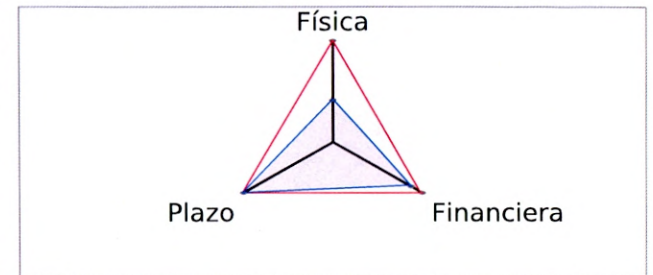

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.48 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Julio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,426,283.47	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	109.12% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	83.48%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	15	0		42	42

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoria Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

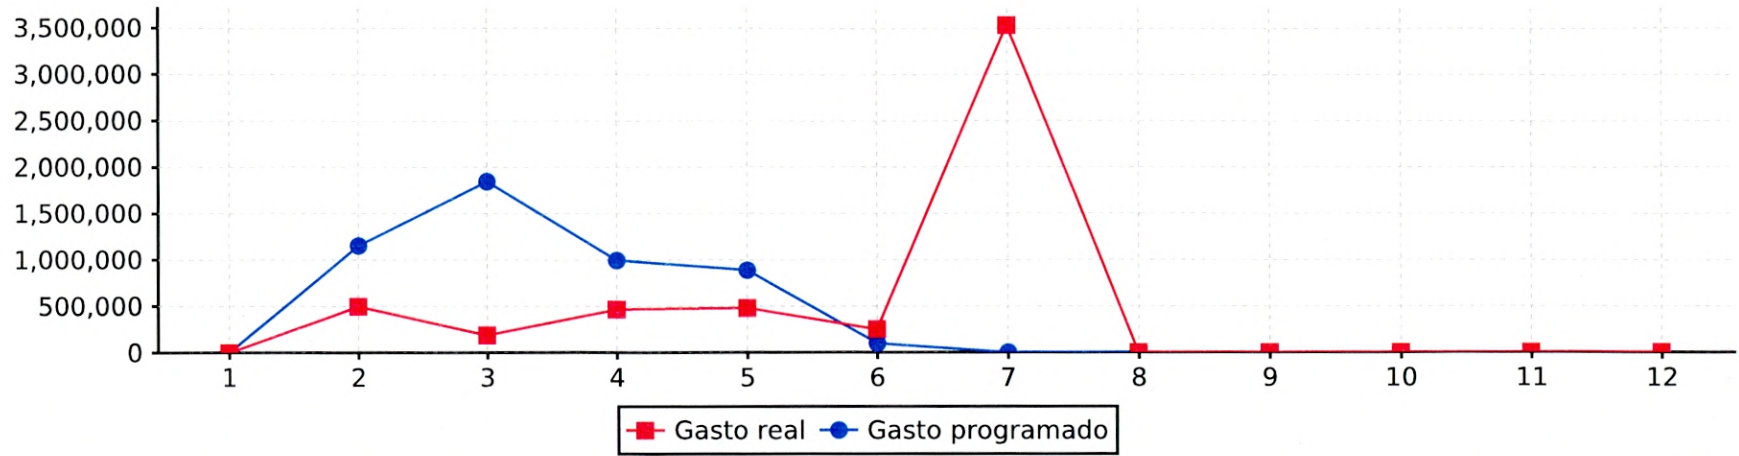

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												5,426,283.47
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	Fuen	Ident	EDT	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo	1er semestre		2º semestre	
																			Completado Esperado Fin año	Completado a fin de año actual	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance
322																						
327	1	...	BID	No 4	96%	No	Administración	2	6 1282 días	mié 02/10/13	vie 05/10/18	mié 02/10/...		NOD		\$1,632,812	Fin	\$1,563,590	\$0			
328	1	...	BID	No 4.1	96%	No	Gastos indirectos e imprevisos (SE)	2	6 1282 días	mié 02/10/13	vie 05/10/18	mié 02/10/...		NOD		\$1,632,812	Fin	\$1,563,590	\$0			
329	1	100%	...	BID	No 4.1.1	100%	Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB 2014	0	0 15 días	jue 11/12/14	mié 31/12/14	jue 11/12/14	mié 31/12/14	36		\$1,974	Fin	\$1,974	\$0			
330	1	100%	...	BID	No 4.1.2	100%	Pagos Administrativos 2013	0	0 65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13	mié 02/10/...	mar 31/12/13			\$20,995	Fin	\$20,995	\$0			
331	1	BID	No 4.1.3	100%	Proceso de Adquisiciones: Vehículos (Camionetas) 2015	0	0 75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15	jue 16/04/15	jue 30/07/15			\$66,393	Fin	\$66,393	\$0			
338	1	BID	No 4.1.4	100%	Proceso de Adquisiciones: Vehículos (5 Pick Up) 2016	0	0 141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17	lun 29/08/16	mié 22/03/17			\$147,041	Fin	\$147,041	\$0			
348	1	BID	No 4.1.5	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0 160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14	jue 02/01/14	mié 13/08/14			\$1,804	Fin	\$1,804	\$0			
353	1	BID	No 4.1.6	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0 161 días	vie 02/01/15	lun 24/08/15	vie 02/01/15	lun 24/08/15			\$1,935	Fin	\$1,935	\$0			
358	1	BID	No 4.1.7	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0 220 días	mié 17/02/16	jue 22/12/16	mié 17/02/...	jue 22/12/16			\$9,290	Fin	\$9,290	\$0			
369	1	BID	No 4.1.8	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0 84 días	jue 02/02/17	mié 31/05/17	jue 02/02/17	mié 31/05/17			\$3,758	Fin	\$3,758	\$0			
376	1	BID	No 4.1.9	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0 260 días	jue 02/01/14	mié 31/12/14	jue 02/01/14	mié 31/12/14			\$8,941	Fin	\$8,941	\$0			
381	1	BID	No 4.1.10	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0 252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16			\$8,393	Fin	\$8,393	\$0			
386	1	BID	No 4.1.11	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0 248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16			\$7,756	Fin	\$7,756	\$0			
398	1	BID	No 4.1.12	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0 192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17			\$8,415	Fin	\$8,415	\$0			
412	1	BID	No 4.1.13	64%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	1	1 171 días	mié 31/01/18	vie 28/09/18	mié 31/01/18		NOD		\$7,480	Fin	\$4,540	\$0			
413	1	BID	No 4.1.13	100%	Etapas de Adquisición:	0	0 8 días	mié 31/01/18	vie 09/02/18	mié 31/01/...	vie 09/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
415	1	BID	No 4.1.13	60%	Etapas de Ejecución de pagos:	1	1 162 días	lun 12/02/18	vie 28/09/18	lun 12/02/18		NOD		\$7,480	Fin	\$4,540	\$0			
416	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Enero 2018	0	0 13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
417	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Febrero 2018	0	0 13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0			
418	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Marzo 2018	0	0 3 días	mar 17/04/18	jue 19/04/18	mar 17/04/...	jue 19/04/18			\$2,521	Fin	\$2,521	\$0			
419	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Abril 2018	0	0 4 días	mar 24/04/18	vie 27/04/18	mar 24/04/...	vie 27/04/18			\$803	Fin	\$803	\$0			
420	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Mayo 2018	0	0 6 días	jue 17/05/18	jue 24/05/18	jue 17/05/18	jue 24/05/18			\$797	Fin	\$797	\$0			
421	1	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	Junio 2018	0	0 6 días	jue 07/06/18	jue 14/06/18	jue 07/06/18	jue 14/06/18			\$420	Fin	\$420	\$0			
422	1	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	Julio 2018	1	1 0 días	mié 01/08/18	mié 15/08/18			NOD		\$1,260	Fin	\$0	\$0			
423	1	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	Agosto 2018	0	0 10 días	lun 20/08/18	vie 31/08/18			NOD		\$840	Fin	\$0	\$0			
424	1	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	Septiembre 2018	0	0 10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18			NOD		\$840	Fin	\$0	\$0			
425	1	BID	No 4.1.14	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2014	0	0 239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	jue 02/01/14	mar 02/12/14			\$12,347	Fin	\$12,347	\$0			
430	1	BID	No 4.1.15	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0 20 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15			\$6,244	Fin	\$6,244	\$0			
435	1	BID	No 4.1.16	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0 213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16			\$33,135	Fin	\$33,135	\$0			
446	1	BID	No 4.1.17	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0 221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17			\$38,194	Fin	\$38,194	\$0			
460	1	BID	No 4.1.18	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0 220 días	jue 02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14			\$4,241	Fin	\$4,241	\$0			
465	1	BID	No 4.1.19	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15			\$2,021	Fin	\$2,021	\$0			
470	1	BID	No 4.1.20	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 226 días	mar 02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16			\$19,651	Fin	\$19,651	\$0			
483	1	BID	No 4.1.21	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17			\$16,591	Fin	\$16,591	\$0			
494	1	BID	No 4.1.22	100%	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2014	0	0 111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15			\$13,703	Fin	\$13,703	\$0			
506	1	BID	No 4.1.23	100%	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2015	0	0 164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17			\$24,325	Fin	\$24,325	\$0			
519	1	BID	No 4.1.24	100%	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2016	0	0 177 días	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17			\$51,789	Fin	\$51,789	\$0			
527	1	BID	No 4.1.25	68%	Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2017	0	0 286 días	lun 28/08/17	vie 05/10/18	lun 28/08/17		NOD		\$69,920	Fin	\$23,441	\$0			
528	1	BID	No 4.1.25	100%	Etapas de Adquisición:	0	0 63 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17			\$0	Fin	\$0	\$0			
535	1	BID	No 4.1.25	19%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0 139 días	vie 23/03/18	vie 05/10/18	vie 23/03/18		NOD		\$69,920	Fin	\$23,441	\$0			
536	1	100%	...	BID	No 4.1.25	100%	Primer Producto 20% del valor del contrato	0	0 2 días	vie 23/03/18	lun 26/03/18	vie 23/03/18	lun 26/03/18	534FC+		\$11,760	Fin	\$11,760	\$0			
537	1	100%	...	BID	No 4.1.25	100%	Segundo Producto 20% del valor del contrato	0	0 4 días	jue 17/05/18	mar 22/05/18	jue 17/05/18	mar 22/05/18	536FC+		\$11,681	Fin	\$11,681	\$0			
538	1	100%	...	BID	No 4.1.25	0%	Tercer Producto 20% del valor del contrato	0	0 11 días	mié 01/08/18	jue 16/08/18			NOD		\$11,760	Fin	\$0	\$0			

Project: PEP_SMART_1905_31 72
Date: jue 09/08/18

Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margin de demora
Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
Split	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas criticas
Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

Page 2

Id	% Completado Esperado Fin año	% Cumplido a fin de año actual	% Fuen	Identif. Empr	EDT	% Avanc	Hitos	PMR/PI	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Próx. Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo				
																						1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre
539	1	100%	...	BID	No	4.1.25	0%	No	Cuarto Producto 40% del valor del contrato	0	0 10 días	0	03/09/18	0	14/09/18	0	NOD	NOD	\$23,519 Fin	\$0	\$0				
540	1	100%	...	BID	No	4.1.25	0%	No	Ampliación de Tiempo e incremento al contrato	0	0 5 días	0	01/10/18	0	05/10/18	0	NOD	NOD	\$11,200 Fin	\$0	\$0				
541	1	100%	...	BID	No	4.1.26	100%	No	Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	0	0 148 días	0	30/11/17	0	26/06/18	0	30/11/17	0	26/06/18	\$25,328 Fin	\$25,328	\$0			
550	1	100%	...	BID	No	4.1.27	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	0	0 531 días	0	02/12/13	0	23/12/15	0	02/12/13	0	23/12/15	\$6,977 Fin	\$6,977	\$0			
557	1	100%	...	BID	No	4.1.28	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	0	0 264 días	0	02/12/14	0	23/12/15	0	02/12/14	0	23/12/15	\$2,362 Fin	\$2,362	\$0			
564	1	100%	...	BID	No	4.1.29	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	0	0 283 días	0	02/12/13	0	31/12/14	0	02/12/13	0	31/12/14	\$10,220 Fin	\$10,220	\$0			
571	1	100%	...	BID	No	4.1.30	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	0	0 264 días	0	02/12/14	0	23/12/15	0	02/12/14	0	23/12/15	\$13,846 Fin	\$13,846	\$0			
578	1	100%	...	BID	No	4.1.31	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	0	0 259 días	0	02/12/15	0	16/12/16	0	02/12/15	0	16/12/16	\$17,634 Fin	\$17,634	\$0			
596	1	100%	...	BID	No	4.1.32	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	0	0 232 días	0	02/01/17	0	15/12/17	0	02/01/17	0	15/12/17	\$17,996 Fin	\$17,996	\$0			
614	1	100%	...	BID	No	4.1.33	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	0	0 130 días	0	02/12/17	0	14/06/18	0	02/12/17	0	14/06/18	\$10,524 Fin	\$10,524	\$0			
626	1	100%	...	BID	No	4.1.34	59%	No	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018 (2)	0	0 154 días	0	02/12/18	0	31/08/18	0	02/12/18	0	31/08/18	\$3,508 Fin	\$1,738	\$0			
627	1	100%	...	BID	No	4.1.34	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	0	15/06/18	0	10/07/18	0	15/06/18	0	10/07/18	\$0 Fin	\$0	\$0			
631	1	100%	...	BID	No	4.1.34	21%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	0 128 días	0	02/07/18	0	31/08/18	0	02/07/18	0	31/08/18	\$3,508 Fin	\$1,738	\$0			
632	1	100%	...	BID	No	4.1.34	100%	No	Julio 2018	0	0 4 días	0	02/07/18	0	27/07/18	0	02/07/18	0	27/07/18	\$1,738 Fin	\$1,738	\$0			
633	1	100%	...	BID	No	4.1.34	0%	No	Agosto 2018	0	0 15 días	0	13/08/18	0	31/08/18	0	NOD	NOD	\$1,770 Fin	\$0	\$0				
634	1	100%	...	BID	No	4.1.34	0%	No	Septiembre 2018	0	0 10 días	0	17/09/18	0	28/09/18	0	NOD	NOD	\$1,770 Fin	\$0	\$0				
635	1	100%	...	BID	No	4.1.35	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	0	0 220 días	0	09/02/15	0	23/12/15	0	09/02/15	0	23/12/15	\$12,957 Fin	\$12,957	\$0			
643	1	100%	...	BID	No	4.1.36	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	0	0 259 días	0	02/12/15	0	16/12/16	0	02/12/15	0	16/12/16	\$17,634 Fin	\$17,634	\$0			
661	1	100%	...	BID	No	4.1.37	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	0	0 232 días	0	02/01/17	0	15/12/17	0	02/01/17	0	15/12/17	\$17,997 Fin	\$17,997	\$0			
679	1	100%	...	BID	No	4.1.38	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	0	0 130 días	0	02/12/17	0	14/06/18	0	02/12/17	0	14/06/18	\$10,524 Fin	\$10,524	\$0			
691	1	100%	...	BID	No	4.1.39	48%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018 (2)	0	0 174 días	0	02/06/18	0	28/09/18	0	02/06/18	0	28/09/18	\$5,278 Fin	\$1,738	\$0			
692	1	100%	...	BID	No	4.1.39	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	0	15/06/18	0	10/07/18	0	15/06/18	0	10/07/18	\$0 Fin	\$0	\$0			
696	1	100%	...	BID	No	4.1.39	14%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	0 148 días	0	02/07/18	0	28/09/18	0	02/07/18	0	28/09/18	\$5,278 Fin	\$1,738	\$0			
697	1	100%	...	BID	No	4.1.39	100%	No	Julio 2018	0	0 4 días	0	02/07/18	0	27/07/18	0	02/07/18	0	27/07/18	\$1,738 Fin	\$1,738	\$0			
698	1	100%	...	BID	No	4.1.39	0%	No	Agosto 2018	0	0 15 días	0	13/08/18	0	31/08/18	0	NOD	NOD	\$1,770 Fin	\$0	\$0				
699	1	100%	...	BID	No	4.1.39	0%	No	Septiembre 2018	0	0 10 días	0	17/09/18	0	28/09/18	0	NOD	NOD	\$1,770 Fin	\$0	\$0				
700	1	100%	...	BID	No	4.1.40	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	0	0 214 días	0	02/12/15	0	23/12/15	0	02/12/15	0	23/12/15	\$10,769 Fin	\$10,769	\$0			
707	1	100%	...	BID	No	4.1.41	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	0	0 259 días	0	02/12/15	0	16/12/16	0	02/12/15	0	16/12/16	\$17,634 Fin	\$17,634	\$0			
725	1	100%	...	BID	No	4.1.42	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	0	0 232 días	0	02/01/17	0	15/12/17	0	02/01/17	0	15/12/17	\$17,996 Fin	\$17,996	\$0			
743	1	100%	...	BID	No	4.1.43	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	0	0 130 días	0	02/12/17	0	14/06/18	0	02/12/17	0	14/06/18	\$10,524 Fin	\$10,524	\$0			
755	1	100%	...	BID	No	4.1.44	70%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018 (2)	1	0 42 días	0	15/06/18	0	15/08/18	0	15/06/18	0	15/08/18	\$2,606 Fin	\$1,738	\$0			
756	1	100%	...	BID	No	4.1.44	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	0	15/06/18	0	10/07/18	0	15/06/18	0	10/07/18	\$0 Fin	\$0	\$0			
760	1	100%	...	BID	No	4.1.44	29%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	1	0 16 días	0	02/07/18	0	15/08/18	0	02/07/18	0	15/08/18	\$2,606 Fin	\$1,738	\$0			
761	1	100%	...	BID	No	4.1.44	100%	No	Julio 2018	0	0 4 días	0	02/07/18	0	27/07/18	0	02/07/18	0	27/07/18	\$1,738 Fin	\$1,738	\$0			
762	1	100%	...	BID	No	4.1.44	0%	No	Agosto 2018	1	0 10 días	0	01/08/18	0	15/08/18	0	NOD	NOD	\$868 Fin	\$0	\$0				
763	1	100%	...	BID	No	4.1.44	0%	No	Septiembre 2018	0	0 10 días	0	17/09/18	0	28/09/18	0	NOD	NOD	\$868 Fin	\$0	\$0				
764	1	100%	...	BID	No	4.1.45	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	0	0 261 días	0	02/12/14	0	23/12/15	0	02/12/14	0	23/12/15	\$21,539 Fin	\$21,539	\$0			
771	1	100%	...	BID	No	4.1.46	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	0	0 259 días	0	02/12/15	0	16/12/16	0	02/12/15	0	16/12/16	\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
789	1	100%	...	BID	No	4.1.47	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	0	0 232 días	0	02/01/17	0	15/12/17	0	02/01/17	0	15/12/17	\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
807	1	100%	...	BID	No	4.1.48	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	0	0 130 días	0	02/12/17	0	14/06/18	0	02/12/17	0	14/06/18	\$16,190 Fin	\$16,190	\$0			
819	1	100%	...	BID	No	4.1.49	48%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018 (2)	0	0 174 días	0	02/06/18	0	28/09/18	0	02/06/18	0	28/09/18	\$8,124 Fin	\$2,674	\$0			
820	1	100%	...	BID	No	4.1.49	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0 18 días	0	15/06/18	0	10/07/18	0	15/06/18	0	10/07/18	\$0 Fin	\$0	\$0			
824	1	100%	...	BID	No	4.1.49	14%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	0 148 días	0	02/07/18	0	28/09/18	0	02/07/18	0	28/09/18	\$8,124 Fin	\$2,674	\$0			
825	1	100%	...	BID	No	4.1.49	100%	No	Julio 2018	0	0 4 días	0	02/07/18	0	27/07/18	0	02/07/18	0	27/07/18	\$2,674 Fin	\$2,674	\$0			
826	1	100%	...	BID	No	4.1.49	0%	No	Agosto 2018	0	0 15 días	0	13/08/18	0	31/08/18	0	NOD	NOD	\$2,725 Fin	\$0	\$0				
827	1	100%	...	BID	No	4.1.49	0%	No	Septiembre 2018	0	0 10 días	0	17/09/18	0	28/09/18	0	NOD	NOD	\$2,725 Fin	\$0	\$0				
828	1	100%	...	BID	No	4.1.50	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015	0	0 080 días	0	02/09/13	0	23/12/15	0	02/09/13	0	23/12/15	\$6,924 Fin	\$6,924	\$0			
835	1	100%	...	BID	No	4.1.51	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016	0	0 262 días	0	02/12/15	0	16/12/16	0	02/12/15	0	16/12/16	\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
853	1	100%	...	BID	No	4.1.52	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	0	0 232 días	0	02/01/17	0	15/12/17	0	02/01/17	0	15/12/17	\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
871	1	100%	...	BID	No	4.1.53	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018	0	0 130 días	0	02/12/17	0	14/06/18	0	02/12/17	0	14/06/18	\$16,190 Fin	\$16,190	\$0			
883	1	100%	...	BID	No																				

Id	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuente	Identificación	EDT	% Avance	Hito	PMR/PP	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre
930	1	100%	...	BID	No	4.1.59	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$27,913 Fin	\$27,913	\$0					
947	1	100%	...	BID	No	4.1.60	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como Apoyo al OJ	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15			\$4,724 Fin	\$4,724	\$0					
955	1	100%	...	BID	No	4.1.61	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como Apoyo al MP	0	0	64 días	lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16			\$5,992 Fin	\$5,992	\$0					
964	1	100%	...	BID	No	4.1.62	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15			\$3,542 Fin	\$3,542	\$0					
972	1	100%	...	BID	No	4.1.63	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	0	0	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16			\$28,127 Fin	\$28,127	\$0					
990	1	100%	...	BID	No	4.1.64	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	0	0	112 días	vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17			\$14,687 Fin	\$14,687	\$0					
1002	1	100%	...	BID	No	4.1.65	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	0	0	78 días	lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16			\$8,306 Fin	\$8,306	\$0					
1012	1	100%	...	BID	No	4.1.66	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$29,448 Fin	\$29,448	\$0					
1030	1	100%	...	BID	No	4.1.67	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18			\$16,190 Fin	\$16,190	\$0					
1042	1	61%	...	BID	No	4.1.68	61%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018 (2)	0	0	154 días	vie 15/06/18	vie 31/08/18	vie 15/06/18	NOD			\$5,399 Fin	\$2,674	\$0					
1043	1	100%	...	BID	No	4.1.68	100%	No	Etapa de Adquisición:	0	0	18 días	vie 15/06/18	mar 10/07/18	vie 15/06/18	mar 10/07/18			\$0 Fin	\$0	\$0					
1047	1	21%	...	BID	No	4.1.68	21%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:	0	0	128 días	lun 23/07/18	vie 31/08/18	lun 23/07/18	NOD			\$5,399 Fin	\$2,674	\$0					
1048	1	100%	...	BID	No	4.1.68	100%	No	Julio 2018	0	0	4 días	lun 23/07/18	vie 27/07/18	lun 23/07/18	vie 27/07/18			\$2,674 Fin	\$2,674	\$0					
1049	1	100%	...	BID	No	4.1.68	0%	No	Agosto 2018	0	0	15 días	lun 13/08/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$2,725 Fin	\$0	\$0					
1050	1	100%	...	BID	No	4.1.69	100%	No	Septiembre 2018	0	0	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17			\$0 Fin	\$0	\$0					
1051	1	100%	...	BID	No	4.1.69	100%	No	Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ	0	0	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17			\$7,653 Fin	\$7,653	\$0					
1061	1	100%	...	BID	No	4.1.70	100%	No	Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicos a Defensores Públicos	0	0	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17			\$7,653 Fin	\$7,653	\$0					
1071	1	100%	...	BID	No	4.1.71	100%	No	Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas	0	0	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17			\$954 Fin	\$954	\$0					
1078	1	100%	...	BID	No	4.1.72	100%	No	Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	0	0	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15			\$31,281 Fin	\$31,281	\$0					
1086	1	100%	...	BID	No	4.1.73	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	0	0	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15			\$1,311 Fin	\$1,311	\$0					
1093	1	100%	...	BID	No	4.1.74	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	0	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16			\$5,195 Fin	\$5,195	\$0					
1100	1	100%	...	BID	No	4.1.75	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16			\$28,536 Fin	\$28,536	\$0					
1110	1	100%	...	BID	No	4.1.76	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16			\$5,930 Fin	\$5,930	\$0					
1121	1	100%	...	BID	No	4.1.77	100%	No	Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en	0	0	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16			\$7,930 Fin	\$7,930	\$0					
1131	1	100%	...	BID	No	4.1.78	100%	No	Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el	0	0	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16			\$8,011 Fin	\$8,011	\$0					
1140	1	100%	...	BID	No	4.1.79	100%	No	Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	0	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16			\$24,832 Fin	\$24,832	\$0					
1150	1	100%	...	BID	No	4.1.80	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16			\$25,385 Fin	\$25,385	\$0					
1160	1	100%	...	BID	No	4.1.81	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17			\$20,930 Fin	\$20,930	\$0					
1169	1	100%	...	BID	No	4.1.82	100%	No	Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17			\$41,594 Fin	\$41,594	\$0					
1178	1	100%	...	BID	No	4.1.83	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	0	120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18			\$25,410 Fin	\$25,410	\$0					
1187	1	100%	...	BID	No	4.1.84	100%	No	Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17			\$28,541 Fin	\$28,541	\$0					

Project: PEP_SMART_1905_31 72
Date: jue 09/08/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◆ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Id	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuente	Identificador	EDT	% Avanc	Hito	PMR/PP	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo	1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre
1195	1	100%	BID	No 4.1.85	100%	No			Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el área de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	0 89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15			\$15,666 Fin	\$15,666	\$0					
1203	1	100%	BID	No 4.1.86	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15			\$1,130 Fin	\$1,130	\$0					
1208	1	100%	BID	No 4.1.87	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16			\$1,501 Fin	\$1,501	\$0					
1214	1	100%	BID	No 4.1.88	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17			\$1,460 Fin	\$1,460	\$0					
1220	1	100%	BID	No 4.1.89	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0 29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14			\$1,800 Fin	\$1,800	\$0					
1225	1	100%	BID	No 4.1.90	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15			\$8,543 Fin	\$8,543	\$0					
1230	1	100%	BID	No 4.1.91	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17			\$13,742 Fin	\$13,742	\$0					
1239	1	100%	BID	No 4.1.92	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17			\$1,147 Fin	\$1,147	\$0					
1248	1	100%	BID	No 4.1.93	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0 53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18			\$266 Fin	\$266	\$0					
1257	1	100%	BID	No 4.1.94	100%	No			Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	0	0 28 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18			\$803 Fin	\$803	\$0					
1266	1	100%	BID	No 4.1.95	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	0 34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18			\$453 Fin	\$453	\$0					
1273	1	100%	BID	No 4.1.96	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0 123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15			\$2,306 Fin	\$2,306	\$0					
1278	1	100%	BID	No 4.1.97	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0 7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16			\$1,961 Fin	\$1,961	\$0					
1283	1	100%	BID	No 4.1.98	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick	0	0 10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17			\$4,975 Fin	\$4,975	\$0					
1288	1	100%	BID	No 4.1.99	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0 42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17			\$1,808 Fin	\$1,808	\$0					
1293	1	100%	BID	No 4.1.100	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2015	0	0 16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15			\$681 Fin	\$681	\$0					
1298	1	100%	BID	No 4.1.101	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2016	0	0 174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16			\$1,236 Fin	\$1,236	\$0					
1305	1	100%	BID	No 4.1.102	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2017	0	0 193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17			\$1,084 Fin	\$1,084	\$0					
1313	1	100%	BID	No 4.1.103	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2018	0	0 19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18			\$593 Fin	\$593	\$0					
1319	1	100%	BID	No 4.1.104	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	0 19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15			\$3,731 Fin	\$3,731	\$0					
1324	1	100%	BID	No 4.1.105	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	0 24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16			\$305 Fin	\$305	\$0					
1329	1	100%	BID	No 4.1.106	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	0 21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17			\$1,777 Fin	\$1,777	\$0					
1334	1	100%	BID	No 4.1.107	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	0	0 273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14			\$4,121 Fin	\$4,121	\$0					
1339	1	100%	BID	No 4.1.108	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	0	0 261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15			\$5,084 Fin	\$5,084	\$0					
1344	1	100%	BID	No 4.1.109	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	0	0 190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17			\$3,914 Fin	\$3,914	\$0					
1353	1	100%	BID	No 4.1.110	100%	No			Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	0	0 26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18			\$2,018 Fin	\$2,018	\$0					
1358	1	100%	BID	No 4.1.111	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	0	0 29 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18			\$4,841 Fin	\$4,841	\$0					
1363	1	100%	BID	No 4.1.112	100%	No			Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	0	0 28 días	jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18			\$546 Fin	\$546	\$0					
1368	1	100%	BID	No 4.1.113	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría	0	0 29 días	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18			\$1,337 Fin	\$1,337	\$0					
1375	1	100%	BID	No 4.1.114	100%	No			Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0 58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17			\$3,845 Fin	\$3,845	\$0					
1381	1	100%	BID	No 4.1.115	100%	No			Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer	0	0 38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17			\$1,968 Fin	\$1,968	\$0					
1386	1	100%	BID	No 4.1.116	100%	No			Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	0	0 41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15			\$13,734 Fin	\$13,734	\$0					
1394	1	100%	BID	No 4.1.117	100%	No			Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de Oficina para la Corte Interamericana de la UE-2017	0	0 25 días	lun 06/02/17	jue 30/03/17	lun 06/02/17	jue 30/03/17			\$0 Fin	\$0	\$0					
1401	1	100%	BID	No 4.1.118	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0 305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16			\$32,055 Fin	\$32,055	\$0					
1410	1	100%	BID	No 4.1.119	100%	No			Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0 25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15			\$5,262 Fin	\$5,262	\$0					
1417	1	100%	BID	No 4.1.120	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0 101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17			\$11,052 Fin	\$11,052	\$0					
1425	1	100%	BID	No 4.1.121	100%	No			Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	0	0 1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16			\$2,480 Fin	\$2,480	\$0					

Project: PEP_SMART_1905_31 72
Date: jue 09/08/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Id	% Completado Esperado Fin año	% Cumplido a fin de año actual	Fuente	Identificador	EDT	% Avance	Hito	PMR/PI	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo						
																						1er semestre	2º semestre	1er semestre	2º semestre		
1426	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16				\$1,704	Fin	\$1,704	\$0				
1427	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15				\$10	Fin	\$10	\$0				
1428	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16				\$70	Fin	\$70	\$0				
1429	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17				\$80	Fin	\$80	\$0				
1430	1	100%	BID	No 4.1.12	0%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	0	0	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	NOD				\$20	Fin	\$20	\$0				
1431	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15				\$336	Fin	\$336	\$0				
1432	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16				\$858	Fin	\$858	\$0				
1433	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17				\$825	Fin	\$825	\$0				
1434	1	100%	BID	No 4.1.13	0%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2018	0	0	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/18	NOD				\$547	Fin	\$547	\$0				
1435	1	100%	BID	No 5	13%	No			Clausulas	1	0	2848 días	mié 24/10/07	mar 30/10/18	mié 24/10/07	NOD				\$0	Fin	\$0	\$0				
1449	1	100%	BID	No 6	10%	No			Plan de Preparación de Cierre	0	0	6210 días	mié 22/11/17	vie 14/09/18	mié 22/11/17	NOD				\$0	Fin	\$0	\$0				
1481	1	100%	BID	No 7	5%	No			Fase de Cierre	2	0	133 días	lun 30/04/18	lun 05/11/18	lun 30/04/18	NOD				\$0	Fin	\$0	\$0				
1507	1	100%	BID	No 8	0%	Sí			Fin del Programa	0	0	1 día	dom 30/09/11	dom 30/09/18	NOD	NOD				\$0	Fin	\$0	\$0				

Project: PEP_SMART_1905_31 7 2
Date: jue 09/08/18

División crítica	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margen de demora
Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas críticas
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de julio / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.

Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 30/9/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

9/8/2018 - 3:03 PM
