

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Junio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/07/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,193,228.79	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

**Gráfica de Ejecución**

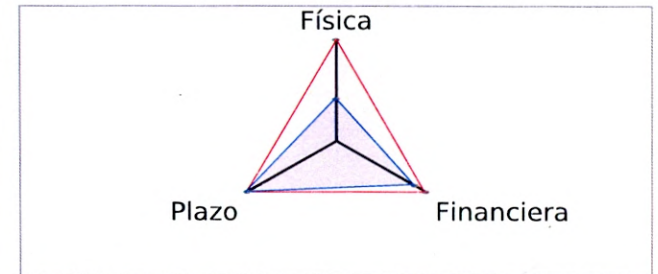

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
<b>Asignación Presupuestaria</b>	11,500,000.00	<b>Desembolso planificado en el</b>	0.00	<b>Desembolsos Acumulados del Año</b>	0	<b>Ejecución Financiera</b>	0.00%
<b>Presupuesto Vigente anual</b>	6,500,000.00	<b>Desembolso realizado en el mes</b>	0.00	<b>Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos</b>	0.00% / 0.00%		
<b>Presupuesto Devengado</b>	1,888,848.41	<b>Diferencia</b>	0.00	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos</b>	37.98% / 100.00%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	29.06%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Mes	<b>Plazo de ejecucion Actual</b>	100.00%		
		<b>Presupuesto planificado próximo</b>	0.00	<b>Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual</b>	0		

## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
<b>Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
<b>Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica</b>									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
<b>Componente: Administración</b>									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	15	0		42	42

## Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>											
<b>Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales</b>											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
<b>Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica</b>											
<b>Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba</b>											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
<b>Administración</b>											
<b>Fortalecimiento Institucional</b>											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018





## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

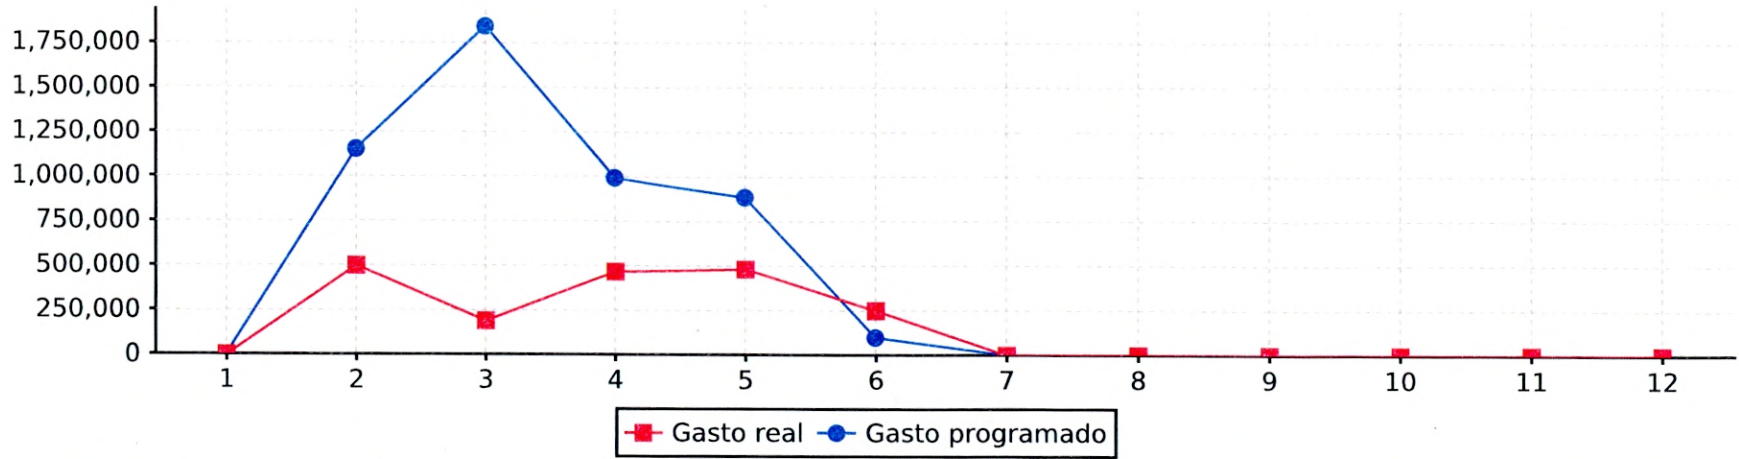

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												1,888,848.41
<b>Total Gasto programado</b>												4,972,618.28





Id	% Completo a fin de año actual	% Fuen	Ident	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Activ Atras	Activ Proxim	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumulad	Costo Real	Anticipo				
0	0%	No 0	82%	No				PEP_SMART_1905_30 6 2018	43	10 2826 días	mié 24/10/07	vie 28/09/18	mié 24/10/07	NOD			\$3,275,782 Fin	\$2,933,309	\$0			3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre
1	100%	...	BID	No 1	100%	No		Componente 1: Acceso a la Justicia	0	0 947 días	lun 06/10/14	mar 26/06/18	lun 06/10/14	mar 26/06/18			\$25,479 Fin	\$25,479	\$0					
2	100%	...	BID	No 1.1	100%	No		P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0	0 131 días	mar 26/12/17	mar 26/06/18	mar 26/12/17	mar 26/06/18			\$24,170 Fin	\$24,170	\$0					
3	100%	...	BID	No 1.1.1	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	0	0 131 días	mar 26/12/17	mar 26/06/18	mar 26/12/17	mar 26/06/18			\$24,170 Fin	\$24,170	\$0					
11	100%	...	BID	No 1.2	100%	No		P4. Comisarias de Policía TIPO construidas (MG)	0	0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15			\$1,309 Fin	\$1,309	\$0					
12	100%	...	BID	No 1.2.1	100%	No		Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarias MINGOB	0	0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15			\$1,309 Fin	\$1,309	\$0					
20	83%	...	BID	No 2	83%	No		Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de información y Gestión Penal Integrado)	0	0 1021 días	mié 24/09/14	vie 28/09/18	mié 24/09/14	NOD			\$684,067 Fin	\$634,548	\$0					
21	83%	...	BID	No 2.1	83%	No		P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	0	0 1021 días	mié 24/09/14	vie 28/09/18	mié 24/09/14	NOD			\$684,067 Fin	\$634,548	\$0					
22	83%	...	BID	No 2.1.1	83%	No		Interconexión en SE	0	0 1021 días	mié 24/09/14	vie 28/09/18	mié 24/09/14	NOD			\$684,067 Fin	\$634,548	\$0					
23	100%	...	BID	No 2.1.1.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015	0	0 69 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15			\$142,498 Fin	\$142,498	\$0					
34	100%	...	BID	No 2.1.1.2	100%	No		Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016	0	0 379 días	jue 01/09/16	mié 28/02/18	jue 01/09/16	mié 28/02/18			\$84,909 Fin	\$84,909	\$0					
45	100%	...	BID	No 2.1.1.3	100%	No		Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEICMSJ	0	0 80 días	lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16			\$1,137 Fin	\$1,137	\$0					
55	100%	...	BID	No 2.1.1.4	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0 49 días	mié 24/09/14	mar 02/12/14	mié 24/09/14	mar 02/12/14			\$7,494 Fin	\$7,494	\$0					
61	100%	...	BID	No 2.1.1.5	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0 294 días	lun 17/11/14	mié 20/01/16	lun 10/11/14	mié 23/12/15			\$78,164 Fin	\$78,164	\$0					
67	100%	...	BID	No 2.1.1.6	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0 238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16			\$114,770 Fin	\$114,770	\$0					
83	100%	...	BID	No 2.1.1.7	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF	0	0 146 días	lun 23/05/16	vie 16/12/16	lun 23/05/16	vie 16/12/16			\$104,369 Fin	\$104,369	\$0					
93	100%	...	BID	No 2.1.1.8	100%	No		Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2015	0	0 27 días	lun 24/11/14	mar 30/12/14	lun 24/11/14	mar 30/12/14			\$2,584 Fin	\$2,584	\$0					
99	100%	...	BID	No 2.1.1.9	100%	No		Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2015	0	0 200 días	lun 08/12/14	mar 22/09/15	lun 08/12/14	mar 22/09/15			\$21,307 Fin	\$21,307	\$0					
105	100%	...	BID	No 2.1.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de Información	0	0 232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$32,715 Fin	\$32,715	\$0					
123	100%	...	BID	No 2.1.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	0	0 167 días	lun 21/08/17	jue 12/04/18	lun 21/08/17	jue 12/04/18			\$23,093 Fin	\$23,093	\$0					
132	100%	...	BID	No 2.1.1.12	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal	0	0 102 días	mar 09/05/17	vie 29/09/17	mar 09/05/17	vie 29/09/17			\$21,479 Fin	\$21,479	\$0					
141	100%	...	BID	No 2.1.1.13	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2018	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$27,230 Fin	\$0	\$0					
142	100%	...	...	No 2.1.1.14	100%	No		Etapas de Adquisición: Contratación	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$0 Fin	\$0	\$0					
143	100%	...	...	No 2.1.1.15	100%	Sí		Etapas de Ejecución de pagos: Entrega	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$27,230 Prorrata	\$0	\$0					
144	100%	...	BID	No 2.1.1.16	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$22,289 Fin	\$0	\$0					
145	100%	...	BID	No 2.1.1.17	100%	No		Etapas de Adquisición: Proceso de Compra	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$0 Fin	\$0	\$0					
146	100%	...	BID	No 2.1.1.18	100%	No		Etapas de Ejecución de pagos: Entrega	0	0 63 días	lun 02/07/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$22,289 Prorrata	\$0	\$0					
147	100%	...	...	No 2.1.1.19	100%	No		Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0 83 días	lun 05/06/17	vie 29/09/17	lun 05/06/17	vie 29/09/17			\$30 Fin	\$30	\$0					
148	100%	...	BID	No 2.1.1.20	100%	No		Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	3	2 827 días	lun 25/05/15	mié 29/08/18	lun 25/05/15	NOD			\$937,628 Fin	\$722,928	\$0					
149	100%	...	BID	No 3	85%	No		P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	0	0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18			\$433,175 Fin	\$433,175	\$0					
150	100%	...	BID	No 3.1.1	100%	No		Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	0	0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18			\$433,175 Fin	\$433,175	\$0					
151	100%	...	BID	No 3.1.1.1	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0	0 119 días	mar 13/10/15	mié 30/03/16	mar 13/10/15	mié 30/03/16			\$97,760 Fin	\$97,760	\$0					
152	100%	...	BID	No 3.1.1.2	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0	0 211 días	lun 28/11/16	jue 28/09/17	lun 28/11/16	jue 28/09/17			\$9,655 Fin	\$9,655	\$0					

Project: PEP\_SMART\_1905\_30 6 2  
Date: jue 05/07/18

División crítica	..... Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split	..... External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◆ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬



Id	% Completo a fin de año actual	% Fuente	Identif. empr.	EDT	% Avanc.	Hito	PMR/PA	Nombre de la Tarea	Activ. Atras	Activ. Próxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo			
																					3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre
310	100%	...	BID	No 4.1.2	100%	No		Pagos Administrativos 2013	0	0 65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13	mié 02/10/...	mar 31/12/13				\$20,995 Fin	\$20,995	\$0			
311	...	...	BID	No 4.1.3	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehículos (Camionetas) 2015	0	0 75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15	jue 16/04/15	jue 30/07/15				\$66,393 Fin	\$66,393	\$0			
318	...	...	BID	No 4.1.4	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehículos (5 Pick Up) 2016	0	0 141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17	lun 29/08/16	mié 22/03/17				\$147,041 Fin	\$147,041	\$0			
328	...	...	BID	No 4.1.5	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0 0160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14	jue 02/01/14	mié 13/08/14				\$1,804 Fin	\$1,804	\$0			
333	...	...	BID	No 4.1.6	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0 0161 días	vie 02/01/15	lun 24/08/15	vie 02/01/15	lun 24/08/15				\$1,935 Fin	\$1,935	\$0			
338	...	...	BID	No 4.1.7	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0 0220 días	mié 17/02/16	jue 22/12/16	mié 17/02/...	jue 22/12/16				\$9,290 Fin	\$9,290	\$0			
349	...	...	BID	No 4.1.8	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0 084 días	jue 02/02/17	mié 31/05/17	jue 02/02/17	mié 31/05/17				\$3,758 Fin	\$3,758	\$0			
356	...	...	BID	No 4.1.9	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0 0260 días	jue 02/01/14	mié 31/12/14	jue 02/01/14	mié 31/12/14				\$8,941 Fin	\$8,941	\$0			
361	...	...	BID	No 4.1.10	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0 252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16				\$8,393 Fin	\$8,393	\$0			
366	...	...	BID	No 4.1.11	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0 0248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16				\$7,756 Fin	\$7,756	\$0			
378	...	...	BID	No 4.1.12	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0 0192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17				\$8,415 Fin	\$8,415	\$0			
392	...	...	BID	No 4.1.13	64%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	0	0 1171 días	mié 31/01/18	vie 28/09/18	mié 31/01/...	NOD				\$7,060 Fin	\$4,540	\$0			
393	...	...	...	No 4.1.13	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 08 días	mié 31/01/18	vie 09/02/18	mié 31/01/...	vie 09/02/18				\$0 Fin	\$0	\$0			
395	...	...	BID	No 4.1.13	60%	No		Etapas de Ejecución de pagos:	0	0 1162 días	lun 12/02/18	vie 28/09/18	lun 12/02/18	NOD				\$7,060 Fin	\$4,540	\$0			
396	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Enero 2018	0	0 013 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18				\$0 Fin	\$0	\$0			
397	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Febrero 2018	0	0 013 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18				\$0 Fin	\$0	\$0			
398	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Marzo 2018	0	0 03 días	mar 17/04/18	jue 19/04/18	mar 17/04/...	jue 19/04/18				\$2,521 Fin	\$2,521	\$0			
399	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Abril 2018	0	0 04 días	mar 24/04/18	vie 27/04/18	mar 24/04/...	vie 27/04/18				\$803 Fin	\$803	\$0			
400	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Mayo 2018	0	0 06 días	jue 17/05/18	jue 24/05/18	jue 17/05/18	jue 24/05/18				\$797 Fin	\$797	\$0			
401	100%	...	BID	No 4.1.13	100%	No		Junio 2018	0	0 06 días	jue 07/06/18	jue 14/06/18	jue 07/06/18	jue 14/06/18				\$420 Fin	\$420	\$0			
402	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	No		Julio 2018	0	0 110 días	mar 17/07/18	mar 31/07/18	NOD	NOD				\$840 Fin	\$0	\$0			
403	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	No		Agosto 2018	0	0 010 días	lun 20/08/18	vie 31/08/18	NOD	NOD				\$840 Fin	\$0	\$0			
404	100%	...	BID	No 4.1.13	0%	No		Septiembre 2018	0	0 010 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18	NOD	NOD				\$840 Fin	\$0	\$0			
405	...	...	BID	No 4.1.14	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2014	0	0 0239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	jue 02/01/14	mar 02/12/14				\$12,347 Fin	\$12,347	\$0			
410	...	...	BID	No 4.1.15	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0 020 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15				\$6,244 Fin	\$6,244	\$0			
415	...	...	BID	No 4.1.16	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0 0213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16				\$33,135 Fin	\$33,135	\$0			
426	...	...	BID	No 4.1.17	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0 0221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17				\$38,194 Fin	\$38,194	\$0			
440	...	...	BID	No 4.1.18	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0 0220 días	jue 02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14				\$4,241 Fin	\$4,241	\$0			
445	...	...	BID	No 4.1.19	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 0222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15				\$2,021 Fin	\$2,021	\$0			
450	...	...	BID	No 4.1.20	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 0226 días	mar 02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16				\$19,651 Fin	\$19,651	\$0			
463	...	...	BID	No 4.1.21	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 0201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17				\$16,591 Fin	\$16,591	\$0			
474	...	...	BID	No 4.1.22	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2014	0	0 0111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15				\$13,703 Fin	\$13,703	\$0			
486	...	...	BID	No 4.1.23	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2015	0	0 0164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17				\$24,325 Fin	\$24,325	\$0			
499	...	...	BID	No 4.1.24	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2016	0	0 0177 días	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17				\$51,789 Fin	\$51,789	\$0			
507	...	...	BID	No 4.1.25	63%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2017	0	0 1260 días	lun 28/08/17	vie 31/08/18	lun 28/08/17	NOD				\$58,720 Fin	\$23,441	\$0			
508	...	...	...	No 4.1.25	100%	No		Etapas de Adquisición:	0	0 063 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17				\$0 Fin	\$0	\$0			
515	...	...	BID	No 4.1.25	15%	No		Etapas de Ejecución de pagos:	0	0 113 días	vie 23/03/18	vie 31/08/18	vie 23/03/18	NOD				\$58,720 Fin	\$23,441	\$0			
516	100%	...	BID	No 4.1.25	100%	No		Primer Producto 20% del valor del contrato	0	0 02 días	vie 23/03/18	lun 26/03/18	vie 23/03/18	lun 26/03/18	514FC+			\$11,760 Fin	\$11,760	\$0			

Project: PEP\_SMART\_1905\_30 6 2  
Date: jue 05/07/18

Division crítica	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margen de demora
Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas críticas
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

Page 3





id	% Completo a fin de año actual	% de avance	Fuente	Identificación	EDT	% Avance	Hito	PMR/PI	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo	3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre
986	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Febrero 2018	0	0 4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/...	vie 23/02/18	985		\$2,714	Fin	\$2,714	\$0			
987	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Marzo 2018	0	0 5 días	lun 19/03/18	vie 23/03/18	lun 19/03/18	vie 23/03/18	986		\$2,703	Fin	\$2,703	\$0			
988	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Abril 2018	0	0 5 días	lun 23/04/18	vie 27/04/18	lun 23/04/18	vie 27/04/18	987		\$2,703	Fin	\$2,703	\$0			
989	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Mayo 2018	0	0 8 días	mié 16/05/18	vie 25/05/18	mié 16/05/...	vie 25/05/18	988		\$2,677	Fin	\$2,677	\$0			
990	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	100%	No		Junio 2018	0	0 7 días	mié 06/06/18	jue 14/06/18	mié 06/06/...	jue 14/06/18	989		\$2,673	Fin	\$2,673	\$0			
991	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	0%	No		Julio 2018	0	0 1 10 días	lun 16/07/18	lun 30/07/18	NOD	NOD			\$2,725	Fin	\$0	\$0			
992	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	0%	No		Agosto 2018	0	0 15 días	lun 13/08/18	vie 31/08/18	NOD	NOD			\$2,725	Fin	\$0	\$0			
993	100%	100%	...	BID	No 4.1.62	0%	No		Septiembre 2018	0	0 10 días	lun 17/09/18	vie 28/09/18	NOD	NOD			\$2,725	Fin	\$0	\$0			
994	100%	100%	...	BID	No 4.1.63	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ	0	0 5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17			\$0	Fin	\$0	\$0			
1004	100%	100%	...	BID	No 4.1.64	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicos a Defensores Públicos	0	0 117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17			\$7,653	Fin	\$7,653	\$0			
1014	100%	100%	...	BID	No 4.1.65	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas	0	0 20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17			\$954	Fin	\$954	\$0			
1021	100%	100%	...	BID	No 4.1.66	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	0	0 197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15			\$31,281	Fin	\$31,281	\$0			
1029	100%	100%	...	BID	No 4.1.67	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	0	0 58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15			\$1,311	Fin	\$1,311	\$0			
1036	100%	100%	...	BID	No 4.1.68	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	0 41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16			\$5,195	Fin	\$5,195	\$0			
1043	100%	100%	...	BID	No 4.1.69	100%	No		Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0 126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16			\$28,536	Fin	\$28,536	\$0			
1053	100%	100%	...	BID	No 4.1.70	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0 169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16			\$5,930	Fin	\$5,930	\$0			
1064	100%	100%	...	BID	No 4.1.71	100%	No		Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en	0	0 63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16			\$7,930	Fin	\$7,930	\$0			
1074	100%	100%	...	BID	No 4.1.72	100%	No		Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de	0	0 45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16			\$8,011	Fin	\$8,011	\$0			
1083	100%	100%	...	BID	No 4.1.73	100%	No		Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	0 83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16			\$24,832	Fin	\$24,832	\$0			
1093	100%	100%	...	BID	No 4.1.74	100%	No		Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0 139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16			\$25,385	Fin	\$25,385	\$0			
1103	100%	100%	...	BID	No 4.1.75	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0 199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17			\$20,930	Fin	\$20,930	\$0			
1112	100%	100%	...	BID	No 4.1.76	100%	No		Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0 201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17			\$41,594	Fin	\$41,594	\$0			
1121	100%	100%	...	BID	No 4.1.77	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	0 120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18			\$25,410	Fin	\$25,410	\$0			
1130	100%	100%	...	BID	No 4.1.78	100%	No		Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0 132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17			\$28,541	Fin	\$28,541	\$0			
1138	100%	100%	...	BID	No 4.1.79	100%	No		Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	0 89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15			\$15,666	Fin	\$15,666	\$0			
1146	100%	100%	...	BID	No 4.1.80	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0 80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15			\$1,130	Fin	\$1,130	\$0			
1151	100%	100%	...	BID	No 4.1.81	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0 230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16			\$1,501	Fin	\$1,501	\$0			
1157	100%	100%	...	BID	No 4.1.82	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0 128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17			\$1,460	Fin	\$1,460	\$0			

Project: PEP\_SMART\_1905\_30 6 2  
Date: jue 05/07/18

Division crítica	..... Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split	..... External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Id	% Completo a fin de año actual	% Fuentefinanciamiento	Identificación del contrato	EDT	% Avance	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo	Trimestres		
																					3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre
1163	100%	BID	No 4.1.83	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14			\$1,800 Fin	\$1,800	\$0				
1168	100%	BID	No 4.1.84	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15			\$8,543 Fin	\$8,543	\$0				
1173	100%	BID	No 4.1.85	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17			\$13,742 Fin	\$13,742	\$0				
1182	100%	BID	No 4.1.86	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17			\$1,147 Fin	\$1,147	\$0				
1191	100%	BID	No 4.1.87	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0	53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18			\$266 Fin	\$266	\$0				
1200	100%	BID	No 4.1.88	100%	No		Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	0	0	28 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18			\$803 Fin	\$803	\$0				
1209	100%	BID	No 4.1.89	100%	No		Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	0	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18			\$453 Fin	\$453	\$0				
1216	100%	BID	No 4.1.90	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15			\$2,306 Fin	\$2,306	\$0				
1221	100%	BID	No 4.1.91	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16			\$1,961 Fin	\$1,961	\$0				
1226	100%	BID	No 4.1.92	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick U	0	0	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17			\$4,975 Fin	\$4,975	\$0				
1231	100%	BID	No 4.1.93	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17			\$1,808 Fin	\$1,808	\$0				
1236	100%	BID	No 4.1.94	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2015	0	0	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15			\$681 Fin	\$681	\$0				
1241	100%	BID	No 4.1.95	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2016	0	0	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16			\$1,236 Fin	\$1,236	\$0				
1248	100%	BID	No 4.1.96	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2017	0	0	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17			\$1,084 Fin	\$1,084	\$0				
1256	100%	BID	No 4.1.97	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2018	0	0	19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18			\$593 Fin	\$593	\$0				
1262	100%	BID	No 4.1.98	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	0	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15			\$3,731 Fin	\$3,731	\$0				
1267	100%	BID	No 4.1.99	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	0	24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16			\$305 Fin	\$305	\$0				
1272	100%	BID	No 4.1.100	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	0	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17			\$1,777 Fin	\$1,777	\$0				
1277	100%	BID	No 4.1.101	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	0	0	273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14			\$4,121 Fin	\$4,121	\$0				
1282	100%	BID	No 4.1.102	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	0	0	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15			\$5,084 Fin	\$5,084	\$0				
1287	100%	BID	No 4.1.103	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	0	0	190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17			\$3,914 Fin	\$3,914	\$0				
1296	100%	BID	No 4.1.104	100%	No		Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	0	0	26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18			\$2,018 Fin	\$2,018	\$0				
1301	100%	BID	No 4.1.105	100%	No		Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	0	0	29 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18			\$4,841 Fin	\$4,841	\$0				
1306	100%	BID	No 4.1.106	100%	No		Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	0	0	28 días	jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18			\$546 Fin	\$546	\$0				
1311	100%	BID	No 4.1.107	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría	0	0	29 días	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18			\$1,337 Fin	\$1,337	\$0				
1318	100%	BID	No 4.1.108	100%	No		Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0	58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17			\$3,845 Fin	\$3,845	\$0				
1324	100%	BID	No 4.1.109	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer	0	0	38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17			\$1,968 Fin	\$1,968	\$0				
1329	100%	BID	No 4.1.110	100%	No		Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	0	0	41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15			\$13,734 Fin	\$13,734	\$0				
1337	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de 02 camionetas para la Coordinación de la UE de la PNC	0	0	26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18			\$2,018 Fin	\$2,018	\$0				
1344	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16			\$32,055 Fin	\$32,055	\$0				
1353	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15			\$5,262 Fin	\$5,262	\$0				
1360	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17			\$11,052 Fin	\$11,052	\$0				
1368	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	0	0	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16			\$2,480 Fin	\$2,480	\$0				
1369	100%	BID	No 4.1.111	100%	No		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16			\$1,704 Fin	\$1,704	\$0				

Project: PEP\_SMART\_1905\_30 6 2  
Date: jue 05/07/18

Division critica	..... Summary	☐ Inactive Task	Duration-only	☐ Finish-only	☐ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	☐ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	☐ Deadline	☐ Retrasada
Split	..... External Tasks	☐ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	☐ Tareas criticas
Milestone	◆ External Milestone	☐ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	☐



Id	% Completa a fin de año actual	% Fuen	Ident empr	EDT	% Avanc	Hito	PMR/PI	Nombre de la Tarea	Activ Atras	Activ Proxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Anticipo					
																					3er trimestre	4º trimestre	1er trimestre		
1370	100%	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15				\$10	Fin	\$10	\$0			
1371	100%	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16				\$70	Fin	\$70	\$0			
1372	100%	...	BID	No 4.1.11:	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17				\$80	Fin	\$80	\$0			
1373	100%	...	BID	No 4.1.12:	0%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	0	0	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18		NOD			\$20	Fin	\$20	\$0			
1374	100%	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15				\$336	Fin	\$336	\$0			
1375	100%	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16				\$858	Fin	\$858	\$0			
1376	100%	...	BID	No 4.1.12:	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17				\$825	Fin	\$825	\$0			
1377	100%	...	BID	No 4.1.12:	0%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2018	0	0	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/...		NOD			\$547	Fin	\$547	\$0			
1378	...	...	...	No 5	2%	No		Clausulas	4	0	2655 días	mié 24/10/07	mar 30/01/18	mié 24/10/...		NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			
1392	100%	...	...	No 6	3%	No		Plan de Preparación de Cierre	18	0	145 días	mié 22/11/17	mié 13/06/18	mié 22/11/...		NOD			\$0	Fin	\$0	\$0			
1424	100%	...	...	No 7	0%	No		Fase de Cierre	17	0	34 días	lun 30/04/18	vie 15/06/18		NOD				\$0	Fin	\$0	\$0			
1450	100%	...	...	No 8	0%	Sí		Fin del Programa	1	0	1 día	jue 14/06/18	jue 14/06/18		NOD				\$0	Fin	\$0	\$0			

Project: PEP\_SMART\_1905\_30 6 2  
Date: jue 05/07/18

División crítica	..... Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split	..... External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬


## Observaciones / Desafíos

En los Datos Generales del Avance del mes de junio / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.

## Alertivos:



Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

9/7/2018 - 8:34 AM
