

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Marzo / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/04/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,718,546.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,718,546.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	20,117,240.40	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	103.87%	Monto por desembolsar USD\$ -105,336.23 -3.87%

Gráfica de Ejecución

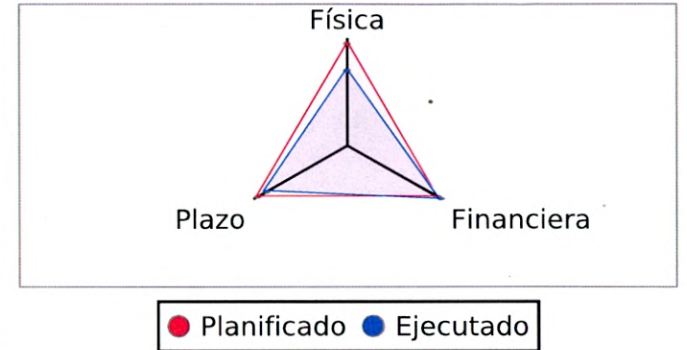

Tipo de cambio: 7.4 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Marzo		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	10,900,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	688,102.07	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	60.24% / 60.24%		
Porcentaje de Ejecución	6.31%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0		0		2	
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1		0		0		1	
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2		0		2	
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	19	12		0		42	19

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017		12/01/2018	
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

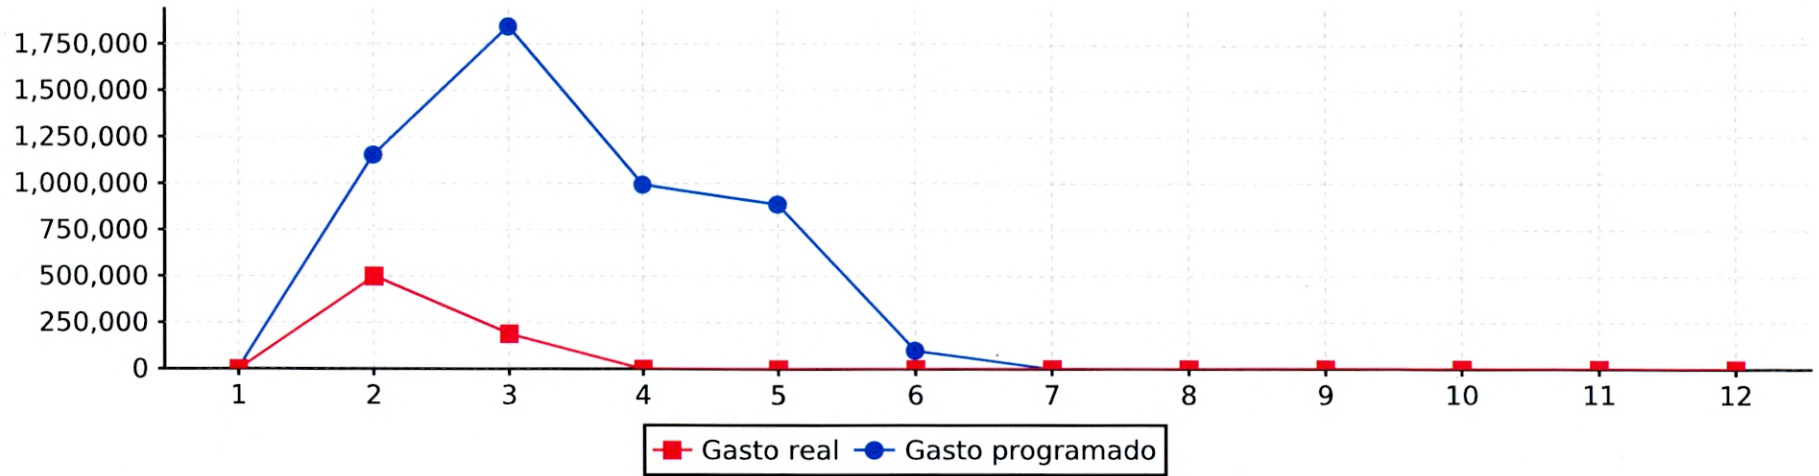

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												688,102.07
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo			
0	93%	No	PEP_SMART_1905,0	5	16	mié 24/10/07	1202 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18	mié 02/10/13		NOD	\$3,170,676 Fin		\$2,497,031	\$0	4º trimestre	1er trimestre	2º trim
1	77%	No	Componente 1: Acceso a la Justicia	0	0	mié 24/10/07	926 días	lun 06/10/14	lun 28/05/18	lun 06/10/14		NOD	\$26,309 Fin		\$1,309	\$0			
2	33%	No	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0	0	mar 03/11/07	110 días	mar 26/12/17	lun 28/05/18	mar 26/12/17		NOD	\$25,000 Fin		\$0	\$0			
3	33%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	0	0	lun 05/06/17	110 días	mar 26/12/17	lun 28/05/18	mar 26/12/17		NOD	\$25,000 Fin		\$0	\$0			
4	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0	lun 05/06/17	10 días	mar 26/12/17	lun 08/01/18	mar 26/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0	\$0			
8	0%	No	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	mié 30/08/17	20 días	lun 30/04/18	lun 28/05/18			NOD	\$25,000 Fin		\$0	\$0			
9	0%	No	Pago Producto #1	0	0	mié 30/08/17	10 días	lun 30/04/18	lun 14/05/18			NOD	\$5,000 Fin		\$0	\$0			
10	0%	No	Pago Producto #2	0	0	mié 30/08/17	10 días	mar 15/05/18	lun 28/05/18			NOD	\$20,000 Fin		\$0	\$0			
11	100%	No	P4. Comisarias de Policía TIPO construidas (MG)	0	0	mié 24/10/07	126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309	\$0			
12	100%	No	Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarias MINGOB	0	0	lun 06/10/14	126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309	\$0			
20	98%	No	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	0	1		NOD 914 días	mié 24/09/14	vie 27/04/18	mié 24/09/14		NOD	\$634,547 Fin		\$625,320	\$0			
21	98%	No	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	0	1		NOD 914 días	mié 24/09/14	vie 27/04/18	mié 24/09/14		NOD	\$634,547 Fin		\$625,320	\$0			
22	98%	No	Interconexión en Secretaría e INACIF	0	1	mié 24/09/14	914 días	mié 24/09/14	vie 27/04/18	mié 24/09/14		NOD	\$634,547 Fin		\$625,320	\$0			
23	100%	No	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015	0	0	vie 21/08/15	69 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15		\$142,498 Fin		\$142,498	\$0			
34	100%	No	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016	0	0	lun 29/02/16	379 días	jue 01/09/16	mié 28/02/18	jue 01/09/16	mié 28/02/18		\$84,909 Fin		\$84,909	\$0			
45	100%	No	Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEICMSJ	0	0		NOD 80 días	lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16		\$1,137 Fin		\$1,137	\$0			
55	100%	No	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0	mié 24/09/14	49 días	mié 24/09/14	mar 02/12/14	mié 24/09/14	mar 02/12/14		\$7,494 Fin		\$7,494	\$0			
61	100%	No	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0	lun 17/11/14	294 días	lun 17/11/14	mié 20/03/16	lun 10/11/14	mié 23/12/15		\$78,164 Fin		\$78,164	\$0			
67	100%	No	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0	0	lun 18/01/16	238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16		\$114,770 Fin		\$114,770	\$0			
83	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF	0	0	lun 23/05/16	146 días	lun 23/05/16	vie 16/12/16	lun 23/05/16	vie 16/12/16		\$104,369 Fin		\$104,369	\$0			
93	100%	No	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2016	0	0	lun 24/11/14	27 días	lun 24/11/14	mar 30/12/14	lun 24/11/14	mar 30/12/14		\$2,584 Fin		\$2,584	\$0			
99	100%	No	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2016	0	0	lun 08/12/14	200 días	lun 08/12/14	mar 22/09/15	lun 08/12/14	mar 22/09/15		\$21,307 Fin		\$21,307	\$0			
105	100%	No	Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de	0	0	lun 14/11/16	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$32,715 Fin		\$32,715	\$0			
123	76%	No	Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	0	1	lun 14/11/16	178 días	lun 21/08/17	vie 27/04/18	lun 21/08/17		NOD	\$23,092 Fin		\$13,865	\$0			
124	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0	lun 14/11/16	28 días	lun 21/08/17	jue 28/09/17	lun 21/08/17	jue 28/09/17		\$0 Fin		\$0	\$0			
128	63%	No	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	vie 03/02/17	125 días	lun 06/11/17	vie 27/04/18	lun 06/11/17		NOD	\$23,092 Fin		\$13,865	\$0			
129	0%	No	Ejecucion 23092	0	1	vie 03/02/17	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18			NOD	\$9,227 Fin		\$0	\$0			
130	100%	No	Pago Noviembre 2017	0	0	vie 03/02/17	15 días	lun 06/11/17	vie 24/11/17	lun 06/11/17	vie 24/11/17	127FC+	\$4,619 Fin		\$4,619	\$0			
131	100%	No	Pago Diciembre 2017	0	0	vie 03/02/17	19 días	vie 01/12/17	jue 28/12/17	vie 01/12/17	jue 28/12/17	127FC+	\$9,245 Fin		\$9,245	\$0			
132	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal	0	0	jue 09/02/17	102 días	mar 09/05/17	vie 29/09/17	mar 09/05/17	vie 29/09/17		\$21,479 Fin		\$21,479	\$0			
141	100%	No	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0		NOD 83 días	lun 05/06/17	vie 29/09/17	lun 05/06/17	vie 29/09/17		\$30 Fin		\$30	\$0			
142	91%	No	Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	2	4	lun 25/05/15	773 días	lun 25/05/15	mar 12/06/18	lun 25/05/15		NOD	\$891,428 Fin		\$432,155	\$0			
143	93%	No	P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	0	2	lun 05/10/15	653 días	lun 05/10/15	vie 27/04/18	lun 05/10/15		NOD	\$433,185 Fin		\$416,662	\$0			
144	93%	No	Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	0	2	lun 05/10/15	653 días	lun 05/10/15	vie 27/04/18	lun 05/10/15		NOD	\$433,185 Fin		\$416,662	\$0			
145	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0	0	mar 13/10/15	119 días	mar 13/10/15	mié 30/03/16	mar 13/10/15	mié 30/03/16		\$97,760 Fin		\$97,760	\$0			
153	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0	0	lun 28/11/16	211 días	lun 28/11/16	jue 28/09/17	lun 28/11/16	jue 28/09/17		\$9,655 Fin		\$9,655	\$0			
163	100%	No	Proceso de Adquisición: Vehículos	0	0	lun 05/10/15	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15		\$50,046 Fin		\$50,046	\$0			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: jue 09/04/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬇ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Page 1

Id	% Avanc	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo			
172	100%	No		Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector	0	0	mié 10/08/16	350 días	mié 10/08/16	28/12/17	10/08/16	mié 10/08/16	28/12/17			\$192,996 Fin	\$192,996	\$0			
190	66%	No		Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento abreviado	0	1	jue 05/01/17	149 días	lun 02/10/17	27/04/18	02/10/17	02/10/17	NOD			\$45,997 Fin	\$33,544	\$0			
191	100%	No		Etapa de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	6 días	lun 02/10/17	09/10/17	02/10/17	09/10/17				\$0 Fin	\$0	\$0			
195	62%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	125 días	lun 06/11/17	27/04/18	06/11/17	06/11/17	NOD			\$45,997 Fin	\$33,544	\$0			
196	0%	No		Ejecución del Contrato 45997	0	1	jue 23/02/17	20 días	lun 02/04/18	27/04/18	02/04/18		NOD			\$12,453 Fin	\$0	\$0			
197	100%	No		Pago Noviembre 2017	0	0	jue 23/02/17	15 días	lun 06/11/17	24/11/17	06/11/17	24/11/17	194			\$20,710 Fin	\$20,710	\$0			
198	100%	No		Pago Diciembre 2017	0	0	jue 23/02/17	17 días	lun 04/12/17	27/12/17	04/12/17	27/12/17	194			\$12,834 Fin	\$12,834	\$0			
199	66%	No		Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado	0	1	jue 05/01/17	149 días	lun 02/10/17	27/04/18	02/10/17	02/10/17	NOD			\$36,691 Fin	\$32,621	\$0			
200	100%	No		Etapa de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	6 días	lun 02/10/17	09/10/17	02/10/17	09/10/17				\$0 Fin	\$0	\$0			
204	62%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	125 días	lun 06/11/17	27/04/18	06/11/17	06/11/17	NOD			\$36,691 Fin	\$32,621	\$0			
205	0%	No		Ejecución del Contrato 36682	0	1	jue 23/02/17	20 días	lun 02/04/18	27/04/18	02/04/18		NOD			\$4,070 Fin	\$0	\$0			
206	100%	No		Pago Noviembre 2017	0	0	jue 23/02/17	15 días	lun 06/11/17	24/11/17	06/11/17	24/11/17	203			\$16,518 Fin	\$16,518	\$0			
207	100%	No		Pago Diciembre 2017	0	0	jue 23/02/17	17 días	lun 04/12/17	27/12/17	04/12/17	27/12/17	203			\$16,103 Fin	\$16,103	\$0			
208	100%	No		Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0	NOD	84 días	jue 31/08/17	29/12/17	31/08/17	29/12/17				\$40 Fin	\$40	\$0			
209	92%	No		P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la Capacitación de los funcionarios en INACIF (SE)	2	1	lun 25/05/15	773 días	lun 25/05/15	12/06/18	25/05/15	05/15	NOD			\$274,243 Fin	\$15,493	\$0			
210	92%	No		Proceso de Contratación: Gastos de Viáticos John Jay College	2	1	lun 25/05/15	773 días	lun 25/05/15	12/06/18	25/05/15	05/15	NOD			\$274,243 Fin	\$15,493	\$0			
211	100%	No		Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación	0	0	jue 24/06/16	25 días	jue 24/06/16	29/07/16	24/06/16	29/07/16				\$13,582 Fin	\$13,582	\$0			
217	100%	No		Análisis de consultora	0	0	lun 20/06/16	29 días	lun 20/06/16	29/07/16	20/06/16	29/07/16				\$1,667 Fin	\$1,667	\$0			
226	100%	No		Proceso de Contratación: Formulario de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo	0	0	lun 25/05/15	17 días	lun 25/05/15	16/06/15	25/05/15	16/06/15				\$0 Fin	\$0	\$0			
227	87%	No		Proceso de Contratación: Formulario de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo	2	1	lun 11/01/16	620 días	lun 11/01/16	12/06/18	11/01/16	12/06/18	NOD			\$258,750 Fin	\$0	\$0			
228	97%	No		Etapa de Adquisición:	2	0	lun 11/01/16	577 días	lun 11/01/16	11/04/18	11/01/16	01/16	NOD			\$0 Fin	\$0	\$0			
229	100%	No		Modelo de Gestión	0	0	lun 11/01/16	187 días	lun 11/01/16	28/09/16	11/01/16	28/09/16				\$0 Fin	\$0	\$0			
230	100%	No		Preparación de TDR's	0	0	NOD	10 días	mié 09/11/16	22/11/16	09/11/16	22/11/16				\$0 Fin	\$0	\$0			
231	100%	No		Solicitud de No Objeción	0	0	NOD	5 días	mié 23/11/16	29/11/16	23/11/16	29/11/16	230			\$0 Fin	\$0	\$0			
232	100%	Si		No Objeción	0	0	NOD	6 días	mié 30/11/16	07/12/16	30/11/16	07/12/16	231			\$0 Fin	\$0	\$0			
233	100%	Si	A	Publicación Expresión de Interés	0	0	NOD	11 días	mié 18/01/17	01/02/17	18/01/17	01/02/17	232			\$0 Fin	\$0	\$0			
234	100%	No		Evaluación de Expresiones de Interés	0	0	NOD	8 días	jue 13/02/17	22/02/17	13/02/17	22/02/17	233			\$0 Fin	\$0	\$0			
235	100%	Si		No Objeción Expresión de Interés	0	0	NOD	40 días	jue 23/02/17	20/04/17	23/02/17	20/04/17	234			\$0 Fin	\$0	\$0			
236	100%	No		Preparación y envío de SP	0	0	NOD	25 días	mar 02/05/17	05/06/17	02/05/17	05/06/17	235			\$0 Fin	\$0	\$0			
237	100%	Si		No Objeción a SP	0	0	NOD	5 días	mié 05/07/17	11/07/17	05/07/17	11/07/17	236			\$0 Fin	\$0	\$0			
238	100%	Si		Invitación	0	0	NOD	12 días	mar 11/07/17	04/08/17	11/07/17	04/08/17	237FC+			\$0 Fin	\$0	\$0			
239	100%	No		Evaluación de Propuesta Técnica	0	0	NOD	28 días	lun 07/08/17	mié 13/09/17	07/08/17	13/09/17	238			\$0 Fin	\$0	\$0			
240	100%	Si		Objeción Propuesta Técnica	0	0	NOD	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	27/11/17	01/12/17	239			\$0 Fin	\$0	\$0			
241	100%	No		Revisión de observaciones	0	0	NOD	1 día	mar 05/12/17	mar 05/12/17	05/12/17	05/12/17	240			\$0 Fin	\$0	\$0			
242	100%	Si		No Objeción a Propuesta Técnica	0	0	NOD	8 días	jue 22/02/18	lun 05/03/18	22/02/18	05/03/18	241			\$0 Fin	\$0	\$0			
243	100%	No		Fase de Negociación	0	0	NOD	17 días	lun 05/03/18	mié 28/03/18	05/03/18	28/03/18	242			\$0 Fin	\$0	\$0			
244	0%	Si		No Objeción Fase de Negociación	1	0	NOD	5 días	mié 28/03/18	mié 04/04/18	28/03/18	04/04/18	243			\$0 Fin	\$0	\$0			
245	0%	Si	F	Adjudicación y contratación	1	0	NOD	5 días	jue 05/04/18	mié 11/04/18	05/04/18	11/04/18	244			\$0 Fin	\$0	\$0			
246	0%	No		Etapa de Ejecución de Pago:	0	1	lun 20/03/17	43 días	jue 12/04/18	mar 12/06/18	20/03/17	12/06/18				\$258,750 Fin	\$0	\$0			
247	0%	No		Pago del Primer Producto 20% del valor del contrato	0	1	lun 20/03/17	10 días	jue 12/04/18	mié 25/04/18	20/03/17	25/04/18				\$51,750 Fin	\$0	\$0			
248	0%	No		Pago del Segundo Producto 25% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	20 días	jue 26/04/18	jue 24/05/18	20/03/17	24/05/18				\$64,688 Fin	\$0	\$0			
249	0%	No		Pago del Tercer Producto 45% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	10 días	vie 25/05/18	jue 07/06/18	20/03/17	07/06/18				\$116,438 Fin	\$0	\$0			
250	0%	No		Pago del Cuarto Producto 10% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	3 días	vie 08/06/18	mar 12/06/18	20/03/17	12/06/18				\$25,875 Fin	\$0	\$0			
251	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	vie 01/04/16	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	01/04/16	14/12/16				\$245 Prorrata	\$245	\$0			
252	86%	No		P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba	0	1	lun 06/06/16	513 días	lun 06/06/16	mar 12/06/18	06/06/16	12/06/18	NOD			\$184,000 Fin	\$0	\$0			

Project: PEP_SMART_1905_0
Date: jue 05/04/18

División crítica: Summary
 Task: Project Summary
 Split: External Tasks
 Milestone: External Milestone

Inactive Task: []
 Inactive Milestone: []
 Inactive Summary: []
 Manual Task: []

Duration-only: []
 Manual Summary Rollup: []
 Manual Summary: []
 Start-only: []

Finish-only: []
 Deadline: []
 Progress: []
 Progreso manual: []

Margen de demora: []
 Retrasada: []
 Tareas críticas: []

Page 2

Id	% Avanc	Hito	PMR/PJ	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo			
253	100%	No		Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	0	0	0	lun 06/06/16	371 días	lun 06/06/16	jue 23/11/17	lun 06/06/16	jue 23/11/17			\$0	Fin	\$0	\$0	
274	66%	No		Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	0	1	lun 06/06/16	151 días	lun 13/11/17	mar 12/06/18	lun 13/11/17		NOD		\$184,000	Fin	\$0	\$0		
275	100%	No		Etapa de Adquisición:	0	0	0	lun 06/06/16	101 días	lun 13/11/17	lun 02/04/18	lun 13/11/17	lun 02/04/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
276	100%	No		Elaboración de TdR's y SP	0	0	0	NOD	8 días	lun 13/11/17	mié 22/11/17	lun 13/11/17	mié 22/11/17			\$0	Fin	\$0	\$0	
277	100%	Si		No Objeción Tdr's y SP	0	0	0	NOD	38 días	jue 23/11/17	mar 16/01/18	jue 23/11/17	mar 16/01/18	276		\$0	Fin	\$0	\$0	
278	100%	Si	AE	Invitación a Firma	0	0	0	NOD	8 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18	mar 16/01/18	vie 26/01/18	277		\$0	Fin	\$0	\$0	
279	100%	No		Evaluación de Propuesta Técnica y Económica	0	0	0	NOD	14 días	lun 05/02/18	mié 21/02/18	lun 05/02/18	mié 21/02/18	278		\$0	Fin	\$0	\$0	
280	100%	Si		No Objeción a Propuesta Técnica y Económica	0	0	0	NOD	8 días	jue 22/02/18	lun 05/03/18	jue 22/02/18	lun 05/03/18	279		\$0	Fin	\$0	\$0	
281	100%	Si	F	Adjudicación y Contratación	0	0	0	NOD	20 días	lun 05/03/18	lun 02/04/18	lun 05/03/18	lun 02/04/18	280		\$0	Fin	\$0	\$0	
282	0%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	0	1	vie 27/01/17	50 días	mar 03/04/18	mar 12/06/18			NOD		\$184,000	Fin	\$0	\$0		
283	0%	No		Pago de Primer Producto 20% del valor del contrato	0	1	vie 27/01/17	20 días	mar 03/04/18	lun 30/04/18			NOD	281		\$36,800	Fin	\$0	\$0	
284	0%	No		Pago del Segundo Producto 60% del valor del contrato	0	0	vie 27/01/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18			NOD	283		\$110,400	Fin	\$0	\$0	
285	0%	No		Pago del Tercer Producto 20% del valor del contrato	0	0	vie 27/01/17	8 días	vie 01/06/18	mar 12/06/18			NOD	284		\$36,800	Fin	\$0	\$0	
286	93%	No		Administración	3	11	lun 10/06/13	1202 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18	mié 02/10/13		NOD		\$1,618,393	Fin	\$1,438,247	\$0	\$0	
287	93%	No		Gastos indirectos e imprevistos (SE)	3	11	mié 02/10/13	1202 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18	mié 02/10/13		NOD		\$1,618,393	Fin	\$1,438,247	\$0	\$0	
288	100%	No		Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB	0	0	0	jue 11/12/14	15 días	jue 11/12/14	mié 31/12/14	jue 11/12/14	mié 31/12/14	17		\$1,974	Fin	\$1,974	\$0	\$0
289	100%	No		Pagos Administrativos 2013	0	0	0	mié 02/10/13	65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13	mié 02/10/13	mar 31/12/13			\$20,995	Fin	\$20,995	\$0	\$0
290	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehículos (Camionetas) 2015	0	0	0	jue 16/04/15	75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15	jue 16/04/15	jue 30/07/15			\$66,393	Fin	\$66,393	\$0	\$0
297	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehículos (5 Pick Up) 2016	0	0	0	lun 29/08/16	141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17	lun 29/08/16	mié 22/03/17			\$147,041	Fin	\$147,041	\$0	\$0
307	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0	0	jue 02/01/14	160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14	jue 02/01/14	mié 13/08/14			\$1,804	Fin	\$1,804	\$0	\$0
312	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0	0	vie 02/01/15	161 días	vie 02/01/15	lun 24/08/15	vie 02/01/15	lun 24/08/15			\$1,935	Fin	\$1,935	\$0	\$0
317	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0	0	mié 17/02/16	220 días	mié 17/02/16	jue 22/12/16	mié 17/02/16	jue 22/12/16			\$9,290	Fin	\$9,290	\$0	\$0
328	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0	0	lun 02/01/17	84 días	jue 02/02/17	mié 31/05/17	jue 02/02/17	mié 31/05/17			\$3,758	Fin	\$3,758	\$0	\$0
335	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0	0	jue 02/01/14	260 días	jue 02/01/14	mié 31/12/14	jue 02/01/14	mié 31/12/14			\$8,941	Fin	\$8,941	\$0	\$0
340	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0	0	lun 05/01/15	252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16			\$8,393	Fin	\$8,393	\$0	\$0
345	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0	0	lun 04/01/16	248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16			\$7,756	Fin	\$7,756	\$0	\$0
357	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0	0	lun 02/01/17	192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17			\$8,415	Fin	\$8,415	\$0	\$0
371	51%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	0	1	lun 02/01/17	97 días	mié 31/01/18	jue 14/06/18	mié 31/01/18		NOD		\$5,040	Fin	\$0	\$0		
372	100%	No		Etapa de Adquisición:	0	0	0	lun 02/01/17	8 días	mié 31/01/18	vie 09/02/18	mié 31/01/18	vie 09/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
373	100%	Si		Contratación	0	0	0	lun 02/01/17	8 días	mié 31/01/18	vie 09/02/18	mié 31/01/18	vie 09/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
374	47%	No		Etapa de Ejecución de pagos:	0	1	lun 06/02/17	88 días	lun 12/02/18	jue 14/06/18	lun 12/02/18		NOD		\$5,040	Fin	\$0	\$0		
375	100%	No		Enero 2018	0	0	0	NOD	13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
376	100%	No		Febrero 2018	0	0	0	NOD	13 días	lun 12/02/18	mié 28/02/18	lun 12/02/18	mié 28/02/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
377	100%	No		Marzo 2018	0	0	0	NOD	19 días	vie 02/03/18	mié 28/03/18	vie 02/03/18	mié 28/03/18			\$0	Fin	\$0	\$0	
378	0%	No		Abril 2018	0	1	0	NOD	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18		NOD		\$3,360	Fin	\$0	\$0		
379	0%	No		Mayo 2018	0	0	0	NOD	20 días	mié 02/05/18	mar 29/05/18		NOD		\$840	Fin	\$0	\$0		
380	0%	No		Junio 2018	0	0	0	NOD	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18		NOD		\$840	Fin	\$0	\$0		
381	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2014	0	0	0	jue 02/01/14	239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	jue 02/01/14	mar 02/12/14			\$12,347	Fin	\$12,347	\$0	\$0
386	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0	0	mar 02/02/16	20 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15			\$6,244	Fin	\$6,244	\$0	\$0
391	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0	0	mar 02/02/16	213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16			\$33,135	Fin	\$33,135	\$0	\$0
402	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0	0	lun 06/02/17	221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17			\$38,194	Fin	\$38,194	\$0	\$0

4º trimestre | 1er trimestre | 2º trim

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: jue 05/04/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬇ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◆ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Id	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo	Trimestres				
																		4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre		
589	0%	No	Junio 2018				0	0	02/06/17	10 días	01/06/18	14/06/18		NOD	NOD	588	\$1,770 Fin	\$0	\$0			
590	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015				0	0	09/02/15	220 días	09/02/15	23/12/15	09/02/15	mié 23/12/15			\$12,957 Fin	\$12,957	\$0			
598	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016				0	0	10/12/15	259 días	10/12/15	16/12/16	10/12/15	vie 16/12/16			\$17,634 Fin	\$17,634	\$0			
616	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017				0	0	20/01/17	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17	vie 15/12/17			\$17,997 Fin	\$17,997	\$0			
634	27%	No	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018				0	1	03/01...	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	NOD			\$10,600 Fin	\$5,290	\$0			
635	100%	No	Etapas de Adquisición:				0	0	03/01...	17 días	14/12/17	08/01/18	14/12/17	lun 08/01/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
639	17%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:				0	1	mié 04/01...	95 días	02/02/18	14/06/18	02/02/18	NOD			\$10,600 Fin	\$5,290	\$0			
640	100%	No	Enero 2018				0	0	02/03/17	2 días	02/02/18	05/02/18	02/02/18	lun 05/02/18	638		\$1,769 Fin	\$1,769	\$0			
641	100%	No	Febrero 2018				0	0	04/04/...	4 días	20/02/18	23/02/18	20/02/18	vie 23/02/18	640		\$1,764 Fin	\$1,764	\$0			
642	100%	No	Marzo 2018				0	0	mié 03/05/...	5 días	19/03/18	23/03/18	19/03/18	vie 23/03/18	641		\$1,757 Fin	\$1,757	\$0			
643	0%	No	Abril 2018				0	1	02/06/17	20 días	03/04/18	30/04/18		NOD	642		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
644	0%	No	Mayo 2018				0	0	02/06/17	22 días	02/05/18	31/05/18		NOD	643		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
645	0%	No	Junio 2018				0	0	02/06/17	10 días	01/06/18	14/06/18		NOD	644		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
646	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015				0	0	17/02...	214 días	17/02/15	23/12/15	17/02/15	mié 23/12/15			\$10,769 Fin	\$10,769	\$0			
653	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016				0	0	10/12/15	259 días	10/12/15	16/12/16	10/12/15	vie 16/12/16			\$17,634 Fin	\$17,634	\$0			
671	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017				0	0	20/01/17	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17	vie 15/12/17			\$17,996 Fin	\$17,996	\$0			
689	27%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018				0	1	20/01/17	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	NOD			\$10,600 Fin	\$5,290	\$0			
690	100%	No	Etapas de Adquisición:				0	0	20/01/17	17 días	14/12/17	08/01/18	14/12/17	lun 08/01/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
694	17%	No	Etapas de Ejecución de pagos:				0	1	24/02/17	95 días	02/02/18	14/06/18	02/02/18	NOD			\$10,600 Fin	\$5,290	\$0			
695	100%	No	Enero 2018				0	0	24/02/17	2 días	02/02/18	05/02/18	02/02/18	lun 05/02/18	693		\$1,769 Fin	\$1,769	\$0			
696	100%	No	Febrero 2018				0	0	24/02/17	4 días	20/02/18	23/02/18	20/02/18	vie 23/02/18	695		\$1,764 Fin	\$1,764	\$0			
697	100%	No	Marzo 2018				0	0	28/03/...	5 días	19/03/18	23/03/18	19/03/18	vie 23/03/18	696		\$1,757 Fin	\$1,757	\$0			
698	0%	No	Abril 2018				0	1	28/04/17	20 días	03/04/18	30/04/18		NOD	697		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
699	0%	No	Mayo 2018				0	0	02/06/17	22 días	02/05/18	31/05/18		NOD	698		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
700	0%	No	Junio 2018				0	0	02/06/17	10 días	01/06/18	14/06/18		NOD	699		\$1,770 Fin	\$0	\$0			
701	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015				0	0	15/12/14	261 días	15/12/14	23/12/15	15/12/14	mié 23/12/15			\$21,539 Fin	\$21,539	\$0			
708	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016				0	0	10/12/15	259 días	10/12/15	16/12/16	10/12/15	vie 16/12/16			\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
726	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017				0	0	20/01/17	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17	vie 15/12/17			\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
744	26%	No	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018				0	1	03/01...	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	NOD			\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
745	100%	No	Etapas de Adquisición:				0	0	03/01...	17 días	14/12/17	08/01/18	14/12/17	lun 08/01/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
749	16%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:				0	1	mié 04/01...	95 días	02/02/18	14/06/18	02/02/18	NOD			\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
750	100%	No	Enero 2018				0	0	02/03/17	2 días	02/02/18	05/02/18	02/02/18	lun 05/02/18	748		\$2,721 Fin	\$2,721	\$0			
751	100%	No	Febrero 2018				0	0	04/04/...	4 días	20/02/18	23/02/18	20/02/18	vie 23/02/18	750		\$2,714 Fin	\$2,714	\$0			
752	100%	No	Marzo 2018				0	0	mié 03/05/...	4 días	20/03/18	23/03/18	20/03/18	vie 23/03/18	751		\$2,703 Fin	\$2,703	\$0			
753	0%	No	Abril 2018				0	1	02/06/17	20 días	03/04/18	30/04/18		NOD	752		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
754	0%	No	Mayo 2018				0	0	02/06/17	22 días	02/05/18	31/05/18		NOD	753		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
755	0%	No	Junio 2018				0	0	02/06/17	10 días	01/06/18	14/06/18		NOD	754		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
756	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015				0	0	mié 02/09/...	80 días	02/09/15	23/12/15	02/09/15	mié 23/12/15			\$6,924 Fin	\$6,924	\$0			
763	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016				0	0	07/12/15	262 días	07/12/15	16/12/16	07/12/15	vie 16/12/16			\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
781	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017				0	0	20/01/17	232 días	20/01/17	15/12/17	20/01/17	vie 15/12/17			\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
799	27%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018				0	1	03/01...	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	NOD			\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
800	100%	No	Etapas de Adquisición:				0	0	03/01...	17 días	14/12/17	08/01/18	14/12/17	lun 08/01/18			\$0 Fin	\$0	\$0			
804	17%	No	Etapas de Ejecución de Pagos:				0	1	mié 04/01...	95 días	02/02/18	14/06/18	02/02/18	NOD			\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
805	100%	No	Enero 2018				0	0	02/03/17	2 días	02/02/18	05/02/18	02/02/18	lun 05/02/18	803		\$2,721 Fin	\$2,721	\$0			
806	100%	No	Febrero 2018				0	0	04/04/...	4 días	20/02/18	23/02/18	20/02/18	vie 23/02/18	805		\$2,714 Fin	\$2,714	\$0			
807	100%	No	Marzo 2018				0	0	mié 03/05/...	5 días	19/03/18	23/03/18	19/03/18	vie 23/03/18	806		\$2,703 Fin	\$2,703	\$0			
808	0%	No	Abril 2018				0	1	02/06/17	20 días	03/04/18	30/04/18		NOD	807		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
809	0%	No	Mayo 2018				0	0	02/06/17	22 días	02/05/18	31/05/18		NOD	808		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
810	0%	No	Junio 2018				0	0	02/06/17	10 días	01/06/18	14/06/18		NOD	809		\$2,725 Fin	\$0	\$0			
811	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2014				0	0	02/12/13	283 días	02/12/13	31/12/14	02/12/13	mié 31/12/14			\$2,587 Fin	\$2,587	\$0			
818	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2015				0	0	02/02/15	225 días	02/02/15	23/12/15	02/02/15	mié 23/12/15			\$20,915 Fin	\$20,915	\$0			
825	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016				0	0	08/12...	226 días	08/12/15	28/10/16	08/12/15	vie 28/10/16			\$23,328 Fin	\$23,328	\$0			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: jue 05/04/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬇ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◇ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Page 5

Id	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real	Anticipo	Trimestres			
																	4º trimestre	1er trimestre	2º trim	
841	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016 (2do Consultor)	0	0	lun 17/10/16	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$3,598 Fin	\$3,598	\$0			
849	100%	No	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$27,913 Fin	\$27,913	\$0			
866	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como Apoyo al OJ	0	0	mar 13/10/15	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$4,724 Fin	\$4,724	\$0			
874	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como Apoyo al MP	0	0	lun 19/09/16	64 días	lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16				\$5,992 Fin	\$5,992	\$0			
883	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	0	0	mar 13/10/15	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$3,542 Fin	\$3,542	\$0			
891	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	0	0	lun 07/12/15	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127	\$0			
909	100%	No	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	0	0	vie 20/01/17	112 días	vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17				\$14,687 Fin	\$14,687	\$0			
921	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	0	0	lun 29/08/16	78 días	lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16				\$8,306 Fin	\$8,306	\$0			
931	100%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448	\$0			
949	27%	No	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	0	1	mar 03/01/17	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD				\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
950	100%	No	Etapa de Adquisición:	0	0	mar 03/01/17	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18				\$0 Fin	\$0	\$0			
954	17%	No	Etapa de Ejecución de Pagos:	0	1	mié 04/01/17	95 días	vie 02/02/18	jue 14/06/18	vie 02/02/18	NOD				\$16,313 Fin	\$8,138	\$0			
955	100%	No	Enero 2018	0	0	jue 02/03/17	2 días	vie 02/02/18	lun 05/02/18	vie 02/02/18	lun 05/02/18	953			\$2,721 Fin	\$2,721	\$0			
956	100%	No	Febrero 2018	0	0	mar 04/04/17	4 días	mar 20/02/18	vie 23/02/18	mar 20/02/18	vie 23/02/18	955			\$2,714 Fin	\$2,714	\$0			
957	100%	No	Marzo 2018	0	0	mié 03/05/17	5 días	lun 19/03/18	vie 23/03/18	lun 19/03/18	vie 23/03/18	956			\$2,703 Fin	\$2,703	\$0			
958	0%	No	Abril 2018	0	1	vie 02/06/17	20 días	mar 03/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD	957			\$2,725 Fin	\$0	\$0			
959	0%	No	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD	958			\$2,725 Fin	\$0	\$0			
960	0%	No	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD	959			\$2,725 Fin	\$0	\$0			
961	100%	No	Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ	0	0	vie 20/01/17	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17				\$7,653 Fin	\$7,653	\$0			
971	100%	No	Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	0	0	vie 20/01/17	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17				\$954 Fin	\$954	\$0			
981	100%	No	Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas	0	0	lun 11/08/14	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15				\$31,281 Fin	\$31,281	\$0			
988	100%	No	Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	0	0	lun 05/10/15	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15				\$1,311 Fin	\$1,311	\$0			
996	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	0	0	mar 08/12/15	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16				\$5,195 Fin	\$5,195	\$0			
1003	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	0	lun 02/05/16	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16				\$28,536 Fin	\$28,536	\$0			
1010	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0	mar 01/12/15	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16				\$5,930 Fin	\$5,930	\$0			
1020	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0	lun 02/05/16	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16				\$7,930 Fin	\$7,930	\$0			
1031	100%	No	Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en	0	0	lun 17/10/16	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$8,011 Fin	\$8,011	\$0			
1041	100%	No	Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de	0	0	lun 22/08/16	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16				\$24,832 Fin	\$24,832	\$0			
1050	100%	No	Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	0	lun 22/08/16	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16				\$24,832 Fin	\$24,832	\$0			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: jue 05/04/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	▬ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	▬ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◆ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Page 6

Id	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamento	Acumula	Costo Real	Anticipo			
1060	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0	mié 01/06/16	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16			\$25,385 Fin	\$25,385	\$0		4º trimestre	1er trimestre	2º trim
1070	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0	lun 14/11/16	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17			\$20,930 Fin	\$20,930	\$0				
1079	100%	No	Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0	jue 05/01/17	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17			\$41,594 Fin	\$41,594	\$0				
1088	30%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	1	jue 05/01/17	149 días	lun 30/10/17	vie 25/05/18	lun 30/10/17		NOD		\$25,410 Fin	\$5,090	\$0				
1089	100%	No	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 05/01/17	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	vie 03/11/17			\$0 Fin	\$0	\$0				
1093	24%	No	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	jue 23/02/17	119 días	lun 11/12/17	vie 25/05/18	lun 11/12/17		NOD		\$25,410 Fin	\$5,090	\$0				
1094	100%	No	Pago Producto No. 1 20% del valor del contrato	0	0	jue 23/02/17	12 días	lun 11/12/17	mié 27/12/17	lun 11/12/17	mié 27/12/17	1092		\$5,090 Fin	\$5,090	\$0				
1095	0%	No	Pago Producto No. 2 50% del valor del contrato	0	1	jue 23/02/17	20 días	lun 02/04/18	vie 27/04/18			NOD		\$12,706 Fin	\$0	\$0				
1096	0%	No	Pago Producto No. 3 30% del valor del contrato	0	0	jue 23/02/17	19 días	lun 30/04/18	vie 25/05/18			NOD	1095	\$7,614 Fin	\$0	\$0				
1097	100%	No	Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0	jue 05/01/17	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17			\$28,541 Fin	\$28,541	\$0				
1105	100%	No	Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el área de influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	0	lun 12/01/15	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15			\$15,666 Fin	\$15,666	\$0				
1113	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	lun 04/05/15	80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15			\$1,130 Fin	\$1,130	\$0				
1118	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	mar 02/02/16	230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16			\$1,501 Fin	\$1,501	\$0				
1124	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	jue 02/02/17	128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17			\$1,460 Fin	\$1,460	\$0				
1130	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	lun 22/09/14	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14			\$1,800 Fin	\$1,800	\$0				
1135	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	lun 23/03/15	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15			\$8,543 Fin	\$8,543	\$0				
1140	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	lun 04/07/16	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17			\$13,742 Fin	\$13,742	\$0				
1149	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	lun 05/06/17	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17			\$1,147 Fin	\$1,147	\$0				
1158	41%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	2	1	lun 05/06/17	52 días	mié 14/02/18	jue 26/04/18	mié 14/02/18		NOD		\$2,050 Fin	\$0	\$0				
1159	68%	No	Etapas de Adquisición:	2	0	lun 05/06/17	32 días	mié 14/02/18	jue 29/03/18	mié 14/02/18		NOD		\$0 Fin	\$0	\$0				
1160	100%	No	Elaboración de Especificaciones	0	0	lun 05/06/17	4 días	mié 14/02/18	lun 19/02/18	mié 14/02/18	lun 19/02/18			\$0 Fin	\$0	\$0				
1161	100%	Si	No Objeción	0	0	NOD	6 días	mar 20/02/18	mar 27/02/18	mar 20/02/18	mar 27/02/18	1160		\$0 Fin	\$0	\$0				
1162	100%	Si	Publicación y Evaluación	0	0	lun 12/06/17	11 días	jue 01/03/18	jue 15/03/18	jue 01/03/18	jue 15/03/18	1161		\$0 Fin	\$0	\$0				
1163	0%	Si	No Objeción	1	0	NOD	5 días	vie 16/03/18	jue 22/03/18			NOD	1162	\$0 Fin	\$0	\$0				
1164	0%	Si	Adjudicación y Contratación	1	0	lun 26/06/17	5 días	vie 23/03/18	jue 29/03/18			NOD	1163	\$0 Fin	\$0	\$0				
1165	0%	No	Etapas de Ejecución de pagos:	0	1	lun 10/07/17	20 días	vie 30/03/18	jue 26/04/18			NOD		\$2,050 Fin	\$0	\$0				
1166	0%	No	Pago	0	1	lun 10/07/17	20 días	vie 30/03/18	jue 26/04/18			NOD	1164	\$2,050 Fin	\$0	\$0				
1167	100%	No	Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	0	lun 05/06/17	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18			\$453 Fin	\$453	\$0				
1174	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	lun 02/03/15	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15			\$2,306 Fin	\$2,306	\$0				
1179	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	lun 22/08/16	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16			\$1,961 Fin	\$1,961	\$0				
1184	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick Up)	0	0	lun 17/07/17	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	lun 17/07/17	lun 17/04/17			\$4,975 Fin	\$4,975	\$0				
1189	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0	lun 17/07/17	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17			\$1,808 Fin	\$1,808	\$0				
1194	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2015	0	0	lun 08/06/15	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15			\$681 Fin	\$681	\$0				
1199	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2016	0	0	vie 01/04/16	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16			\$1,236 Fin	\$1,236	\$0				
1206	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2017	0	0	vie 17/02/17	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17			\$1,084 Fin	\$1,084	\$0				
1214	23%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2018	1	0	vie 17/02/17	93 días	lun 05/02/18	mié 13/06/18	lun 05/02/18		NOD		\$5,000 Fin	\$593	\$0				
1215	0%	No	Etapas de Adquisición:	1	0	vie 17/02/17	4 días	lun 05/02/18	jue 08/02/18	lun 05/02/18		NOD		\$0 Fin	\$0	\$0				
1216	0%	Si	Proceso de Compra	1	0	vie 17/02/17	4 días	lun 05/02/18	jue 08/02/18	lun 05/02/18		NOD		\$0 Fin	\$0	\$0				

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: jue 05/04/18

División crítica Summary	▬ Inactive Task	Duration-only	▬ Finish-only	⌋ Margen de demora
Task	▬ Project Summary	▬ Inactive Milestone	▬ Manual Summary Rollup	▬ Deadline	⬇ Retrasada
Split External Tasks	▬ Inactive Summary	▬ Manual Summary	▬ Progress	▬ Tareas críticas
Milestone	◆ External Milestone	◊ Manual Task	▬ Start-only	▬ Progreso manual	▬

Page 7

Id	% Avanc	Hito	PMR/P/Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próxima	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	Anticipo			
1217	25%	No	Etapa de Ejecución de pagos:	0	0	vie 03/03/17	91 días	mié 07/02/18	mié 13/06/18	mié 07/02/18	NOD		\$5,000 Fin		\$593	\$0			
1218	0%	No	Entrega	0	0	vie 03/03/17	52 días	lun 02/04/18	mié 13/06/18		NOD		\$4,407 Prorrata		\$0	\$0			
1219	100%	No	Pago Febrero	0	0	vie 03/03/17	17 días	mié 07/02/18	mié 28/02/18	mié 07/02/18	mié 28/02/18		\$593 Fin		\$593	\$0			
1220	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	lun 04/05/15	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15		\$3,731 Fin		\$3,731	\$0			
1225	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	lun 29/08/16	24 días	lun 29/08/16	jue 30/09/16	lun 29/08/16	jue 30/09/16		\$305 Fin		\$305	\$0			
1230	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte	0	0	lun 29/08/16	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17		\$1,777 Fin		\$1,777	\$0			
1235	100%	No	Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	0	0	lun 16/12/13	273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14		\$4,121 Fin		\$4,121	\$0			
1240	100%	No	Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	0	0	lun 15/12/14	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$5,084 Fin		\$5,084	\$0			
1245	100%	No	Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	0	0	lun 15/12/14	190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17		\$3,914 Fin		\$3,914	\$0			
1254	100%	No	Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Proj	0	0	lun 15/12/14	58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17		\$3,845 Fin		\$3,845	\$0			
1260	100%	No	Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017	0	0	lun 15/12/14	38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17		\$1,968 Fin		\$1,968	\$0			
1265	100%	No	Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	0	0	lun 04/05/15	41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15		\$13,734 Fin		\$13,734	\$0			
1273	0%	No	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de Oficina para la Coordinación de la UE 2017	0	0	lun 06/02/17	25 días	lun 06/02/17	vie 10/04/17		NOD		\$0 Fin		\$0	\$0			
1280	100%	No	Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0	mié 10/12/13	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16		\$32,055 Fin		\$32,055	\$0			
1289	100%	No	Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0	lun 11/05/15	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin		\$5,262	\$0			
1296	100%	No	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0	jue 09/02/17	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17		\$11,052 Fin		\$11,052	\$0			
1304	100%	No	Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	0	0	vie 26/02/16	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$2,480 Fin		\$2,480	\$0			
1305	100%	No	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	vie 02/01/15	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16		\$1,704 Fin		\$1,704	\$0			
1306	100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	vie 02/01/15	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15		\$10 Fin		\$10	\$0			
1307	100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	lun 04/01/16	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$70 Fin		\$70	\$0			
1308	100%	No	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	NOD	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17		\$80 Fin		\$80	\$0			
1309	100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	lun 17/08/15	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15		\$336 Fin		\$336	\$0			
1310	100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	vie 01/04/16	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$858 Fin		\$858	\$0			
1311	100%	No	Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	NOD	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17		\$825 Fin		\$825	\$0			

4º trimestre | 1er trimestre | 2º trim

Project: PEP_SMART_1905.0
Date: jue 05/04/18

División crítica	Summary	▬	Inactive Task	▬	Duration-only	▬	Finish-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	Project Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	▬	Retrasada	▬
Split	External Tasks	▬	Inactive Summary	▬	Manual Summary	▬	Progress	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	External Milestone	◇	Manual Task	▬	Start-only	▬	Progreso manual	▬		

Observaciones / Desafíos

- No aparece los montos actualizados para la Unidad Ejecutora en los Datos Generales del Avance del mes de Marzo / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento, de acuerdo a la última modificación entre componentes sin afectar los montos globales de las categorías asignadas en la segunda transferencia, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-3083/2017 de fecha 11/12/2017.



Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 14/6/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Anibal De León Polanco



Fecha de actualización

9/4/2018 - 9:27 AM
