

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Mayo / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	07/06/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,193,228.79	Plazo de ejecución	90.44%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

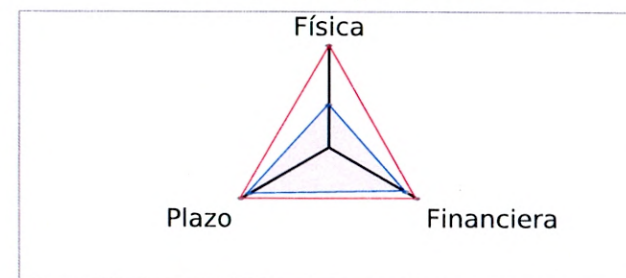

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	10,900,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1,638,490.53	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	32.95% / 98.01%		
Porcentaje de Ejecución	15.03%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	1	0		2	1
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	8	0		42	35

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

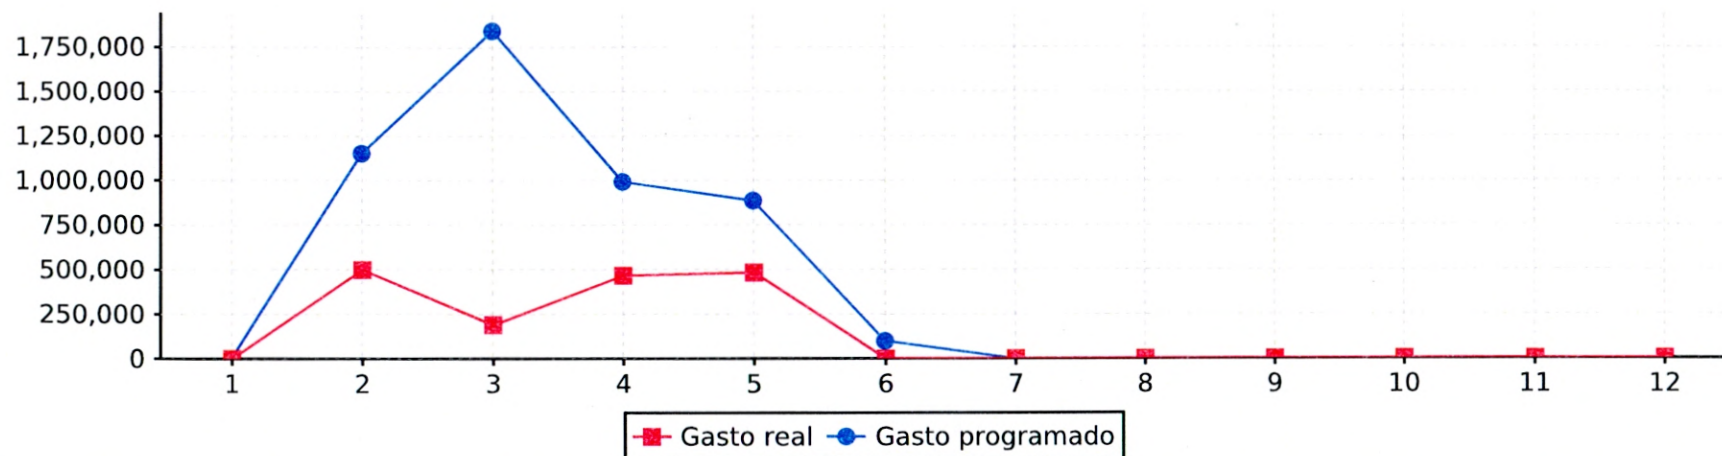

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												1,638,490.53
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuen	Ident	EDT	% Avanc	Hito	PMR/PP	Nombre de la Tarea	Activ/Atras	Activ/Próxim Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamient	Acumula	Costo Real	Trimestres		
																					4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre
1044	1	100%	...	BID	No	4.1.68	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	0	041 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16		\$5,195 Fin		\$5,195			
1051	1	100%	...	BID	No	4.1.69	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16		\$28,536 Fin		\$28,536			
1061	1	100%	...	BID	No	4.1.70	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16		\$5,930 Fin		\$5,930			
1072	1	100%	...	BID	No	4.1.71	100%	No	Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en	0	0	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16		\$7,930 Fin		\$7,930			
1082	1	100%	...	BID	No	4.1.72	100%	No	Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de	0	0	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16		\$8,011 Fin		\$8,011			
1091	1	100%	...	BID	No	4.1.73	100%	No	Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	0	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16		\$24,832 Fin		\$24,832			
1101	1	100%	...	BID	No	4.1.74	100%	No	Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16		\$25,385 Fin		\$25,385			
1111	1	100%	...	BID	No	4.1.75	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17		\$20,930 Fin		\$20,930			
1120	1	100%	...	BID	No	4.1.76	100%	No	Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17		\$41,594 Fin		\$41,594			
1129	1	100%	...	BID	No	4.1.77	100%	No	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	0	120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18		\$25,410 Fin		\$25,410			
1138	1	100%	...	BID	No	4.1.78	100%	No	Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17		\$28,541 Fin		\$28,541			
1146	1	100%	...	BID	No	4.1.79	100%	No	Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	0	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15		\$15,666 Fin		\$15,666			
1154	1	100%	...	BID	No	4.1.80	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15		\$1,130 Fin		\$1,130			
1159	1	100%	...	BID	No	4.1.81	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16		\$1,501 Fin		\$1,501			
1165	1	100%	...	BID	No	4.1.82	100%	No	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17		\$1,460 Fin		\$1,460			
1171	1	100%	...	BID	No	4.1.83	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14		\$1,800 Fin		\$1,800			
1176	1	100%	...	BID	No	4.1.84	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15		\$8,543 Fin		\$8,543			
1181	1	100%	...	BID	No	4.1.85	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17		\$13,742 Fin		\$13,742			
1190	1	100%	...	BID	No	4.1.86	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17		\$1,147 Fin		\$1,147			
1199	1	100%	...	BID	No	4.1.87	100%	No	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0	53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18		\$266 Fin		\$266			
1208	1	100%	...	BID	No	4.1.88	100%	No	Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	0	0	28 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18		\$803 Fin		\$803			
1217	1	100%	...	BID	No	4.1.89	100%	No	Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	0	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18		\$453 Fin		\$453			
1224	1	100%	...	BID	No	4.1.90	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15		\$2,306 Fin		\$2,306			
1229	1	100%	...	BID	No	4.1.91	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16		\$1,961 Fin		\$1,961			
1234	1	100%	...	BID	No	4.1.92	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick U	0	0	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17		\$4,975 Fin		\$4,975			
1239	1	100%	...	BID	No	4.1.93	100%	No	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17		\$1,808 Fin		\$1,808			
1244	1	100%	...	BID	No	4.1.94	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	0	0	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15		\$681 Fin		\$681			
1249	1	100%	...	BID	No	4.1.95	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	0	0	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16		\$1,236 Fin		\$1,236			
1256	1	100%	...	BID	No	4.1.96	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	0	0	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17		\$1,084 Fin		\$1,084			
1264	1	100%	...	BID	No	4.1.97	100%	No	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	0	0	19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18		\$593 Fin		\$593			
1270	1	100%	...	BID	No	4.1.98	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	0	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15		\$3,731 Fin		\$3,731			
1275	1	100%	...	BID	No	4.1.99	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	0	24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16		\$305 Fin		\$305			
1280	1	100%	...	BID	No	4.1.101	100%	No	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	0	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17		\$1,777 Fin		\$1,777			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mié 06/06/18

División crítica		Summary		Inactive Task	Duration-only		Finish-only		Margen de demora	
Task		Project Summary		Inactive Milestone	Manual Summary Rollup		Deadline		Retrasada	
Split		External Tasks		Inactive Summary	Manual Summary		Progress		Tareas críticas	
Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only	Progreso manual			

Id	% Completado Esperado Fin año	% Completado a fin de año actual	Fuente	Identif. empr.	EDT	% Avanc.	Hito	PMR/PA	Nombre de la Tarea	Activ. Atras	Activ. Próx. Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiam.	Acumula	Costo Real			
																					4º trimestre	1er trimestre	2º trimestre
1285	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	0	0 273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14				\$4,121 Fin	\$4,121			
1290	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	0	0 261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15				\$5,084 Fin	\$5,084			
1295	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	0	0 190 días	lun 06/03/17	lun 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17				\$3,914 Fin	\$3,914			
1304	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	0	0 26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18				\$2,018 Fin	\$2,018			
1309	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	0	0 29 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18				\$4,841 Fin	\$4,841			
1314	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	0	0 28 días	jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18				\$546 Fin	\$546			
1319	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría	0	0 29 días	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18				\$1,337 Fin	\$1,337			
1326	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0 58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17				\$3,845 Fin	\$3,845			
1332	1	100%	BID	No 4.1.10	100%	No			Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer	0	0 38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17				\$1,968 Fin	\$1,968			
1337	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	0	0 41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15				\$13,734 Fin	\$13,734			
1345	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipos de la Compañía de Seguros de la U.E.	0	0 25 días	lun 04/02/16	vie 14/02/17	NOD	NOD				\$2 Fin	\$2			
1352	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0 305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16				\$32,055 Fin	\$32,055			
1361	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0 25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15				\$5,262 Fin	\$5,262			
1368	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0 101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17				\$11,052 Fin	\$11,052			
1376	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	0	0 1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16				\$2,480 Fin	\$2,480			
1377	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0 260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16				\$1,704 Fin	\$1,704			
1378	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0 246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15				\$10 Fin	\$10			
1379	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0 253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16				\$70 Fin	\$70			
1380	1	100%	BID	No 4.1.11	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0 201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17				\$80 Fin	\$80			
1381	1	100%	BID	No 4.1.12	0%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	0	0 127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	NOD				\$20 Fin	\$20			
1382	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0 5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15				\$336 Fin	\$336			
1383	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0 180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16				\$858 Fin	\$858			
1384	1	100%	BID	No 4.1.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0 232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17				\$825 Fin	\$825			
1385	1	100%	BID	No 4.1.12	0%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2018	0	0 106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/18	NOD				\$547 Fin	\$547			

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mié 06/06/18

División crítica	Summary	▬	Inactive Task	▬	Duration-only	▬	Finish-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	Project Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	▬	Retrasada	▬
Split	External Tasks	▬	Inactive Summary	▬	Manual Summary	▬	Progress	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	External Milestone	◇	Manual Task	▬	Start-only	▬	Progreso manual	▬		

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de mayo / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 14/6/2018; así como el total de meses de ampliación que son 18 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-3007/2017 de fecha 8/12/2017.

Alertivos:

- Que no se concluyan los procesos incluidos dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.
- Cierre del Programa 14/6/2018.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

7/6/2018 - 12:28 PM
