



SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 12 de noviembre de 2018
SEICMSJ-BID-Of. 325-2018jcl

Licenciado
Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Guatemala, Ciudad


Estimado Licenciado De León:

De manera atenta se solicita su respectiva firma en el Plan de Ejecución, para el cumplimiento del artículo 69 del Decreto 50-2016 correspondiente al mes de **noviembre de 2018** del Programa BID 1905/OC-GU "Apoyo al Sector Justicia Penal", el cual de acuerdo a la Resolución DCP-001/2017 de fecha 10 de enero de 2017 del Ministerio de Finanzas Publicas, debe publicarse en la página de la Secretaria Ejecutiva de la ICMSJ.

No está demás indicarle que dichos documentos fueron debidamente revisados por el Programa y cumplen con todos los requisitos de trámite y por ello se someten a consideración para firma.

Sin otro particular, me suscribo de usted,


Atentamente,

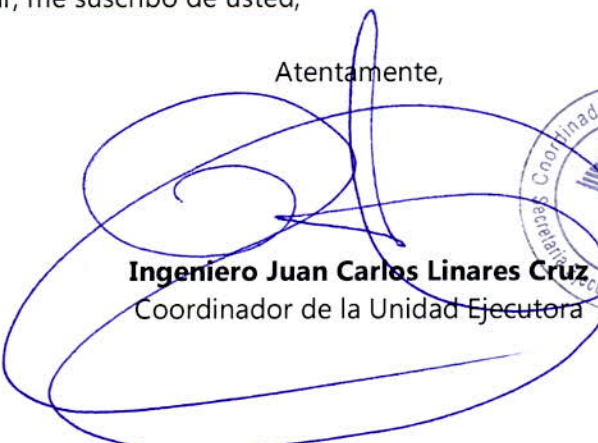

Ingeniero Juan Carlos Linares Cruz
Coordinador de la Unidad Ejecutora



c.c. Archivo

INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
SECRETARÍA EJECUTIVA



Hoy a las 8:47
Por: 

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Noviembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	11/12/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

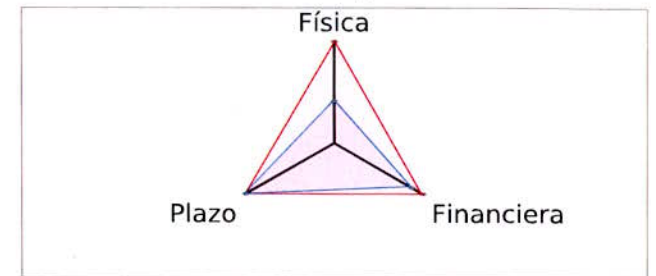

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	6,208,893.26	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	124.86% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	95.52%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	21	0	5	42	53

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

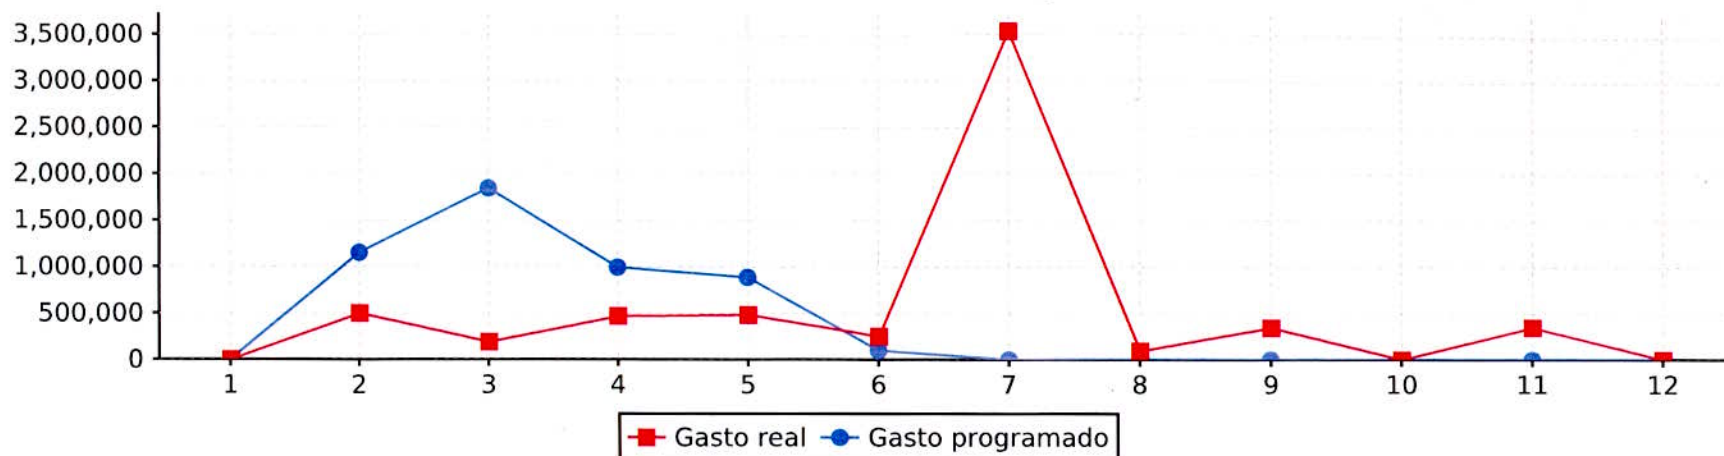

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	92,500.00	343,988.11	0.00	346,121.68	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												6,208,893.26
Total Gasto programado												4,972,618.28

Id	Identif	EDT	%	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
0	No 0	99%	No			PEP_SMART_1905_30 11 2018	2871 días	mié 24/10/07	vie 30/11/18	mié 24/10/07		NOD	\$28,429,779 Fin	\$28,426,364	
1	No 1	99%	No			Componente 1: Acceso a la Justicia	1471 días	mié 02/01/13	vie 28/09/18	mié 02/01/...		NOD	\$8,608,558 Fin	\$8,605,143	
2	No 1.1	100%	No			P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)	1387 días	mié 02/01/13	jue 31/05/18	mié 02/01/...	jue 31/05/18		\$50,676 Fin	\$50,676	
77	No 1.2	100%	No			P2. Sedes Regionales de Defensa Penal (IDPP)	1205 días	mié 01/01/14	jue 20/09/18	mié 01/01/...	jue 20/09/18		\$1,671,752 Fin	\$1,671,752	
363	No 1.3	100%	No			P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	720 días	mar 03/11/15	vie 31/08/18	mar 03/11...	vie 31/08/18		\$504,511 Fin	\$504,511	
490	No 1.4	99%	No			P4. Comisarias de Policía TIPO construidas (MG)	1013 días	lun 06/10/14	vie 28/09/18	lun 06/10/14		NOD	\$5,313,157 Fin	\$5,309,742	
1612	No 1.5	100%	No			P5. Estudio de Victimización CF (MG)	614 días	lun 02/05/16	vie 28/09/18	lun 02/05/16	vie 28/09/18		\$800,217 Fin	\$800,217	
1655	No 1.6	100%	No			P6. Fiscalías (MP)	627 días	mié 07/10/15	lun 26/03/18	mié 07/10/...	lun 26/03/18		\$268,245 Fin	\$268,245	
1952	No 2	100%	No			Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)	1114 días	mar 04/02/14	vie 15/06/18	mar 04/02/14	vie 15/06/18		\$14,211,078 Fin	\$14,211,078	
1953	No 2.1	100%	No			P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	1114 días	mar 04/02/14	vie 15/06/18	mar 04/02/14	vie 15/06/18		\$14,211,078 Fin	\$14,211,078	
1954	No 2.1.1	100%	No			Interconexión en OJ	1039 días	mar 20/05/14	vie 15/06/18	mar 20/05/...	vie 15/06/18		\$1,247,199 Fin	\$1,247,199	
2193	No 2.1.2	100%	No			Interconexión en IDPP	734 días	mar 04/02/14	vie 16/12/16	mar 04/02/...	vie 16/12/16		\$807,267 Fin	\$807,267	
2348	No 2.1.3	100%	No			Interconexión en MINGOB	620 días	lun 25/05/15	mié 08/11/17	lun 25/05/15	mié 08/11/17		\$1,955,192 Fin	\$1,955,192	
2550	No 2.1.4	100%	No			Interconexión en MP	973 días	lun 04/08/14	mié 30/05/18	lun 04/08/14	mié 30/05/18		\$9,566,872 Fin	\$9,566,872	
3850	No 2.1.5	100%	No			Interconexión en SE	903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/...	jue 12/04/18		\$634,548 Fin	\$634,548	
3970	No 3	100%	No			Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	863 días	mar 05/05/15	vie 28/09/18	mar 05/05/15	vie 28/09/18		\$2,354,909 Fin	\$2,354,909	
3971	No 3.1	100%	No			P1. Equipo de la división de Investigación criminal y verificación de la prueba	774 días	mar 05/05/15	jue 24/05/18	mar 05/05/15	jue 24/05/18		\$1,707,905 Fin	\$1,707,905	
3972	No 3.1.1	100%	No			Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación en	1329 días	vie 15/01/16	vie 28/04/17	vie 15/01/16	vie 28/04/17		\$73,453 Fin	\$73,453	
4005	No 3.1.2	100%	No			Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación en	478 días	lun 20/06/16	mar 08/05/18	lun 20/06/16	mar 08/05/18		\$40,191 Fin	\$40,191	
4034	No 3.1.3	100%	No			Adquisición de Equipamiento y Materiales de Investigación Criminal MP	774 días	mar 05/05/15	jue 24/05/18	mar 05/05/15	jue 24/05/18		\$1,161,086 Fin	\$1,161,086	
4683	No 3.1.4	100%	No			Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18		\$433,175 Fin	\$433,175	
4748	No 3.2	100%	No			P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas	849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	vie 28/09/18		\$438,027 Fin	\$438,027	
4749	No 3.2.1	100%	No			Capacitación de los funcionarios en IDPP	472 días	lun 22/02/16	jue 28/12/17	lun 22/02/16	jue 28/12/17		\$43,642 Fin	\$43,642	
4856	No 3.2.2	100%	No			Capacitación de los funcionarios en MG	297 días	mié 08/06/16	vie 11/08/17	mié 08/06/...	vie 11/08/17		\$28,121 Fin	\$28,121	
4891	No 3.2.3	100%	No			Capacitación de los funcionarios en MP	574 días	lun 25/01/16	vie 20/04/18	lun 25/01/16	vie 20/04/18		\$64,922 Fin	\$64,922	
4947	No 3.2.4	100%	No			Capacitación de los funcionarios en SE	849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	vie 28/09/18		\$301,341 Fin	\$301,341	
4997	No 3.3	100%	No			P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba	588 días	lun 06/06/16	jue 27/09/18	lun 06/06/16	jue 27/09/18		\$208,978 Fin	\$208,978	
4998	No 3.3.1	100%	No			Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala	371 días	lun 06/06/16	jue 23/11/17	lun 06/06/16	jue 23/11/17		\$0 Fin	\$0	
5019	No 3.3.2	100%	No			Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	184 días	lun 13/11/17	lun 30/07/18	lun 13/11/17	lun 30/07/18		\$203,200 Fin	\$203,200	
5036	No 3.3.3	100%	No			Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2018	4 días	lun 24/09/18	jue 27/09/18	lun 24/09/18	jue 27/09/18		\$3,779 Fin	\$3,779	
5041	No 3.3.4	100%	No			Proceso de Contratación: Boletos aéreos para el Programa Apoyo al Sector Justicia	6 días	jue 20/09/18	jue 27/09/18	jue 20/09/18	jue 27/09/18		\$1,998 Fin	\$1,998	
5046	No 4	100%	No			Administración	1403 días	lun 10/06/13	vie 30/11/18	lun 10/06/13	vie 30/11/18		\$3,255,235 Fin	\$3,255,235	
5047	No 4.1	100%	No			Gastos indirectos e imprevistos (OJ)	1248 días	mar 16/07/13	jue 31/05/18	mar 16/07/...	jue 31/05/18		\$262,475 Fin	\$262,475	
5517	No 4.2	100%	No			Gastos indirectos e imprevistos (IDPP)	1294 días	lun 10/06/13	jue 28/06/18	lun 10/06/13	jue 28/06/18		\$330,037 Fin	\$330,037	
5844	No 4.3	100%	No			Gastos indirectos e imprevistos (MINGOB)	922 días	mar 16/09/11	mié 02/05/18	mar 16/09/...	mié 02/05/18		\$532,256 Fin	\$532,256	
6216	No 4.4	100%	No			Gastos indirectos e imprevistos (MP)	1169 días	mar 03/12/11	vie 29/06/18	mar 03/12...	vie 29/06/18		\$497,841 Fin	\$497,841	
6502	No 4.5	100%	No			Gastos indirectos e imprevistos (SE)	1321 días	mié 02/10/13	vie 30/11/18	mié 02/10/...	vie 30/11/18		\$1,632,626 Fin	\$1,632,626	
7615	No 5	67%	No			Clausulas	2848 días	mié 24/10/07	mar 30/10/18	mié 24/10/...		NOD	\$0 Fin	\$0	
7629	No 6	100%	No			Plan de Preparación de Cierre	220 días	mié 22/11/17	vie 28/09/18	mié 22/11/...	vie 28/09/18		\$0 Fin	\$0	
7661	No 7	97%	No			Fase de Cierre	130 días	lun 30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18		NOD	\$0 Fin	\$0	
7687	No 8	100%	Si			Fin del Programa	1 día	dom 30/09/11	dom 30/09/18	dom 30/09/...	dom 30/09/18		\$0 Fin	\$0	

2006 | 2007 | 2008 | 2009

Project: PEP_SMART_1905_30 11
Date: mar 11/12/18

División crítica	Summary	▬	Inactive Task	▬	Duration-only	▬	Finish-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	Project Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	▬	Retrasada	▬
Split	External Tasks	▬	Inactive Summary	▬	Manual Summary	▬	Progress	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	External Milestone	◆	Manual Task	▬	Start-only	▬	Progreso manual	▬		

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de noviembre / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.
- En Gastos y Desembolsos, no aparecen reflejados los montos desembolsados para la Unidad Ejecutora del Programa en el periodo 2018.

Alertivos:

- Se espera la gestión de transferencia para efectuar el último pago a la firma de Auditoría Externa.

Elaborado por: (nombre y firma) Juan Carlos Linares Cruz



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

11/12/2018 - 10:38 AM
