

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

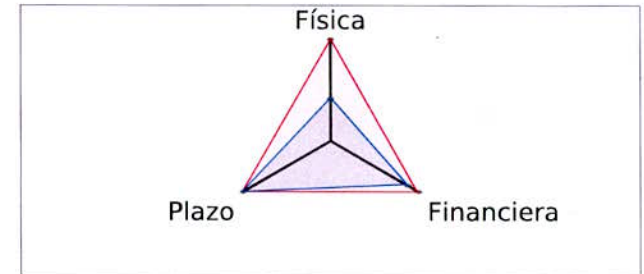

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD




Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

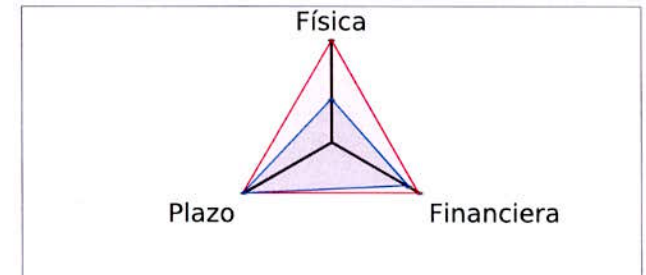

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD




Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**


Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

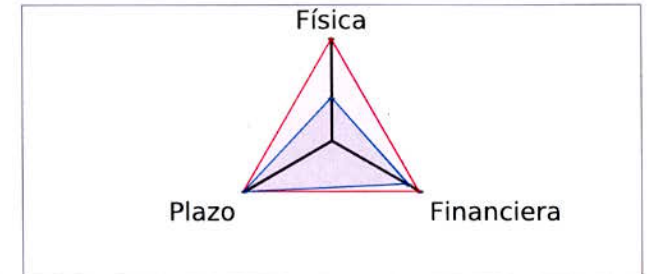

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD




Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

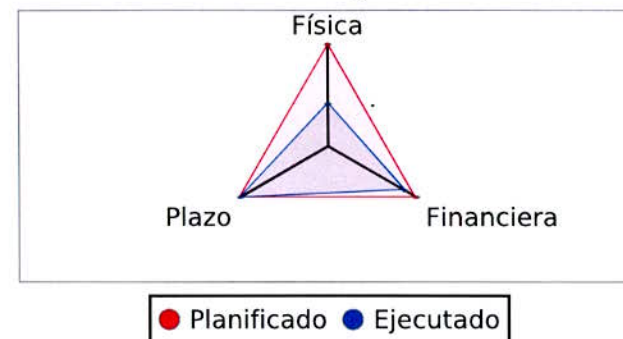

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD




Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**

Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

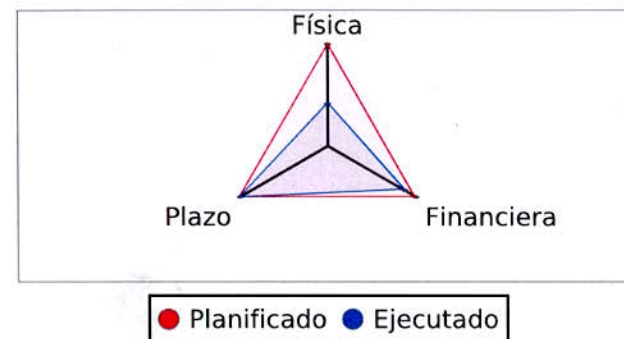

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD




Mes reportado **Octubre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	09/11/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,968,445.74	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23 87.42%	Monto por desembolsar USD\$	406,188.37 12.58%

Gráfica de Ejecución

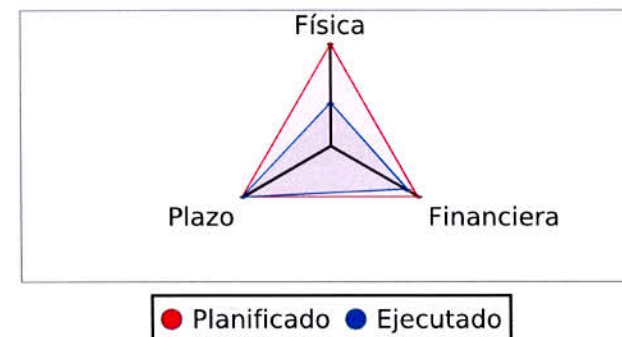

Tipo de cambio: 7.73 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,862,771.58	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	117.90% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	90.20%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
Componente: Administración									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	21	0	4	42	52

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento del Acceso a la Justicia											
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica											
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
Administración											
Fortalecimiento Institucional											
Auditoria Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

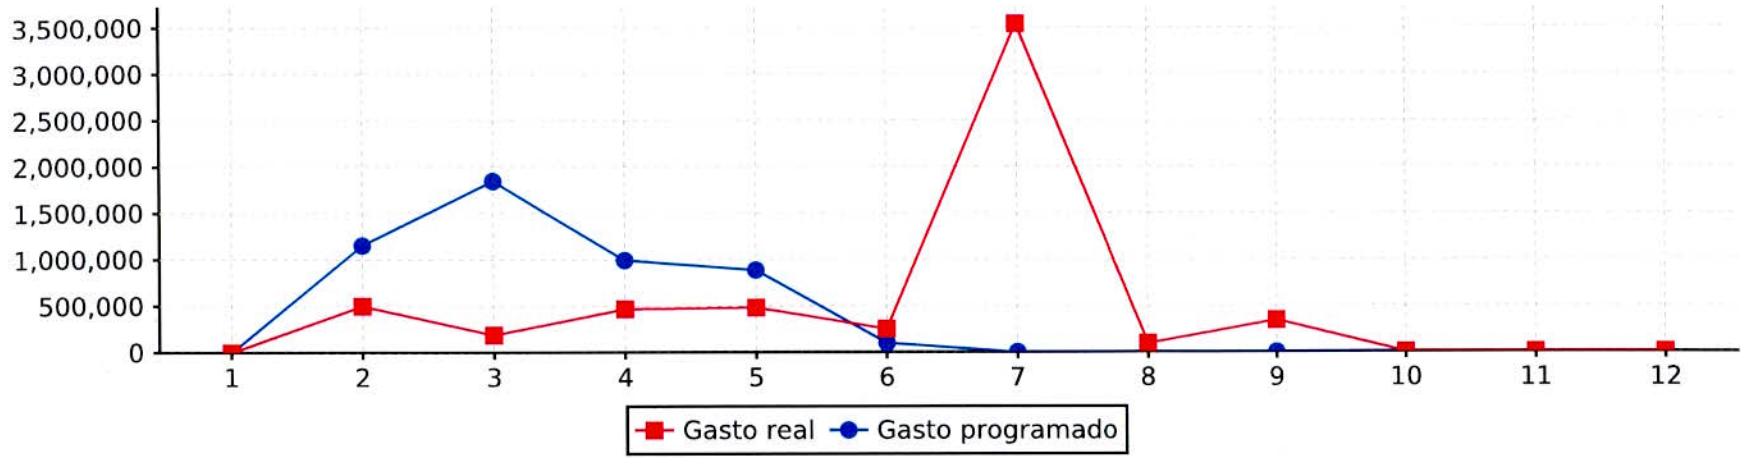

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	92,500.00	343,988.11	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												5,862,771.58
Total Gasto programado												4,972,618.28

id	Identif	EDT	% Avanc	Hito	PMR/PP	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	2006	2007	2008	2009
6555	No	4.5.10	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16			\$8,393 Fin	\$8,393				
6560	No	4.5.11	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16			\$7,756 Fin	\$7,756				
6572	No	4.5.12	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17			\$8,415 Fin	\$8,415				
6586	No	4.5.13	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	167 días	mié 31/01/18	lun 24/09/18	mié 31/01/18	lun 24/09/18			\$7,405 Fin	\$7,405				
6598	No	4.5.14	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2014	239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	jue 02/01/14	mar 02/12/14			\$12,347 Fin	\$12,347				
6603	No	4.5.15	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2015	20 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15			\$6,244 Fin	\$6,244				
6608	No	4.5.16	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2016	213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16			\$33,135 Fin	\$33,135				
6619	No	4.5.17	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2017	221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17			\$38,194 Fin	\$38,194				
6633	No	4.5.18	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	220 días	jue 02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14			\$4,241 Fin	\$4,241				
6638	No	4.5.19	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15			\$2,021 Fin	\$2,021				
6643	No	4.5.20	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	226 días	mar 02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16			\$19,651 Fin	\$19,651				
6656	No	4.5.21	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17			\$16,591 Fin	\$16,591				
6667	No	4.5.22	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2014	111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15			\$13,703 Fin	\$13,703				
6679	No	4.5.23	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2015	164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17			\$24,325 Fin	\$24,325				
6692	No	4.5.24	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2016	177 días	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17			\$51,789 Fin	\$51,789				
6700	No	4.5.25	61%	No		Proceso de Contratación: Auditoría Externa, correspondiente al período 2017	296 días	lun 28/08/17	lun 22/10/18	lun 28/08/17		NOD		\$69,920 Fin	\$23,441				
6701	No	4.5.25	100%	No		Etapas de Adquisición:	63 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17			\$0 Fin	\$0				
6708	No	4.5.25	15%	No		Etapas de Ejecución de pagos:	149 días	vie 23/03/18	lun 22/10/18	vie 23/03/18		NOD		\$69,920 Fin	\$23,441				
6709	No	4.5.25	100%	No		Primer Producto 20% del valor del contrato	2 días	vie 23/03/18	lun 26/03/18	vie 23/03/18	lun 26/03/18		6707FC	\$11,760 Fin	\$11,760				
6710	No	4.5.25	100%	No		Segundo Producto 20% del valor del contrato	4 días	jue 17/05/18	mar 22/05/18	jue 17/05/18	mar 22/05/18		6709FC	\$11,681 Fin	\$11,681				
6711	No	4.5.25	0%	No		Tercer Producto 20% del valor del contrato	10 días	lun 01/10/18	lun 15/10/18			NOD		\$11,760 Fin	\$0				
6712	No	4.5.25	0%	No		Cuarto Producto 40% del valor del contrato	10 días	lun 01/10/18	lun 15/10/18			NOD		\$23,519 Fin	\$0				
6713	No	4.5.25	0%	No		Ampliación de Tiempo e Incremento al contrato	15 días	lun 01/10/18	lun 22/10/18			NOD		\$11,200 Fin	\$0				
6714	No	4.5.26	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	148 días	jue 30/11/17	mar 26/06/18	jue 30/11/17	mar 26/06/18			\$25,328 Fin	\$25,328				
6723	No	4.5.27	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	531 días	lun 02/12/13	mié 23/12/15	lun 02/12/13	mié 23/12/15			\$6,977 Fin	\$6,977				
6730	No	4.5.28	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15			\$2,362 Fin	\$2,362				
6737	No	4.5.29	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14			\$10,220 Fin	\$10,220				
6744	No	4.5.30	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/14	mié 23/12/15			\$13,846 Fin	\$13,846				
6751	No	4.5.31	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16			\$17,634 Fin	\$17,634				
6769	No	4.5.32	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$17,996 Fin	\$17,996				
6787	No	4.5.33	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18			\$10,524 Fin	\$10,524				
6799	No	4.5.34	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018 (2)	53 días	vie 15/06/18	jue 30/08/18	vie 15/06/18	jue 30/08/18			\$3,460 Fin	\$3,460				
6808	No	4.5.35	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	220 días	lun 09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15			\$12,957 Fin	\$12,957				
6816	No	4.5.36	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16			\$17,634 Fin	\$17,634				
6834	No	4.5.37	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$17,997 Fin	\$17,997				
6852	No	4.5.38	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18			\$10,524 Fin	\$10,524				
6854	No	4.5.39	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018 (2)	73 días	vie 15/06/18	jue 27/09/18	vie 15/06/18	jue 27/09/18			\$5,148 Fin	\$5,148				
6873	No	4.5.40	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	214 días	mar 17/02/15	mié 23/12/15	mar 17/02/15	mié 23/12/15			\$10,769 Fin	\$10,769				
6880	No	4.5.41	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16			\$17,634 Fin	\$17,634				
6898	No	4.5.42	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$17,996 Fin	\$17,996				
6916	No	4.5.43	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18			\$10,524 Fin	\$10,524				
6928	No	4.5.44	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018 (2)	43 días	vie 15/06/18	jue 16/08/18	vie 15/06/18	jue 16/08/18			\$2,607 Fin	\$2,607				
6937	No	4.5.45	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15			\$21,539 Fin	\$21,539				
6944	No	4.5.46	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16			\$28,127 Fin	\$28,127				
6962	No	4.5.47	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17			\$29,448 Fin	\$29,448				

Project: PEP SMART_1905_28 9 2 Date: mar 06/11/18	División critica		Summary		Inactive Task	Duration-only		Finish-only		Margen de demora	
	Task		Project Summary		Inactive Milestone	Manual Summary Rollup		Deadline		Retrasada	
	Split		External Tasks		Inactive Summary	Manual Summary		Progress		Tareas criticas	
	Milestone		External Milestone		Manual Task	Start-only		Progreso manual			

Id	Identif. Empr	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	AcumulaCosto	Costo Real				
																2006	2007	2008	2009
6980	No 4.5.48	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190			
6992	No 4.5.49	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018 (2)	73 días	15/06/18	27/09/18	15/06/18	27/09/18				\$7,920 Fin	\$7,920			
7001	No 4.5.50	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015	80 días	mié 02/09/15	mié 23/12/15	mié 02/09/15	mié 23/12/15				\$6,924 Fin	\$6,924			
7008	No 4.5.51	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127			
7026	No 4.5.52	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448			
7044	No 4.5.53	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190			
7056	No 4.5.54	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018 (2)	73 días	15/06/18	27/09/18	15/06/18	27/09/18				\$7,920 Fin	\$7,920			
7065	No 4.5.55	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2014	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14				\$2,587 Fin	\$2,587			
7072	No 4.5.56	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2015	225 días	lun 02/02/15	mié 23/12/15	lun 02/02/15	mié 23/12/15				\$20,915 Fin	\$20,915			
7079	No 4.5.57	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016	226 días	mar 08/12/15	vie 28/10/16	mar 08/12/15	vie 28/10/16				\$23,328 Fin	\$23,328			
7095	No 4.5.58	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016 (2do Consultor)	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$3,598 Fin	\$3,598			
7103	No 4.5.59	100%	No			Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$27,913 Fin	\$27,913			
7120	No 4.5.60	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como Apoyo al OJ	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$4,724 Fin	\$4,724			
7128	No 4.5.61	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como Apoyo al MP	64 días	lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16				\$5,992 Fin	\$5,992			
7137	No 4.5.62	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15				\$3,542 Fin	\$3,542			
7145	No 4.5.63	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16				\$28,127 Fin	\$28,127			
7163	No 4.5.64	100%	No			Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	112 días	vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17				\$14,687 Fin	\$14,687			
7175	No 4.5.65	100%	No			Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	78 días	lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16				\$8,306 Fin	\$8,306			
7185	No 4.5.66	100%	No			Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17				\$29,448 Fin	\$29,448			
7203	No 4.5.67	100%	No			Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	130 días	14/12/17	14/06/18	14/12/17	14/06/18				\$16,190 Fin	\$16,190			
7215	No 4.5.68	100%	No			Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018 (2)	53 días	vie 15/06/18	30/08/18	vie 15/06/18	30/08/18				\$5,323 Fin	\$5,323			
7224	No 4.5.69	100%	No			Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17				\$0 Fin	\$0			
7234	No 4.5.70	100%	No			Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17				\$7,653 Fin	\$7,653			
7244	No 4.5.71	100%	No			Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17				\$954 Fin	\$954			
7251	No 4.5.72	100%	No			Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transparencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15				\$31,281 Fin	\$31,281			
7259	No 4.5.73	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15				\$1,311 Fin	\$1,311			
7266	No 4.5.74	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16				\$5,195 Fin	\$5,195			
7273	No 4.5.75	100%	No			Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16				\$28,536 Fin	\$28,536			
7283	No 4.5.76	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16				\$5,930 Fin	\$5,930			
7294	No 4.5.77	100%	No			Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Girona, Guatemala y Fiscalía en	63 días	lun 02/05/16	vie 28/07/16	lun 02/05/16	vie 28/07/16				\$7,930 Fin	\$7,930			
7304	No 4.5.78	100%	No			Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16				\$8,011 Fin	\$8,011			
7313	No 4.5.79	100%	No			Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16				\$24,832 Fin	\$24,832			
7323	No 4.5.80	100%	No			Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16				\$25,385 Fin	\$25,385			
7333	No 4.5.81	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17				\$20,930 Fin	\$20,930			

Project: PEP_SMART_1905_28 9 2
Date: mar 06/11/18

División crítica	Summary	▬	Inactive Task	▬	Duration-only	▬	Finish-only	J	Margen de demora	▬
Task	▬	Project Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	+	Retrasada	▬
Split	External Tasks	▬	Inactive Summary	▬	Manual Summary	▬	Progress	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	External Milestone	○	Manual Task	▬	Start-only	L	Progreso manual	▬		

Id	Identif. Empe	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	Año			
																2006	2007	2008	2009
7342	No 4.5.82	100%	No			Proceso de Contratación: Peritraje Cultural en Guatemala	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17				\$41,594 Fin	\$41,594			
7351	No 4.5.83	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18				\$25,410 Fin	\$25,410			
7360	No 4.5.84	100%	No			Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17				\$28,541 Fin	\$28,541			
7368	No 4.5.85	100%	No			Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el área de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15				\$15,666 Fin	\$15,666			
7376	No 4.5.86	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	80 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15				\$1,130 Fin	\$1,130			
7381	No 4.5.87	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16				\$1,501 Fin	\$1,501			
7387	No 4.5.88	100%	No			Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17				\$1,460 Fin	\$1,460			
7393	No 4.5.89	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	29 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14				\$1,800 Fin	\$1,800			
7398	No 4.5.90	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15				\$8,543 Fin	\$8,543			
7403	No 4.5.91	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17				\$13,742 Fin	\$13,742			
7412	No 4.5.92	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	34 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17				\$1,147 Fin	\$1,147			
7421	No 4.5.93	100%	No			Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18				\$266 Fin	\$266			
7430	No 4.5.94	100%	No			Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	28 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18				\$803 Fin	\$803			
7439	No 4.5.95	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18				\$453 Fin	\$453			
7446	No 4.5.96	100%	No			Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	8 días	mar 04/09/18	jue 13/09/18	mar 04/09/18	jue 13/09/18				\$549 Fin	\$549			
7453	No 4.5.97	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15				\$2,306 Fin	\$2,306			
7458	No 4.5.98	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16				\$1,961 Fin	\$1,961			
7463	No 4.5.99	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17				\$4,975 Fin	\$4,975			
7468	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17				\$1,808 Fin	\$1,808			
7473	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2015	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15				\$681 Fin	\$681			
7478	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2016	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16				\$1,236 Fin	\$1,236			
7485	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2017	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17				\$1,084 Fin	\$1,084			
7493	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Servicios para Vehículos 2018	19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18				\$593 Fin	\$593			
7499	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15				\$3,731 Fin	\$3,731			
7504	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16				\$305 Fin	\$305			
7509	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17				\$1,777 Fin	\$1,777			
7514	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2014	273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14				\$4,121 Fin	\$4,121			
7519	No 4.5.100	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2015	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15				\$5,084 Fin	\$5,084			
7524	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Alimentación para Personas 2017	190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17				\$3,914 Fin	\$3,914			
7533	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18				\$2,018 Fin	\$2,018			
7538	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	29 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18				\$4,841 Fin	\$4,841			
7543	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	28 días	jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18				\$546 Fin	\$546			
7548	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría	29 días	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18				\$1,337 Fin	\$1,337			
7555	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17				\$3,845 Fin	\$3,845			
7561	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer	38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17				\$1,968 Fin	\$1,968			
7566	No 4.5.110	100%	No			Proceso de Contratación: Remodelación de la Oficina para la Coordinación de la UE de la SEICMSJ	41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15				\$13,734 Fin	\$13,734			

Project: PEP_SMART_1905_28_9_2
Date: mar 06/11/18

División crítica	Summary	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Margen de demora
Task	Project Summary	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Deadline	Retrasada
Split	External Tasks	Inactive Summary	Manual Summary	Progress	Tareas críticas
Milestone	External Milestone	Manual Task	Start-only	Progreso manual	

Id	Ident empl	EDT	% Avanc	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real				
																2006	2007	2008	2009
7574	No 4.5.11	0%	No			Presencia de Centro de Atención al Cliente para la implementación de la Ley 2012	26 días	lun 06/03/17	vie 10/03/17	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0					
7581	No 4.5.11	100%	No			Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/...	vie 26/02/16		\$32,055 Fin	\$32,055					
7590	No 4.5.12	100%	No			Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin	\$5,262					
7597	No 4.5.12	100%	No			Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17		\$11,052 Fin	\$11,052					
7605	No 4.5.12	100%	No			Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic Sciences	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16		\$2,480 Fin	\$2,480					
7606	No 4.5.12	100%	No			Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16		\$1,704 Fin	\$1,704					
7607	No 4.5.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15		\$10 Fin	\$10					
7608	No 4.5.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16		\$70 Fin	\$70					
7609	No 4.5.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17		\$80 Fin	\$80					
7610	No 4.5.12	100%	No			Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	vie 28/09/18		\$20 Fin	\$20					
7611	No 4.5.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2015	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15		\$336 Fin	\$336					
7612	No 4.5.12	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2016	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$858 Fin	\$858					
7613	No 4.5.13	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2017	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17		\$825 Fin	\$825					
7614	No 4.5.13	100%	No			Impuestos, Derecho y Tasas 2018	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/...	vie 28/09/18		\$547 Fin	\$547					
7615	No 5	67%	No			Clausulas	2848 días	mié 24/10/07	mar 30/10/18	mié 24/10/...	NOD		\$0 Fin	\$0					
7629	No 6	100%	No			Plan de Preparación de Cierre	220 días	mié 22/11/17	vie 28/09/18	mié 22/11/...	vie 28/09/18		\$0 Fin	\$0					
7661	No 7	97%	No			Fase de Cierre	130 días	lun 30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18	NOD		\$0 Fin	\$0					
7687	No 8	100%	Si			Fin del Programa	1 día	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/...	dom 30/09/18		\$0 Fin	\$0					

Project: PEP_SMART_1905_289.2
Date: mar 06/11/18

División crítica	Summary	▬	Inactive Task	Duration-only	▬	Finish-only]	Margen de demora	▬
Task	▬	Project Summary	▬	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	+	Retrasada	▬
Split	External Tasks	▬	Inactive Summary	Manual Summary	▬	Progress	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	External Milestone	◊	Manual Task	Start-only	▬	Progreso manual	▬		

Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de octubre / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.
- En Gastos y Desembolsos, no aparecen reflejados los montos desembolsados para la Unidad Ejecutora del Programa en el periodo 2018.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Ing. Juan Carlos Linares Cruz

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

9/11/2018 - 12:09 PM
