

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

## Gráfica de Ejecución

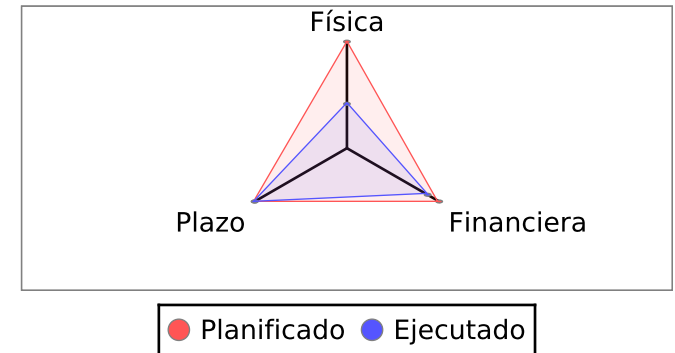

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Mes reportado


**Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

### Gráfica de Ejecución

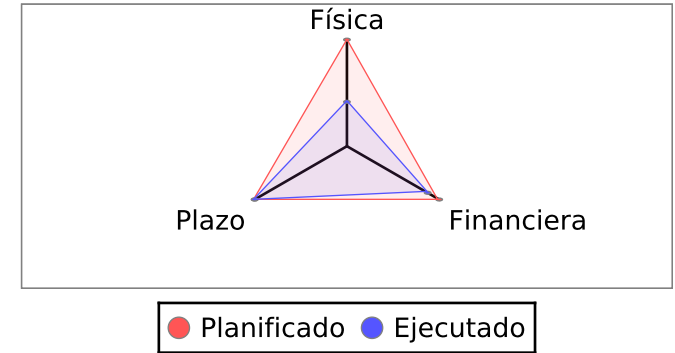

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Mes reportado


**Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

### Gráfica de Ejecución

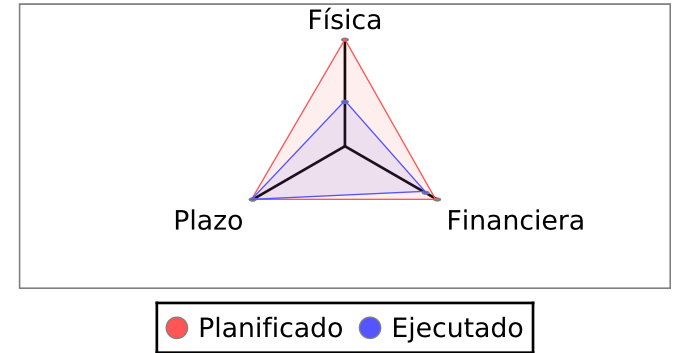

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Mes reportado


**Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

### Gráfica de Ejecución

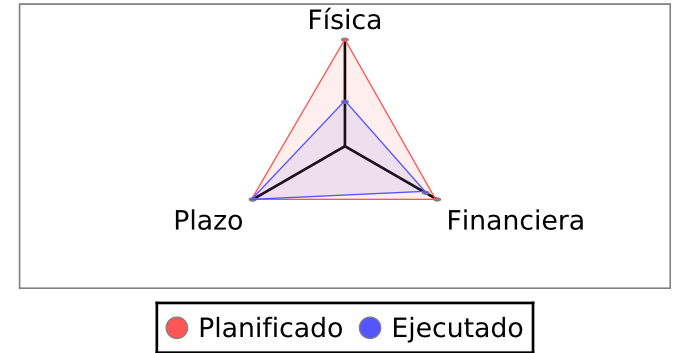

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Mes reportado


**Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

### Gráfica de Ejecución

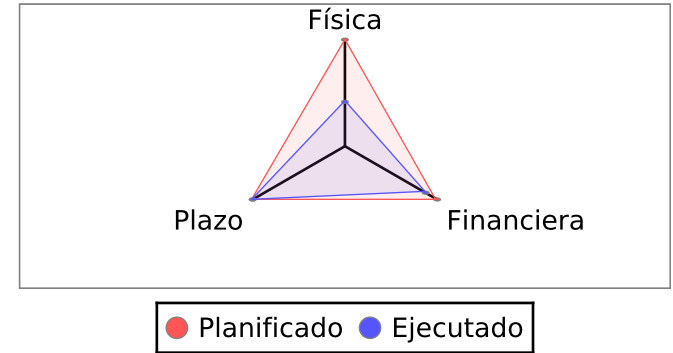

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Mes reportado


**Septiembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL**


Organismo ejecutor: **Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia**

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	04/10/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,230,070.60	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,230,070.60	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	24,871,543.62	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	2,823,882.23	87.42%	Monto por desembolsar USD\$ 406,188.37 12.58%

### Gráfica de Ejecución

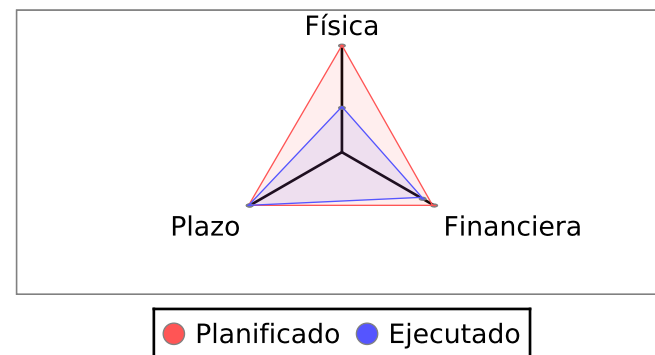

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	11,500,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	6,500,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	5,862,771.58	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	117.90% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	90.20%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	0		

# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>									
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2		0	1	0		2	1
<b>Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal</b>									
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	1	0		0		1	1
<b>Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica</b>									
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0		2	2	0		2	2
<b>Componente: Administración</b>									
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	27	12	21	0	4	42	52



# Plan Adquisiciones Año Fiscal


Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Mejoramiento del Acceso a la Justicia</b>											
<b>Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales</b>											
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	26/12/2017	04/01/2018	27/12/2017	08/01/2018	05/01/2018	08/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017		08/11/2017		04/12/2017		14/12/2017		09/01/2018	
<b>Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica</b>											
<b>Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba</b>											
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	22/11/2016	11/07/2017	18/01/2017	04/08/2017	13/02/2017	29/12/2017	09/04/2018	12/01/2018	09/04/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	22/11/2017	16/01/2018	16/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	05/03/2018	16/02/2018	02/04/2018
<b>Administración</b>											
<b>Fortalecimiento Institucional</b>											
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	12/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/09/2017	22/11/2017	22/11/2017	24/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	15/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	08/01/2018	08/01/2018





# Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

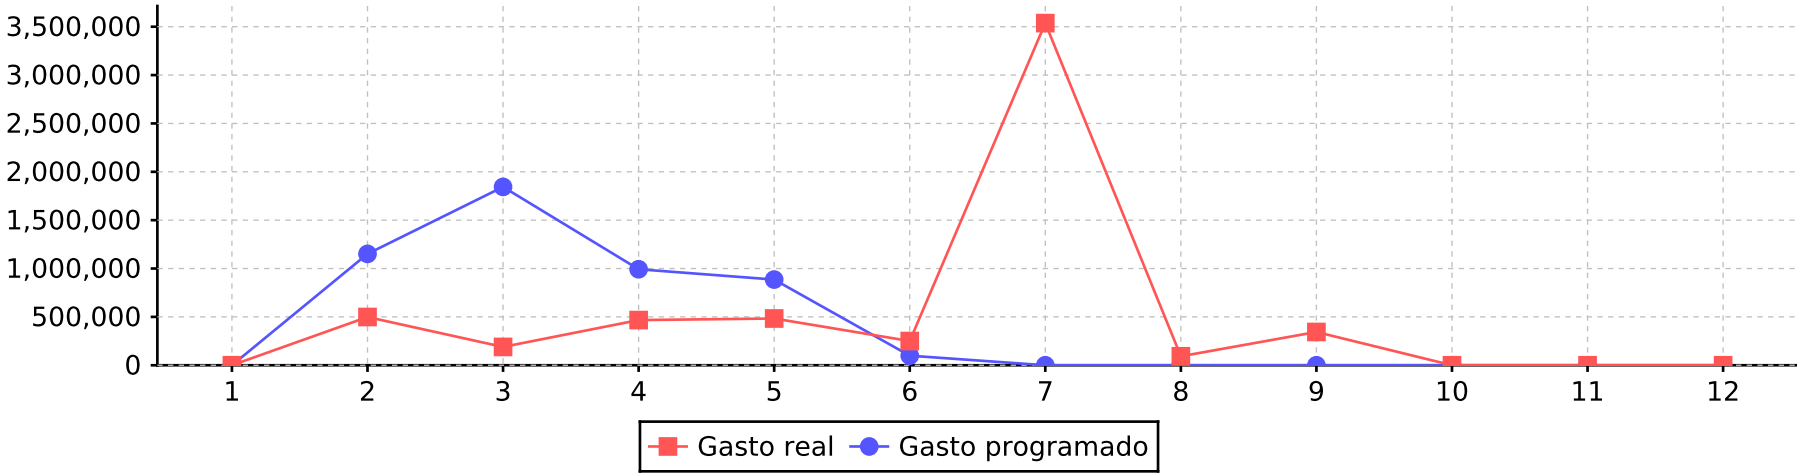

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	498,730.31	189,371.76	466,990.70	483,397.76	250,357.88	3,537,435.06	92,500.00	343,988.11	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												5,862,771.58
<b>Total Gasto programado</b>												4,972,618.28



Id	% Avance	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
0	95%	No		PEP_SMART_1905_28 9 2018	0		3 2849 días	mié 24/10/07	mié 31/10/18	mié 24/10/07		NOD	\$3,236,147 Fin		\$3,189,668
1	100%	No		Componente 1: Acceso a la Justicia	0		0 947 días	lun 06/10/14	mar 26/06/18	lun 06/10/14	mar 26/06/18		\$25,479 Fin		\$25,479
2	100%	No		P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	0		0 131 días	mar 26/12/17	mar 26/06/18	mar 26/12/17	mar 26/06/18		\$24,170 Fin		\$24,170
3	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	0		0 131 días	mar 26/12/17	mar 26/06/18	mar 26/12/17	mar 26/06/18		\$24,170 Fin		\$24,170
11	100%	No		P4. Comisarias de Policía TIPO construidas (MG)	0		0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309
12	100%	No		Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB	0		0 126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309
20	100%	No		Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de información y Gestión Penal Integrado)	0		0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18		\$634,548 Fin		\$634,548
21	100%	No		P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	0		0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18		\$634,548 Fin		\$634,548
22	100%	No		Interconexión en SE	0		0 903 días	mié 24/09/14	jue 12/04/18	mié 24/09/14	jue 12/04/18		\$634,548 Fin		\$634,548
23	100%	No		Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015	0		0 69 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15		\$142,498 Fin		\$142,498
34	100%	No		Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016	0		0 379 días	jue 01/09/16	mié 28/02/18	jue 01/09/16	mié 28/02/18		\$84,909 Fin		\$84,909
45	100%	No		Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEICMSJ	0		0 80 días	lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16		\$1,137 Fin		\$1,137
55	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 49 días	mié 24/09/14	mar 02/12/14	mié 24/09/14	mar 02/12/14		\$7,494 Fin		\$7,494
61	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 294 días	lun 17/11/14	mié 20/01/16	lun 10/11/14	mié 23/12/15		\$78,164 Fin		\$78,164
67	100%	No		Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16		\$114,770 Fin		\$114,770
83	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF	0		0 146 días	lun 23/05/16	vie 16/12/16	lun 23/05/16	vie 16/12/16		\$104,369 Fin		\$104,369
93	100%	No		Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2015	0		0 27 días	lun 24/11/14	mar 30/12/14	lun 24/11/14	mar 30/12/14		\$2,584 Fin		\$2,584
99	100%	No		Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2016	0		0 200 días	lun 08/12/14	mar 22/09/15	lun 08/12/14	mar 22/09/15		\$21,307 Fin		\$21,307
105	100%	No		Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de Datos	0		0 232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$32,715 Fin		\$32,715
123	100%	No		Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejecutoras y la Secretaría Ejecutiva de la Justicia	0		0 167 días	lun 21/08/17	jue 12/04/18	lun 21/08/17	jue 12/04/18		\$23,093 Fin		\$23,093
132	100%	No		Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoría Técnica en Sistema de Información Penal	0		0 102 días	mar 09/05/17	vie 29/09/17	mar 09/05/17	vie 29/09/17		\$21,479 Fin		\$21,479
141	100%	No		Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0		0 83 días	lun 05/06/17	vie 29/09/17	lun 05/06/17	vie 29/09/17		\$30 Fin		\$30
142	100%	No		Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	0		0 849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	vie 28/09/18		\$943,493 Fin		\$943,493
143	100%	No		P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	0		0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18		\$433,175 Fin		\$433,175
144	100%	No		Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	0		0 642 días	lun 05/10/15	jue 12/04/18	lun 05/10/15	jue 12/04/18		\$433,175 Fin		\$433,175
145	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0		0 119 días	mar 13/10/15	mié 30/03/16	mar 13/10/15	mié 30/03/16		\$97,760 Fin		\$97,760
153	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0		0 211 días	lun 28/11/16	jue 28/09/17	lun 28/11/16	jue 28/09/17		\$9,655 Fin		\$9,655
163	100%	No		Proceso de Adquisición: Vehículos	0		0 58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15		\$50,046 Fin		\$50,046
172	100%	No		Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del	0		0 350 días	mié 10/08/16	jue 28/12/17	mié 10/08/16	jue 28/12/17		\$192,996 Fin		\$192,996

Id	% Avance	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasada	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real
190	100%	No		Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento	0	0	138 días	lun 02/10/17	jue 12/04/18	lun 02/10/17	jue 12/04/18		\$45,997 Fin		\$45,997
199	100%	No		Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado para pueblos indígenas en los	0	0	138 días	lun 02/10/17	jue 12/04/18	lun 02/10/17	jue 12/04/18		\$36,681 Fin		\$36,681
208	100%	No		Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0	84 días	jue 31/08/17	vie 29/12/17	jue 31/08/17	vie 29/12/17		\$40 Prorate		\$40
209	100%	No		<b>P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas</b>	0	0	849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	vie 28/09/18		\$301,341 Fin		\$301,341
210	100%	No		Capacitación de los funcionarios en SE	0	0	849 días	lun 25/05/15	vie 28/09/18	lun 25/05/15	vie 28/09/18		\$301,341 Fin		\$301,341
211	100%	No		Proceso de Contratación: Gastos de Viaticos John Jay College	0	0	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16		\$13,582 Fin		\$13,582
217	100%	No		Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación	0	0	29 días	lun 20/06/16	vie 29/07/16	lun 20/06/16	vie 29/07/16		\$1,667 Fin		\$1,667
226	100%	No		Análisis de consultora	0	0	17 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15	lun 25/05/15	mar 16/06/15		\$0 Fin		\$0
227	100%	No		Proceso de Contratación: Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del	0	0	695 días	lun 11/01/16	jue 27/09/18	lun 11/01/16	jue 27/09/18		\$285,761 Fin		\$285,761
258	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$245 Prorate		\$245
259	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	0	0	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	vie 28/09/18		\$87 Prorate		\$87
260	100%	No		<b>P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba</b>	0	0	588 días	lun 06/06/16	jue 27/09/18	lun 06/06/16	jue 27/09/18		\$208,978 Fin		\$208,978
261	100%	No		Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del Sistema de Justicia Penal en Guatemala	0	0	371 días	lun 06/06/16	jue 23/11/17	lun 06/06/16	jue 23/11/17		\$0 Fin		\$0
282	100%	No		Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	0	0	184 días	lun 13/11/17	lun 30/07/18	lun 13/11/17	lun 30/07/18		\$203,200 Fin		\$203,200
299	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viaticos) 2018	0	0	4 días	lun 24/09/18	jue 27/09/18	lun 24/09/18	jue 27/09/18		\$3,779 Fin		\$3,779
304	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para el Programa Apoyo al Sector Justicia	0	0	6 días	jue 20/09/18	jue 27/09/18	jue 20/09/18	jue 27/09/18		\$1,998 Fin		\$1,998
309	99%	No		Administración	0	0	31292 días	mié 02/10/13	lun 22/10/18	mié 02/10/...	NOD		\$1,632,626 Fin		\$1,586,147
310	99%	No		Gastos indirectos e imprevistos (SE)	0	0	31292 días	mié 02/10/13	lun 22/10/18	mié 02/10/...	NOD		\$1,632,626 Fin		\$1,586,147
311	100%	No		Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB 2014	0	0	15 días	jue 11/12/14	mié 31/12/14	jue 11/12/14	mié 31/12/14	17	\$1,974 Fin		\$1,974
312	100%	No		Pagos Administrativos 2013	0	0	65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13	mié 02/10/...	mar 31/12/13		\$20,995 Fin		\$20,995
313	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehiculos (Camionetas) 2015	0	0	75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15	jue 16/04/15	jue 30/07/15		\$66,393 Fin		\$66,393
320	100%	No		Proceso de Adquisiciones: Vehiculos (5 Pick Up) 2016	0	0	141 días	lun 29/08/16	mié 22/03/17	lun 29/08/16	mié 22/03/17		\$147,041 Fin		\$147,041
330	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0	160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14	jue 02/01/14	mié 13/08/14		\$1,804 Fin		\$1,804
335	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0	161 días	vie 02/01/15	lun 24/08/15	vie 02/01/15	lun 24/08/15		\$1,935 Fin		\$1,935
340	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0	220 días	mié 17/02/16	jue 22/12/16	mié 17/02/...	jue 22/12/16		\$9,290 Fin		\$9,290
351	100%	No		Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0	84 días	jue 02/02/17	mié 31/05/17	jue 02/02/17	mié 31/05/17		\$3,758 Fin		\$3,758
358	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0	260 días	jue 02/01/14	mié 31/12/14	jue 02/01/14	mié 31/12/14		\$8,941 Fin		\$8,941
363	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0	252 días	lun 05/01/15	vie 08/01/16	lun 05/01/15	vie 08/01/16		\$8,393 Fin		\$8,393



Id	% Avance	Hito	PMR/Pj	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
368	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0	248 días	lun 04/01/16	vie 16/12/16	lun 04/01/16	vie 16/12/16		\$7,756 Fin		\$7,756
380	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0	192 días	lun 13/03/17	lun 11/12/17	lun 13/03/17	lun 11/12/17		\$8,415 Fin		\$8,415
394	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	0	0	167 días	mié 31/01/18	lun 24/09/18	mié 31/01/18	lun 24/09/18		\$7,405 Fin		\$7,405
406	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2014	0	0	239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	jue 02/01/14	mar 02/12/14		\$12,347 Fin		\$12,347
411	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0	20 días	mar 02/02/16	lun 29/02/16	vie 02/01/15	lun 14/12/15		\$6,244 Fin		\$6,244
416	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0	213 días	mar 02/02/16	lun 28/11/16	mar 02/02/16	lun 28/11/16		\$33,135 Fin		\$33,135
427	100%	No		Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0	221 días	lun 06/02/17	vie 15/12/17	lun 06/02/17	vie 15/12/17		\$38,194 Fin		\$38,194
441	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	220 días	jue 02/01/14	mié 05/11/14	jue 02/01/14	mié 05/11/14		\$4,241 Fin		\$4,241
446	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	222 días	lun 02/02/15	vie 18/12/15	lun 02/02/15	vie 18/12/15		\$2,021 Fin		\$2,021
451	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	226 días	mar 02/02/16	jue 15/12/16	mar 02/02/16	jue 15/12/16		\$19,651 Fin		\$19,651
464	100%	No		Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17		\$16,591 Fin		\$16,591
475	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al período 2014	0	0	111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15		\$13,703 Fin		\$13,703
487	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al período 2015	0	0	164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17		\$24,325 Fin		\$24,325
500	100%	No		Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al período 2016	0	0	177 días	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17		\$51,789 Fin		\$51,789
508	61%	No		Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al período 2017	0	3	296 días	lun 28/08/17	lun 22/10/18	lun 28/08/17	NOD		\$69,920 Fin		\$23,441
522	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	0	0	148 días	jue 30/11/17	mar 26/06/18	jue 30/11/17	mar 26/06/18		\$25,328 Fin		\$25,328
531	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	0	0	531 días	lun 02/12/13	mié 23/12/15	lun 02/12/13	mié 23/12/15		\$6,977 Fin		\$6,977
538	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	0	0	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/...	mié 23/12/15		\$2,362 Fin		\$2,362
545	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	0	0	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14		\$10,220 Fin		\$10,220
552	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	0	0	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/15	mié 10/12/...	mié 23/12/15		\$13,846 Fin		\$13,846
559	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	0	0	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
577	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
595	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$10,524 Fin		\$10,524
607	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018 (2)	0	0	53 días	vie 15/06/18	jue 30/08/18	vie 15/06/18	jue 30/08/18		\$3,460 Fin		\$3,460
616	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	0	0	220 días	lun 09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15		\$12,957 Fin		\$12,957
624	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	0	0	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
642	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,997 Fin		\$17,997
660	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$10,524 Fin		\$10,524
672	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018 (2)	0	0	73 días	vie 15/06/18	jue 27/09/18	vie 15/06/18	jue 27/09/18		\$5,148 Fin		\$5,148
681	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	0	0	214 días	mar 17/02/15	mié 23/12/15	mar 17/02/...	mié 23/12/15		\$10,769 Fin		\$10,769

Id	% Avance	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
688	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	0	0	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
706	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
724	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$10,524 Fin		\$10,524
736	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018 (2	0	0	43 días	vie 15/06/18	jue 16/08/18	vie 15/06/18	jue 16/08/18		\$2,607 Fin		\$2,607
745	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	0	0	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$21,539 Fin		\$21,539
752	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	0	0	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/16	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
770	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
788	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$16,190 Fin		\$16,190
800	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018 (2)	0	0	73 días	vie 15/06/18	jue 27/09/18	vie 15/06/18	jue 27/09/18		\$7,920 Fin		\$7,920
809	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015	0	0	80 días	mié 02/09/15	mié 23/12/15	mié 02/09/...	mié 23/12/15		\$6,924 Fin		\$6,924
816	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016	0	0	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
834	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
852	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$16,190 Fin		\$16,190
864	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018 (2)	0	0	73 días	vie 15/06/18	jue 27/09/18	vie 15/06/18	jue 27/09/18		\$7,920 Fin		\$7,920
873	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Juridico 2014	0	0	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/14	lun 02/12/13	mié 31/12/14		\$2,587 Fin		\$2,587
880	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Juridico 2015	0	0	225 días	lun 02/02/15	mié 23/12/15	lun 02/02/15	mié 23/12/15		\$20,915 Fin		\$20,915
887	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Juridico 2016	0	0	226 días	mar 08/12/15	vie 28/10/16	mar 08/12...	vie 28/10/16		\$23,328 Fin		\$23,328
903	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Juridico 2016 (2do Consultor	0	0	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16		\$3,598 Fin		\$3,598
911	100%	No		Proceso de Contratación: Asistente Juridico 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$27,913 Fin		\$27,913
928	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como Apoyo al OJ	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15		\$4,724 Fin		\$4,724
936	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como Apoyo al MP	0	0	64 días	lun 19/09/16	vie 16/12/16	lun 19/09/16	vie 16/12/16		\$5,992 Fin		\$5,992
945	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015	0	0	53 días	mar 13/10/15	mié 23/12/15	mar 13/10/15	mié 23/12/15		\$3,542 Fin		\$3,542
953	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016	0	0	262 días	lun 07/12/15	vie 16/12/16	lun 07/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
971	100%	No		Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017	0	0	112 días	vie 20/01/17	mar 27/06/17	vie 20/01/17	mar 27/06/17		\$14,687 Fin		\$14,687
983	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016	0	0	78 días	lun 29/08/16	vie 16/12/16	lun 29/08/16	vie 16/12/16		\$8,306 Fin		\$8,306
993	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017	0	0	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
1011	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018	0	0	130 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	jue 14/06/18		\$16,190 Fin		\$16,190
1023	100%	No		Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de la Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018 (2)	0	0	53 días	vie 15/06/18	jue 30/08/18	vie 15/06/18	jue 30/08/18		\$5,323 Fin		\$5,323
1032	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ	0	0	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17		\$0 Fin		\$0
1042	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos	0	0	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17		\$7,653 Fin		\$7,653
1052	100%	No		Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes	0	0	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17		\$954 Fin		\$954
1059	100%	No		Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la Fiscalía General de Guatemala	0	0	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15		\$31,281 Fin		\$31,281

20

Id	% Avance	Hito	PMR/P/	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
1067	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2015	0	058 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15			\$1,311 Fin		\$1,311
1074	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil propuesta por el MP 2016	0	041 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16			\$5,195 Fin		\$5,195
1081	100%	No		Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en el OJ	0	0126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16			\$28,536 Fin		\$28,536
1091	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III	0	0169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16			\$5,930 Fin		\$5,930
1102	100%	No		Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en	0	063 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16			\$7,930 Fin		\$7,930
1112	100%	No		Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el	0	045 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16			\$8,011 Fin		\$8,011
1121	100%	No		Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP	0	083 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16			\$24,832 Fin		\$24,832
1131	100%	No		Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB	0	0139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16			\$25,385 Fin		\$25,385
1141	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP	0	0199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17			\$20,930 Fin		\$20,930
1150	100%	No		Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala	0	0201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17			\$41,594 Fin		\$41,594
1159	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ	0	0120 días	lun 30/10/17	vie 13/04/18	lun 30/10/17	vie 13/04/18			\$25,410 Fin		\$25,410
1168	100%	No		Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile	0	0132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17			\$28,541 Fin		\$28,541
1176	100%	No		Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de Influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015	0	089 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15			\$15,666 Fin		\$15,666
1184	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	080 días	lun 04/05/15	vie 28/08/15	lun 04/05/15	vie 28/08/15			\$1,130 Fin		\$1,130
1189	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0230 días	mar 02/02/16	mié 21/12/16	mar 02/02/16	mié 21/12/16			\$1,501 Fin		\$1,501
1195	100%	No		Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0128 días	lun 13/03/17	vie 08/09/17	lun 13/03/17	vie 08/09/17			\$1,460 Fin		\$1,460
1201	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	029 días	lun 22/09/14	jue 30/10/14	lun 22/09/14	jue 30/10/14			\$1,800 Fin		\$1,800
1206	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0173 días	lun 23/03/15	lun 30/11/15	lun 23/03/15	lun 30/11/15			\$8,543 Fin		\$8,543
1211	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0157 días	lun 04/07/16	lun 20/02/17	lun 04/07/16	lun 20/02/17			\$13,742 Fin		\$13,742
1220	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	034 días	mar 08/08/17	lun 25/09/17	mar 08/08/17	lun 25/09/17			\$1,147 Fin		\$1,147

Id	% Avance	Hito	PMR/PJ	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real
1229	100%	No		Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0	53 días	mié 14/02/18	vie 27/04/18	mié 14/02/18	vie 27/04/18		\$266 Fin		\$266
1238	100%	No		Proceso de Adquisición: Suministros para Oficina (Dispositivos de Almacenamiento de Datos)	0	0	28 días	jue 12/04/18	mar 22/05/18	jue 12/04/18	mar 22/05/18		\$803 Fin		\$803
1247	100%	No		Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Oficina de la Unidad Ejecutora de la SEICMSJ	0	0	34 días	lun 29/01/18	mié 14/03/18	lun 29/01/18	mié 14/03/18		\$453 Fin		\$453
1254	100%	No		Proceso de Contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina de la Unidad Ejecutora de la	0	0	8 días	mar 04/09/18	jue 13/09/18	mar 04/09/18	jue 13/09/18		\$549 Fin		\$549
1261	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	123 días	lun 02/03/15	vie 28/08/15	lun 02/03/15	vie 28/08/15		\$2,306 Fin		\$2,306
1266	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	7 días	lun 22/08/16	mar 30/08/16	lun 22/08/16	mar 30/08/16		\$1,961 Fin		\$1,961
1271	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick	0	0	10 días	mar 04/04/17	lun 17/04/17	mar 04/04/17	lun 17/04/17		\$4,975 Fin		\$4,975
1276	100%	No		Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camionetas)	0	0	42 días	lun 17/07/17	mié 13/09/17	lun 17/07/17	mié 13/09/17		\$1,808 Fin		\$1,808
1281	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	0	0	16 días	lun 08/06/15	lun 29/06/15	lun 08/06/15	lun 29/06/15		\$681 Fin		\$681
1286	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	0	0	174 días	vie 01/04/16	mar 06/12/16	vie 01/04/16	mar 06/12/16		\$1,236 Fin		\$1,236
1293	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	0	0	193 días	mié 08/03/17	jue 07/12/17	mié 08/03/17	jue 07/12/17		\$1,084 Fin		\$1,084
1301	100%	No		Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	0	0	19 días	lun 05/02/18	mié 28/02/18	lun 05/02/18	mié 28/02/18		\$593 Fin		\$593
1307	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	0	19 días	lun 04/05/15	jue 28/05/15	lun 04/05/15	jue 28/05/15		\$3,731 Fin		\$3,731
1312	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	0	24 días	lun 29/08/16	vie 30/09/16	lun 29/08/16	vie 30/09/16		\$305 Fin		\$305
1317	100%	No		Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	0	21 días	lun 06/02/17	lun 06/03/17	lun 06/02/17	lun 06/03/17		\$1,777 Fin		\$1,777
1322	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2014	0	0	273 días	lun 16/12/13	mié 31/12/14	lun 16/12/13	mié 31/12/14		\$4,121 Fin		\$4,121
1327	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2015	0	0	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/15	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$5,084 Fin		\$5,084
1332	100%	No		Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2017	0	0	190 días	lun 06/03/17	jue 30/11/17	lun 06/03/17	jue 30/11/17		\$3,914 Fin		\$3,914
1341	100%	No		Proceso de Contratación: Taller de Evaluación para Divulgación de Resultados del Programa	0	0	26 días	vie 20/04/18	lun 28/05/18	vie 20/04/18	lun 28/05/18		\$2,018 Fin		\$2,018
1346	100%	No		Proceso de Contratación: Talleres de Revisión, Análisis y Verificación de Protocolos Actualizados con las Unidades de la Dirección General de la PNC	0	0	29 días	vie 20/04/18	jue 31/05/18	vie 20/04/18	jue 31/05/18		\$4,841 Fin		\$4,841
1351	100%	No		Proceso de Contratación: Pago del impuesto de circulación correspondiente al año 2018 de dos camionetas	0	0	28 días	jue 19/04/18	mar 29/05/18	jue 19/04/18	mar 29/05/18		\$546 Fin		\$546
1356	100%	No		Proceso de Contratación: Consultoría para la Realización de Material Audiovisual como Fortalecimiento a la Secretaría	0	0	29 días	mié 18/04/18	mar 29/05/18	mié 18/04/18	mar 29/05/18		\$1,337 Fin		\$1,337
1363	100%	No		Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0	58 días	lun 03/04/17	jue 22/06/17	lun 03/04/17	jue 22/06/17		\$3,845 Fin		\$3,845
1369	100%	No		Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer	0	0	38 días	lun 03/04/17	jue 25/05/17	lun 03/04/17	jue 25/05/17		\$1,968 Fin		\$1,968
1374	100%	No		Proceso de Contratación: Remodelacion de la Oficina para la Coordinacion de la UE de la SEICMSJ	0	0	41 días	lun 04/05/15	lun 29/06/15	lun 04/05/15	lun 29/06/15		\$13,734 Fin		\$13,734
1382	0%	No		Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de Oficina para la Coordinación de la UE 2017	0	0	25 días	lun 06/02/17	vie 10/03/17	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1389	100%	No		Proceso de Adquisición: Equipamiento de la U.E.	0	0	305 días	mié 10/12/14	vie 26/02/16	mié 10/12/14	vie 26/02/16		\$32,055 Fin		\$32,055
1398	100%	No		Proceso de Adquisición: Aire Acondicionado	0	0	25 días	lun 11/05/15	vie 12/06/15	lun 11/05/15	vie 12/06/15		\$5,262 Fin		\$5,262

20



Id	% Avance	Hito	PMR/P	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamien	Acumula	Costo Real	
1405	100%	No		<b>Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial</b>	0	0	101 días	lun 31/10/16	lun 27/03/17	lun 31/10/16	lun 27/03/17				\$11,052 Fin	\$11,052
1413	100%	No		Pago para Participar en el Congreso Amercian Academy Of Forensic Sciences	0	0	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16	vie 26/02/16				\$2,480 Fin	\$2,480
1414	100%	No		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	260 días	vie 02/01/15	mié 20/01/16	vie 02/01/15	mié 20/01/16				\$1,704 Fin	\$1,704
1415	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	246 días	vie 02/01/15	mié 23/12/15	vie 02/01/15	mié 23/12/15				\$10 Fin	\$10
1416	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	253 días	lun 04/01/16	lun 26/12/16	lun 04/01/16	lun 26/12/16				\$70 Fin	\$70
1417	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	201 días	vie 17/03/17	vie 29/12/17	vie 17/03/17	vie 29/12/17				\$80 Fin	\$80
1418	100%	No		Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2018	0	0	127 días	lun 02/04/18	vie 28/09/18	lun 02/04/18	vie 28/09/18				\$20 Fin	\$20
1419	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	5 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	lun 17/08/15	vie 28/08/15				\$336 Fin	\$336
1420	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16				\$858 Fin	\$858
1421	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	232 días	jue 02/02/17	vie 29/12/17	jue 02/02/17	vie 29/12/17				\$825 Fin	\$825
1422	100%	No		Impuestos, Derecho y Tasas 2018	0	0	106 días	mié 02/05/18	vie 28/09/18	mié 02/05/...	vie 28/09/18				\$547 Fin	\$547
1423	67%	No		<b>Clausulas</b>	0	0	2848 días	mié 24/10/07	mar 30/10/18	mié 24/10/...	NOD				\$0 Fin	\$0
1437	100%	No		<b>Plan de Preparación de Cierre</b>	0	0	220 días	mié 22/11/17	vie 28/09/18	mié 22/11/...	vie 28/09/18				\$0 Fin	\$0
1469	97%	No		<b>Fase de Cierre</b>	0	0	130 días	lun 30/04/18	mié 31/10/18	lun 30/04/18	NOD				\$0 Fin	\$0
1495	100%	Sí		Fin del Programa	0	0	1 día	dom 30/09/18	dom 30/09/18	dom 30/09/...	dom 30/09/18				\$0 Fin	\$0

20



## Observaciones / Desafíos

- En los Datos Generales del Avance del mes de septiembre / 2018 del Sistema de Control de Informes de Cumplimiento no aparece la fecha de cierre 30/9/2018; así como el total de meses de ampliación que son 21.5 meses, el cual fue aprobado por el BID en No Objeción CID/CGU-1319/2018 de fecha 21/6/2018.
- En Gastos y Desembolsos, no aparecen reflejados los montos desembolsados para la Unidad Ejecutora del Programa en el periodo 2018.

## Alertivos:

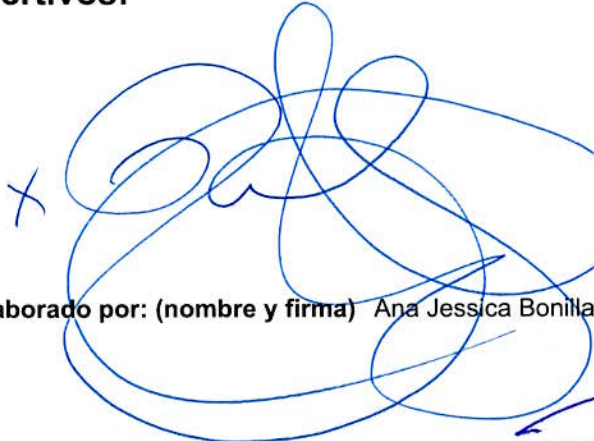Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Anibal De León Polanco

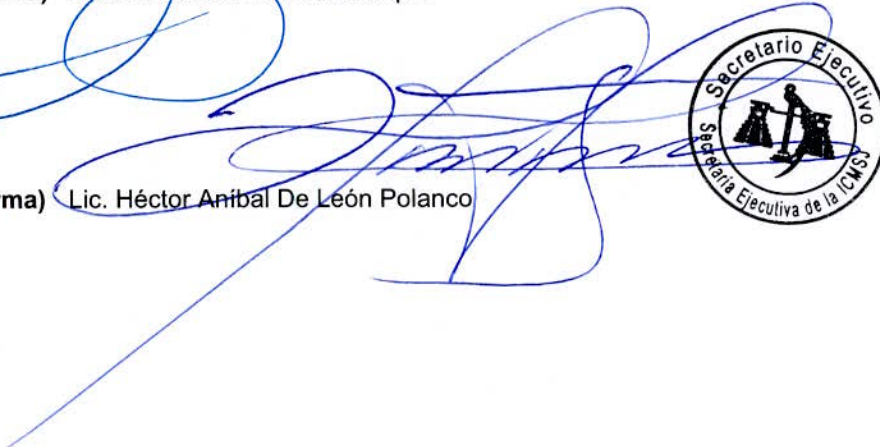Fecha de actualización

4/10/2018 - 2:50 PM
